



DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
SUPERVISION DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
MARZO 2020
INGENIERO ERWIN ORLANDO GRANADOS MORALES
COLEGIADO No. 3264

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION EDIFICIO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“COINPRO”**
- Se han finalizado los trabajos de colocación de columnas de grava, y la colocación de material de base granular, se tiene personal realizando armado para zapatas y tronco de columnas. En obra se tienen materiales arena, cemento, piedrín, hierro.
- Fecha de inicio: 04-12-2019 Fecha de Finalización: 30-06 2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 15.00 % CONTRATO No. 083-2019**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (ANTIGUO) 6A. AVENIDA 5-40 ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“INGENIERIA PARA PROYECTOS CIVILES”**
- Durante el mes de marzo se realizaron visitas de campo en donde se pudo verificar que se mejoró el lijado del machimbre, así mismo se indicó como deben realizarse los trabajos para la duela. Se han realizado trabajos en acabados de muros en interior y exterior.
- Fecha de inicio: 27 -09-2019 Fecha de Finalización: 23-07-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 75.00 % CONTRATO No. 047-2019**




SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN VIA 3 Y 3ª. AVENIDA D ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“RIVERA MENDEZ”**
- Durante el mes de marzo se realizaron trabajos de colocación de material de base granular, se realizaron platicas con vecinos cocode para realizar documentos de cambio.
- Fecha de inicio: 23 -09-2019 Fecha de Finalización: 19-05-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 20.00 % CONTRATO No. 043-2019**




SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA (DOS AULAS) CANTON EL CENTRO, ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“G&G”**
- Con fecha 10 de marzo en oficio número 30-2019, se me nombro supervisor del proyecto, al realizar visita de campo, se verifico que se tienen cantidades mayores contratadas de lo que se tiene en obra y teniendo solicitud de cocode, se realizaron documentos de cambio para mejorar. Los trabajos se han finalizado con un avance físico de 100%
- Fecha de inicio: 23 -09-2019 Fecha de Finalización: 20-05-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % CONTRATO No. 056-2019**

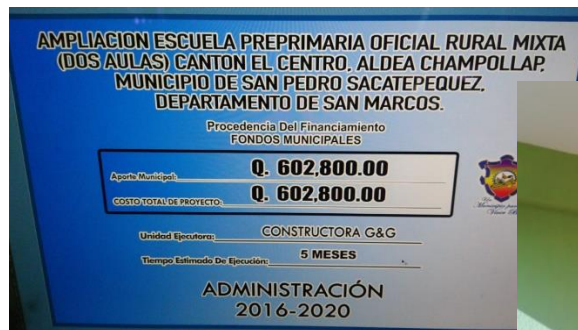

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL + CAPILLA PARA CEMENTERIO COMUNAL CANTON EL CARMEN, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“Constructora SEPROMI ”**
- Con fecha 13 de marzo en oficio número 32-2019, se me nombro supervisor del proyecto, al realizar visita de campo, se verifico que al realizar la medición y cuantificación se tienen cantidades menores ejecutadas en varios renglones de lo contratado, por lo que el proyecto tiene un Avance Físico de 100%, pero financieramente es menor
- Fecha de inicio: 12 -12-2019 Fecha de Finalización: 10-03-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 92.10 % CONTRATO No. 082-2019**

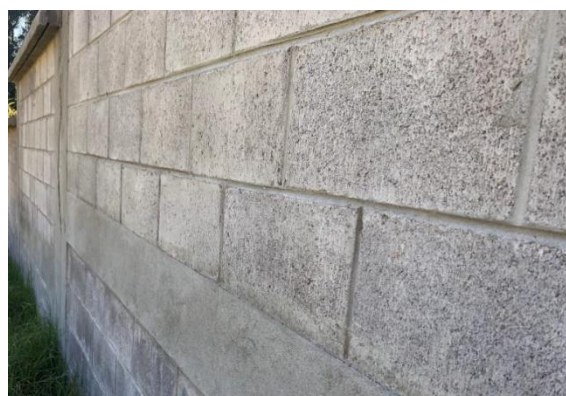

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO CANTON SAN MIGUEL, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“Constructora SEPROMI ”**
- Con fecha 13 de marzo en oficio número 31-2019, se me nombro supervisor del proyecto, al realizar visita de campo, se verifico que se han realizado trabajos de reacondicionamiento de sub rasante, se ha finalizado la construcción de muros laterales.
- Fecha de inicio: 11 -01-2020 Fecha de Finalización: 09-04-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 41.00 % CONTRATO No. 095-2019**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“AMPLIACION PUESTO DE SALUD CANTON BUENA VISTA, ALDEA CORRAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“CONSTRUPROYECTOS SL”**
- Con fecha 16 de marzo en oficio número 36-2019, se me nombro supervisor del proyecto, al realizar visita de campo, se verifico que el supervisor anterior, había realizado trámites para aprobación de Documentos de Cambio. Los trabajos están en fase de finalización.
- Fecha de inicio: 01 -10-2029 Fecha de Finalización: 27-05-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 90.00 % CONTRATO No. 052-2019**



