




DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
SUPERVISION DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
ABRIL 2020
INGENIERO ERWIN ORLANDO GRANADOS MORALES
COLEGIADO No. 3264

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION EDIFICIO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“COINPRO”**
- Se realizaron documentos de cambio, aprobados por el Concejo Municipal, para mejoras del proyecto, se tienen colocadas las estructuras de las columnas, y se fundieron zapatas y se colocaron pernos, alineados con estación total
- Fecha de inicio: 04-12-2019 Fecha de Finalización: 30-06 2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 18.00 % CONTRATO No. 083-2019**

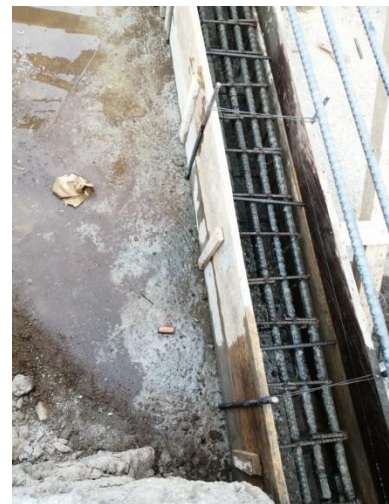

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (ANTIGUO) 6A. AVENIDA 5-40 ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“INGENIERIA PARA PROYECTOS CIVILES”**
- Durante el mes de abril se realizaron visitas de campo en donde se pudo verificar que se en la duela se ha finalizado el lijado, se hicieron pruebas para el acabado final, se están finalizando de intervenir en acabados de muros. Se tuvo visita de Concejo Municipal
- Fecha de inicio: 27 -09-2019 Fecha de Finalización: 23-07-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 80.00 % CONTRATO No. 047-2019**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN VIA 3 Y 3ª. AVENIDA D ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“RIVERA MENDEZ”**
- Durante el mes de abril se finalizaron los trabajos de colocación y compactación de base granular, se aprobaron documentos de cambio y se inició la colocación de bordillo prefabricado
- Fecha de inicio: 23 -09-2019 Fecha de Finalización: 19-05-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 35.00 % CONTRATO No. 042-2019**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO CANTON SAN MIGUEL, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“Constructora SEPROMI ”**
- Durante el mes de abril, se tuvo personal trabajando en la excavación de cajuela y se inició con la colocación de base granular. Se aprobaron Documentos de Cambio, ´por el Honorable Concejo Municipal
- Fecha de inicio: 11 -01-2020 Fecha de Finalización: 09-04-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 45.00 % CONTRATO No. 095-2019**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"AMPLIACION PUESTO DE SALUD CANTON BUENA VISTA, ALDEA CORRAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **"CONSTRUPROYECTOS SL"**
- Durante el mes de abril, se aprobaron los Documentos de Cambio, y se realizaron trabajos de correcciones, se finalizó el proyecto satisfactoriamente.
- Fecha de inicio: 01 -10-2019 Fecha de Finalización: 27-05-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % CONTRATO No. 052-2019**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 4 SOBRE 4ª.+ AVENIDA ZONA 3, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“RIVERA MENDEZ”**
- Durante el mes de abril se finalizaron los trabajos de colocación y compactación de base granular, se inició la colocación de bordillo
- Fecha de inicio: 13 -12-2019 Fecha de Finalización: 09-06-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 40.00 % CONTRATO No. 070-2019**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL CASERIO LAS VASQUEZ, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“CONSTRUCTORA G&G”**
- Habiéndome nombrado como supervisor del proyecto, se realizó supervisión y se verifico que se tiene personal en la obra, así como materiales, se tiene fundido una parte de bordillo y colocación de empedrado.
- Fecha de inicio: 28 -12-2019 Fecha de Finalización: 24-05-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 45.00 % CONTRATO No. 091-2019**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 3A. AVENIDA ZONA 4 ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“COINPRO”**
- Habiéndome nombrado como supervisor del proyecto, se realizó supervisión y se verifico que se tiene personal en la obra, se han realizado trabajos de conformación de sub rasante, colocación y compactación de base granular, fundición de bordillo y colocación de adoquín.
Fecha de inicio: 23 -01-2019 Fecha de Finalización: 21-05-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 75.00 % CONTRATO No. 097-2019**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE IV) CANTON CAROLINA, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“CONSTRUCTORA EL PROGRESO”**
- Habiéndome nombrado como supervisor del proyecto, se realizó supervisión y se verifico que se tiene personal en la obra, se han realizado trabajos de conformación de sub rasante, colocación y compactación de base granular, fundición de bordillo y colocación de adoquín. Fecha de inicio: 21 -01-2019 Fecha de Finalización: 19-04-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 45.00 % CONTRATO No. 088-2019**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 1ª. CALLE SECTOR SANTA RITA I ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“COINPRO”**
- Habiéndose me nombrado como supervisor del proyecto, se realizó supervisión y se verifico que se tiene personal y maquinaria, realizando corte de talud y conformación de sub rasante; los vecinos están realizando el drenaje.
- Fecha de inicio: 27 -02-2019 Fecha de Finalización: 25-06-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 15.00 % CONTRATO No. 102-2019**




SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 4A. CALLE DE ACCESO 1A. HACIA ACCESO 1 ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“COINPRO”**
- Habiéndome nombrado como supervisor del proyecto, se realizó supervisión y se verifico que se tiene personal y maquinaria, realizando conformación de sub rasante, mejorando el alineamiento vertical, los vecinos hicieron solicitud para quitar cuneta y ampliar con adoquín, así mismo que se coloque tubería para evacuar el agua pluvial al zanjón.
- Fecha de inicio: 28 -02-2020 Fecha de Finalización: 26-06-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 15.00 % CONTRATO No. 100-2019**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS OROZCOS (FASE II) CANTON CAROLINA, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“CONSTRUCTORA JP”**
- Habiéndome nombrado como supervisor del proyecto, se realizó supervisión y se verifico que se tiene personal, Se ha colocado el material de base granular, fundición de bordillo, se trabaja en colocación de adoquín, una rejilla se ordenó que se reubicara.
- Fecha de inicio: 23 -01-2020 Fecha de Finalización: 21-05-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 75.00 % CONTRATO No. 96-2019**

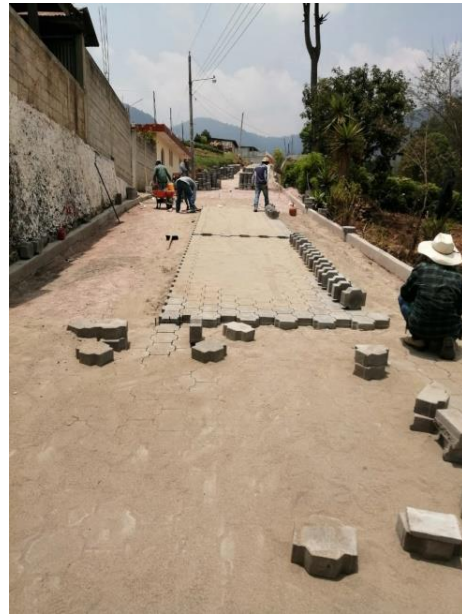

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE II) CALLE PRINCIPAL ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“COINPRO”**
- Habiéndome nombrado como supervisor del proyecto, se realizó supervisión y se verifico que se tiene ejecutado reacondicionamiento de sub rasante, colocación y compactación de base granular, se iniciaron los trabajos de fundición de bordillo.
- Fecha de inicio: 24 -02-2020 Fecha de Finalización: 22-07-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 30.00 % CONTRATO No. 001-2020**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“CONSTRUCTORA JP”**
- Habiéndose me nombrado como supervisor del proyecto, se realizó supervisión y se verifico que se tiene personal realizando trabaos de demolición.
- Fecha de inicio: 23 -01-2020 Fecha de Finalización: 20-06-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 15.00 % CONTRATO No. 098-2019**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO (FASE II) PARAJE AGUA TIBIA, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: **“CONSTRUCTORA JP”**
- Habiéndome nombrado como supervisor del proyecto, se realizó supervisión y se verifico que se han realizado trabajos de reacondicionamiento de sub rasante, y se tiene personal fundiendo bordillo.
- Fecha de inicio: 28 -02-2019 Fecha de Finalización: 26-07-2020
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 15.00 % CONTRATO No. 101-2019**



Se han realizado visitas de campo con Sindicos y Concejales , a diferentes proyectos para verificar el avance y ver que se cumpla con el Control de calidad, como es laboratorios para densidades, diseño de mezcla, y dejar recomendaciones para mejorar los proyectos.

“MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (ANTIGUO) 6A. AVENIDA 5-40 ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS”



MEJORAMIENTO PISCINAS, AGUA TIBIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

