

SUPERVISION DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
AGOSTO 2020
INGENIERO ERWIN ORLANDO GRANADOS MORALES
COLEGIADO N.º 3264

Erwin Granados Morales
INGENIERO CIVIL
C.º 3264

SUPERVISION DE OBRAS



- Proyecto: "MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN VIA 3 Y 3ª. AVENIDA D ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: "RIVERA MENDEZ"
- Durante el mes se finalizaron con la colocación de adoquín así como fundición de llaves de confinamiento y de remate, por la situación del transportese atraso el adoquín decorativo, se iniciaron los trabajos de colocación.
- Fecha de inicio: 23 -09-2019 Fecha de Finalización: 19-05-2020
- AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 92.00 % CONTRATO No. 042-2019



Rivera Granados Morales
INGENIERO CIVIL
COL. 2244

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 4 SOBRE 4^a, + AVENIDA ZONA 3, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: "RIVERA MENDEZ"
- Durante el presente mes se mejoró el material de base granular y en donde hace falta se aplicó suelo cemento, se iniciaron con los trabajos de colocación de adoquín y fundición de llaves de confinamiento.
- Fecha de Inicio: 13 -12-2019 Fecha de Finalización: 09-06-2020
- AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 50.00 % CONTRATO No. 070-2019

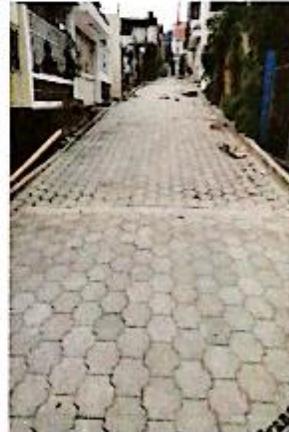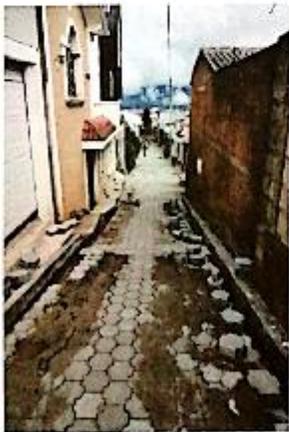

Rivera Grajales Morales
INGENIERO CIVIL
C.D.L. 3284

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN DE 2A CALLE A 3A CALLE AVENIDA LAS JUANITAS, ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: "G&G"
- Durante el presente mes se continuaron con los trabajos de colocación de adoquín y fundición de llaves de confinamiento, se presentaron documentos de cambio para su aprobación.
- Fecha de Inicio: 10-03-2020 Fecha de Finalización: 19-10-2020
- AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 98.00 % CONTRATO No. 003-2020



Ing. Carlos Morales
INGENIERO CIVIL
C.R. 3284





SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (ANTIGUO) 6A. AVENIDA 5-40 ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: "INGENIERIA PARA PROYECTOS CIVILES"
- Se finalizaron los trabajos de colocación de piso, se tiene personal carpinteros trabajando en la restauración de puertas y ventanas, y colocando machimbre, así como aplicando acabado de en duela del segundo nivel, en la fachada se tiene personal realizando el acabado en los capiteles y figuras en alto relieve, aplicando pintura.
- Durante el mes Fecha de Inicio: 27 -09-2019 Fecha de Finalización: 23-07-2020
- AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 93.00 % CONTRATO No. 047-2019



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4A Y 5A CALLES ENTRE 1A Y 2A AVENIDAS ZONAS 1 Y 3 ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: "PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE GUATEMALA-PRODIGUA"
- Durante el mes de agosto se finalizaron los trabajos, se recibió notificación del contratista, por lo que se realizó medición y cuantificación, habiéndose cumplido con la totalidad de los trabajos satisfactoriamente.
- Fecha de inicio: 10 -01-2020 Fecha de Finalización: 19-08-2020
- AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % CONTRATO No. 090-2019

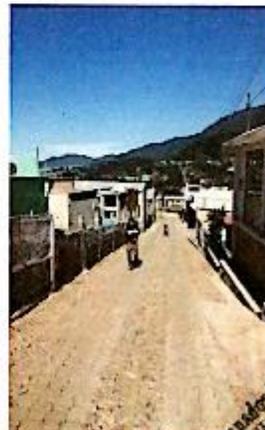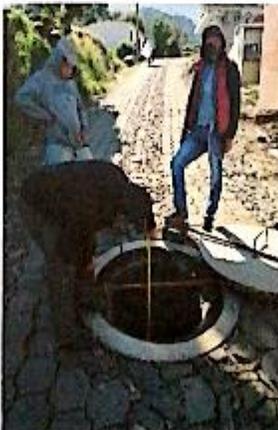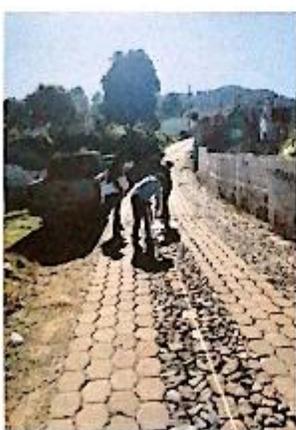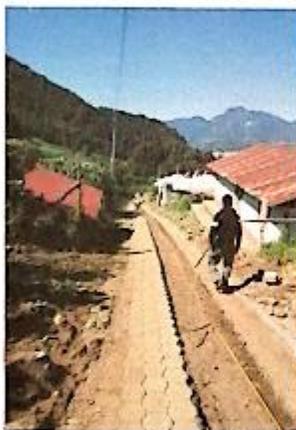

Erwin Granados Morales
INGENIERO CIVIL
COL. 3264

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "CONSTRUCCION EDIFICIO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: "COINPRO"
- Durante este mes se han finalizado los trabajos de armado de estructura de acero en los cuatro niveles, se realizaron pruebas de penetración de los cordones de soldadura y se iniciaron a colocar la lámina para la losa acero.
- Fecha de inicio: 04-12-2019 Fecha de Finalización: 30-06 2020
- AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 55.00 % CONTRATO No. 083-2019



Armando Morales
INGENIERO CIVIL
(C.O. 1234)

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL CASERIO LAS VASQUEZ, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: "CONSTRUCTORA G&G"
- Durante el mes se finalizaron los trabajos, se recibió notificación del contratista indicando que se habían terminado los trabajos, por lo que se realizó la medición y cuantificación verificando que se ejecutaron todos los renglones contratados, se reubico un transversal
- Fecha de Inicio: 28 -12-2019 Fecha de Finalización: 08-08-2020
- AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % CONTRATO No. 091-2019



Arquí. Guadalupe Morales
INGENIERO CIVIL
C. No. 3794

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: "CONSTRUCTORA JP"
- Durante este mes se finalizaron los trabajos contratados, se realizaron unas mejoras en cuanto a ubicación, pero los renglones se ejecutaron en su totalidad.
- Fecha de inicio: 23-01-2020 Fecha de Finalización: 20-06-2020
- AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % CONTRATO No. 098-2019



*Arvio Granados Morales
INGENIERO CIVIL
C.O.L. 2224*

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO EL CHICHICASTE, ALDEA CHIM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Marcos
- Constructora: "C Y R INGENIERIA"
- Durante el mes se finalizaron los trabajos de colocación de barandal, así como mejoramiento en el área de patio, en gradas y adoquinado, terminado la aplicación de pintura, puertas y ventanas.
- Fecha de inicio: 30-12-2019 Fecha de Finalización: 31-08-2020
- AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 97.00 % CONTRATO No. 072-2019



Erwin Cruzales Morales
INGENIERO CIVIL
COL. 3204
