




**SUPERVISION DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDROS SACATEPÉQUEZ
MARZO DE 2021**

**INGENIERO CIVIL WILDER ALEXANDER VELÁSQUEZ MIRANDA
COLEGIADO NO. 14,888**


WILDER ALEXANDER
VELÁSQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A. AVENIDA ZONA 4, ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"CONSTRUCTORA AMERICANA, KRCC"**

Hasta el mes de marzo se han ejecutado el 84% de los renglones contratados, quedan pendientes de ejecutar algunos Pozos de visita, Empedrado, Lechado de empedrado, Paso de Zanjón y Recubrimiento de tubería.


Fecha de inicio: 21/10/2020

Fecha de finalización: 22/04/2021

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA

84.00%

CONTRATO No. 009-2,020



WILDER ALEXANDER
VELASQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **S.M.C. SERVICIOS MÚLTIPLES EN CONSTRUCCIÓN**

Hasta el mes de marzo se ejecutaron trabajos de acabados finales en todos los elementos del Sistema de Tratamiento y falta fundir gradas de ingreso, culminar con el adoquinado de calle ingreso, construir rejilla e instalar equipo de bombeo .

Fecha de inicio: 28/10/2020


Fecha de finalización: 25/06/2021

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA

95.00%

CONTRATO No. 012-2020




WILDER ALEXANDER
VELÁSQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA SAN PEDRO PETZ MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **INGENIERIA PARA PROYECTOS CIVILES**

Hasta el mes de marzo faltan por ejecutar metros lineales de bordillo y completar los metros cuadrados de empedrado.

Fecha de inicio: 16/11/2020


Fecha de finalización: 15/04/2021

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA

95.59%

CONTRATO No. 010-2,020




WINDER ALEXANDER
VELASQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 1A. AVENIDA A ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"COINPRO"**


Hasta el mes de marzo han ejecutado los renglones de Demolición y Traslado de Planchas, Replanteo, Corte de Cajuela y Conformación de Sub-Rasante.

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA

10.00%

CONTRATO No. 006-2,020




WILDER ALEXANDER
VELÁSQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO (FASE II) CALLE PRINCIPAL CASERIO PACONCHE, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"CONSTRUCTORA J.L.C."**

Hasta el mes de marzo se han ejecutado el 98% de los renglones contratados, falta realizar la fundición de llave de remate y realizar limpieza final.


Fecha de inicio: 04/12/2020

Fecha de finalización: 03/04/2021

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 98.00%

CONTRATO No. 016-2,020




WILDER ALEXANDER
VELASQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888



SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) CASERIO EL BOQUERON ALDEA SACUCHUM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marco:

Constructora: **"CONSTRUCTORA CIFUENTES VELASQUEZ"**


El proyecto ha sido concluido alcanzándose un avance físico de 96.57%


Fecha de inicio: 08/12/2020

Fecha de finalización: 08/03/2021

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 96.57%

CONTRATO No. 022-2,020

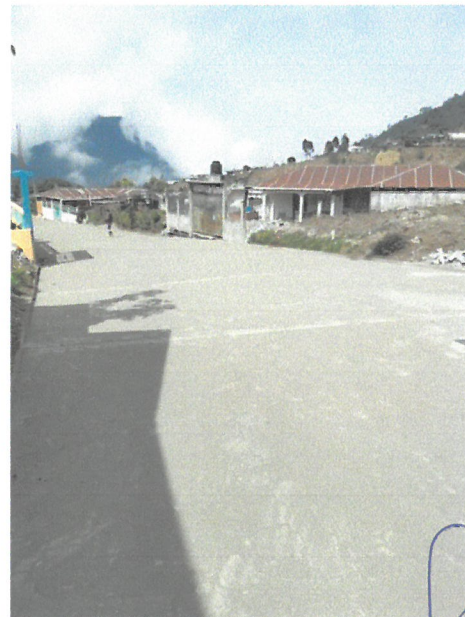


WILDER ALEXANDER
VELASQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **CONSTRUCTORA Y COMERCIAL SEDIPRO**

Hasta el mes de marzo se ratifico que se han ejecutado todos los renglones contratados.


Fecha de inicio: 07/12/2020

Fecha de finalización: 07/03/2021

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00%

CONTRATO No. 020-2,020




WILDER ALEXANDER
VELASQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888



SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 5A. CALLE TRAMO FINAL Y 3A. AVENIDA ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"CONSTRU-IR"**


Hasta el mes de marzo se han ejecutado el 80% de los renglones contratados, falta realizar instalación del resto de adoquines, Fundición de Bordillos, Reacondicionar brocales, Fundición de llave de remate, rejilla, realizar limpieza final y cumplir con la mitigación ambiental.

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA

80.00%

CONTRATO No. 023-2,020




WILDER ALEXANDER
VELÁSQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN CANTON CENTRO 1, ALDEA SACUCHUM DOLORES SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"FERRCONS BALCARCEL"**


Hasta el mes de marzo se ha ejecutado la mayor parte de los renglones contratados, se siguen realizando trabajos para completar el 100% de lo contratado.

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA

90.00%

CONTRATO No. 022-2,020




**WILDER ALEXANDER
VELÁSQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14.888**

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA CANTEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marco:

Constructora: **"CONSTRUCTORA SIGLO 21"**

Hasta el mes de marzo se están ejecutando los renglones de Repello + Cernido en muros e instalación de Piso monostrato de granito.

Fecha de inicio: 25/01/2021

Fecha de finalización: 24/06/2021

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 64.00%

CONTRATO No. 030-2,020




**WILDER ALEXANDER
VELASQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888**

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO (FASE II) 2A. AVENIDA ZONA 2, ALDEA SAN JOSE CABEN SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"DETALLES, ARTE EN ARQUITECTURA"**


Hasta el mes de marzo se están ejecutando lo renglones de Trazo y Replanteo, Corte de cajuela y Conformación de Sub-rasante.

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA

10.00%

CONTRATO No. 039-2,020




**WILDER ALEXANDER
VELASQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888**



SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL)
CASERIO AGUA TIBIA, ALDEA MAVIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marco:

Constructora: **"CONSTRUCTORA RD"**

Hasta el mes de marzo se han ejecutado trabajos de Trazo y replanteo, Corte de cajuela, Conformación de sub-rasante y preparación de la base.

Fecha de inicio: 18/02/2021

Fecha de finalización: 18/06/2021

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 12.00%

CONTRATO No. 038-2,020




WILDER ALEXANDER
VELÁSQUEZ M. RANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888



SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN INGRESO PRINCIPAL CASERIO LOS JAZMINES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCO**


El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marco:

Constructora: **"CONSTRUCTORA G&G"**

Hasta el mes de marzo se han ejecutado trabajos de Trazo y replanteo y Corte de Terreno

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 5.00%

CONTRATO No. 029-2,020

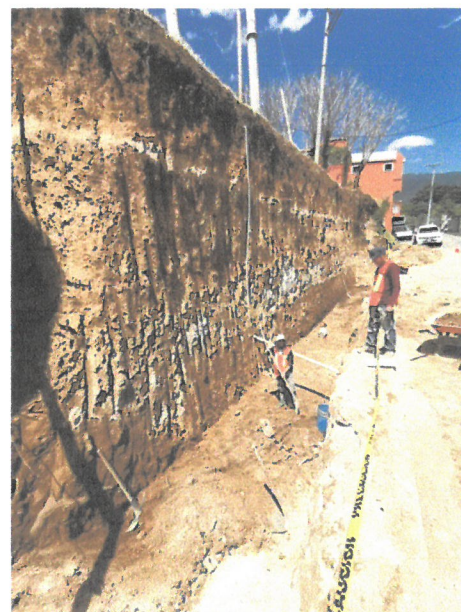


WILDER ALEXANDER
VELASQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) ZONA 4, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"DETALLES, ARTE EN ARQUITECTURA"**

En el mes de marzo se han ejecutando los primeros nueve renglones contratados, falta realizar los renglones de Reacondicionamiento de brocales, Llaves de confinamiento, Loseta de remate, Rótulo de identificación y Limpieza general.

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA

40.0%

CONTRATO No. 022-2,020




**WILDER ALEXANDER
VELÁSQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14.888**

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL)**
1A. CALLE ZONA 3, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marco:


Constructora: **"C Y R INGENIERÍA"**

Hasta el mes de marzo se han ejecutado el 45% de los renglones falta realizar los renglones de Reacondicionamiento de Brocales, Transversales, Canal + Rejilla, Loseta de Remate, Rótulo de identificación y Limpieza General.

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 45.00%

CONTRATO No. 006-2,021




WILDER ALEXANDER
VELASQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO DE CALLE OSCAR BARRIOS HACIA ESC PRIMARIA Z. 4 SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marco:

Constructora: **"CONSTRUCTORA JC 3"**

Hasta el mes de marzo se están ejecutando los trabajos de Replanteo topográfico, Corte de cajuela, Conformación de sub-rasante, Conformación de base granular, Bordillos laterales Y Carrileras de concreto.

Fecha de inicio: 05/03/2021

Fecha de finalización: 01/09/2021

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 30.00%

CONTRATO No. 007-2,021




WILDER ALEXANDER
VELASQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERÍO ALTA VISTA,
ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ,**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"S.M.C. SERVICIOS MÚLTIPLES EN CONSTRUCCIÓN"**

Hasta el mes de marzo se han ejecutado el 92% de los renglones contratados, a excepción de la señalización y limpieza los cuales no se han trabajado.

Fecha de inicio: 28/10/2020


Fecha de finalización: 24/08/2021

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA

92.00%

CONTRATO No. 013-2,020




WILBER ALEXANDER
VELÁSQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888



SUPERVISION DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
MARZO 2021
INGENIERO CIVIL GUSTAVO ADOLFO VELÁSQUEZ JUÁREZ
COLEGIADO No. 18,186

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) CALLE PRINCIPAL, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"DETALLES, ARTE EN ARQUITECTURA"**
- Durante este mes se finalizaron los trabajos de fundición de carrileras y la de bordillos con su respectivo repello y también se continúan con los trabajos de rejilla.
- Fecha de inicio: 23-12-2020 Fecha de Finalización: 23-04-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 90.00 % CONTRATO No. 019-2020**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR 7 LOS CEREZALES Y CALLE MIRALVALLE, ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“PROSEINCA”**
- Durante el mes de marzo, se finalizó de fundir las carrileras de concreto, también se iniciaron con los trabajos de fundición de bordillos, se le pidió al contratista el diseño de mezclas.
- Fecha de inicio: 24 -12-2020 Fecha de Finalización: 24-06-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 70.00 % CONTRATO No. 028-2020**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“S.M.C. Servicios Múltiples en Construcción”**
- Se ha realizado la fundición de losa del vertedero de excedencias, canal de rejillas + desarenador, cámaras de sedimentación, se continúa el zanjeado para los muros de contención, se finalizó el levantado de muros de mampostería. Se le pidió al contratista los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 15-01-2021 Fecha de Finalización: 15-08-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 55.00 % CONTRATO No. 031-2020**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“SEDIPRO”**
- Durante el mes se realizaron los trabajos de zanjeo, armado y fundición de columnas de rampas de acceso al segundo nivel y se finalizó la instalación de cubierta de lámina.
- Fecha de inicio: 14-12-2020 Fecha de Finalización: 14-04-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 85.00 % CONTRATO No. 021-2020**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION POZO(S) PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“S.M.C. Servicios Múltiples en Construcción”**
- Falta realizar la prueba de bombeo.
- Fecha de inicio: 23-12-2020 Fecha de Finalización: 23-06-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 60.00 % CONTRATO No. 032-2020**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE PRINCIPAL CASERIO ENTRE RIOS, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“INGARQ”**
- Durante el mes se han realizado los trabajos de Sub-rasante y la preparación de la base, con su respectiva compactación, también se trabajan con las transversales.
- Fecha de inicio: 29-01-2021 Fecha de Finalización: 29-05-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 40.00 % CONTRATO No. 042-2020**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1A. SOBRE 2A. AVENIDA ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“G & G”**
- Durante el mes se finalizó con la fundición de bordillos, también se realizó la cama de arena de asiento, la instalación de adoquinado y fundición de llaves de confinamiento.
- Fecha de inicio: 25-01-2021 Fecha de Finalización: 25-04-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 95.00 % CONTRATO No. 027-2020**




SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“FERRCONS BALCARCEL”**
- Durante el mes se finalizó con el levantado de muros, se inició con el encofrado de vigas, paraleo para el armado de losa y también se trabaja en el módulo de gradas.
- Fecha de inicio: 25-01-2020 Fecha de Finalización: 25-06-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 45.00 % CONTRATO No. 036-2020**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION E IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALES DE TRAFICO EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"GONZALEZ"**
- Durante el mes se iniciaron con los trabajos de remozamiento de estructuras tipo bandera y con la cimentación para bases.
- Fecha de inicio: 26-03-2020 Fecha de Finalización: 26-07-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 3.00 % CONTRATO No. 034-2020**

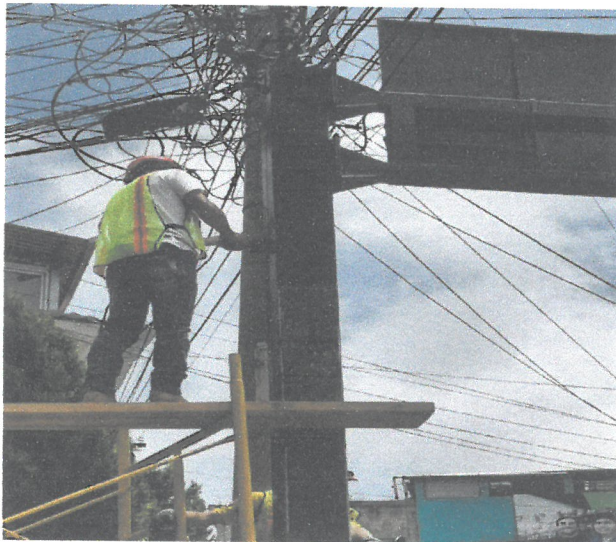

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL CALLE PRINCIPAL ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“EL PROGRESO”**
- Durante el mes se realizaron los trabajos de trazo y replanteo, corte de terreno, conformación de terreno, conformación de la base y fundición de bordillos, al contratista se le solicitaron los diferentes estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 04-03-2021 Fecha de Finalización: 04-07-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 37.00 % CONTRATO No. 041-2020**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) 3A. AVENIDA ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“JC 3”**
- Durante el mes se realizaron los trabajos de trazo y replanteo, corte de cajuela, conformación de Sub-rasante, conformación de la base con su respectiva compactación, al contratista se le solicitaron los diferentes estudios de suelo.
- Fecha de inicio: 09-03-2021 Fecha de Finalización: 09-09-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 40.00 % CONTRATO No. 004-2021**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL (MODULOS 2 Y 3) MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“ARCHILA”**
- Durante el mes se iniciaron con los trabajos preliminares, corte de terreno, trazo y replanteo, zanjeo para zapatas tipo 1, armado de columnas tipo C-1 y zapatas tipo 1.
- Fecha de inicio: 01-03-2021 Fecha de Finalización: 01-11-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 5.00 % CONTRATO No. 040-2020**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) CANTON CAROLINA, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“OCCIDENTE”**
- Durante el mes se realizaron los trabajos de preparación de la base, fundición de bordillos y llaves de confinamiento, canal + rejilla, cama de arena de asiento y adoquinado, al contratista se le solicitaron los diferentes estudios de suelo y de laboratorio.
- Fecha de inicio: 09-02-2021 Fecha de Finalización: 09-06-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 90.00 % CONTRATO No. 008-2021**

