



San Pedro Sacatepéquez, 7 de mayo de 2021

Doctor:
Juan Eliezer González González
Alcalde Municipal.
Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez
Departamento de San Marcos

Un gusto saludarlo, deseándole lo mejor al frente de tan digno cargo.

Adjunto en la presente encontrará el informe ejecutivo de los trabajos ejecutados durante el mes de abril del año 2021, supervisiones a los Proyectos en ejecución, una breve descripción y su Avance Físico, de los proyectos por cotización y licitación; así como proyectos supervisados con miembros del Concejo Municipal

Sin otro particular.

Atentamente



WILDER ALEXANDER
VELÁSQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888

Ing. Wilder Alexander Velásquez Miranda
Supervisor de Obras
Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez



SUPERVISION DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDROS SACATEPÉQUEZ
ABRIL DE 2021
INGENIERO CIVIL WILDER ALEXANDER VELÁSQUEZ MIRANDA
COLEGIADO NO. 14,888

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A. AVENIDA ZONA 4, ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**


El proyeccto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"CONSTRUCTORA AMERICANA, KRCC"**

Durante el mes de abril se han ejecutado el 95.76% de los renglones contratados, quedan pendientes por realizar inspección final de algunos metros de recubrimiento de tubería, Empedrado, Lechado de empedrado y limpieza final.

Fecha de inicio:	21/10/2020	Fecha de finalización:	22/04/2021
AVANCE ACUMULADO A LA FECHA	95.76%	CONTRATO No.	009-2,020




**WILDER ALEXANDE
VELASQUEZ MIRANO
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,88**



SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyeccto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **S.M.C. SERVICIOS MÚLTIPLES EN CONSTRUCCIÓN**

Durante el mes de abril se realizaron las visitas para confirmar los renglones concluídos, verificando con ello los trabajos de acabados finales en todos los elementos del Sistema de Tratamiento, únicamente está pendiente de inspección final los renglones: gradas, pequeñas áreas de adoquinado de calle de ingreso, rejilla e instalación de equipo de bombeo.

Fecha de inicio: 28/10/2020

Fecha de finalización: 25/06/2021

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 96.13%

CONTRATO No. 012-2020



(Handwritten signature)
WILDER ALEXANDE VELASQUEZ MIRANO
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14.8



SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA SAN PEDRO PETZ MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**

El proyeccto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **INGENIERIA PARA PROYECTOS CIVILES**

Durante el mes de abril se realizaron las visitas al proyecto, verificando que se han ejecutado las cantidades contratadas.

Fecha de inicio: 16/11/2020 **Fecha de finalización:** 15/04/2021

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00% **CONTRATO No.** 010-2,020



[Handwritten Signature]
WILDER ALEXANDER VELASQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,884

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 1A. AVENIDA A ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"COINPRO"**

Hasta el mes de abril se han ejecutado los renglones de Demolición y Traslado de Planchas, Replanteo, Corte de Cajuela y Conformación de Sub-Rasante.

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA

10.00%

CONTRATO No. 006-2,020




**WILDER ALEXANDER
VELASQUEZ MIRANO A
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14.888**

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO (FASE II) CALLE PRINCIPAL CASERIO PACONCHE, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyeccto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"CONSTRUCTORA J.L.C."**

En el mes de abril se realizaron las visitas al proyecto verificando la ejecución de los renglones de trabajo contratados, logrando un avance físico final de 99.96%.

Fecha de inicio: 04/12/2020

Fecha de finalización: 03/04/2021

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA

99.96%

CONTRATO No. 016-2,020




**WILDER ALEXANDER
VELASQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14.888**



SUPERVISION DE OBRAS

MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) CASERIO EL BOQUERON ALDEA SACUCHUM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: "CONSTRUCTORA CIFUENTES VELASQUEZ"

El proyecto ha sido concluido alcanzándose un avance físico final de 96.57%

Fecha de inicio: 08/12/2020 Fecha de finalización: 08/03/2021

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 96.57% CONTRATO No. 022-2,020



WILDER ALEXANDER
VELASQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 5A. CALLE TRAMO FINAL Y 3A. AVENIDA ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"CONSTRU-IR"**

En el mes de abril, en visitas de verificación de renglones ejecutados del proyecto se determinó que el mismo ha sido concluido, lográndose un avance físico final de 98.34%.

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA

98.34%

CONTRATO No. 023-2,020




**WILDER ALEXANDER
VELASQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888**

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN CANTON CENTRO 1, ALDEA SACUCHUM DOLORES SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"FERRCONS BALCARCEL"**

Durante el mes de abril se realizaron visitas para verificar el avance físico del proyecto evidenciando un avance de 95.37%

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA

95.37%

CONTRATO No. 022-2,020




**WILDER ALEXANDER
VELÁSQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888**

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA CANTEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"CONSTRUCTORA SIGLO 21"**


Durante el mes de abril se han ejecutado renglones de Repello + Cernido en muros e instalación de Piso monostrato de granito.

Fecha de inicio: 25/01/2021

Fecha de finalización: 24/06/2021

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 70.04%

CONTRATO No. 030-2,020

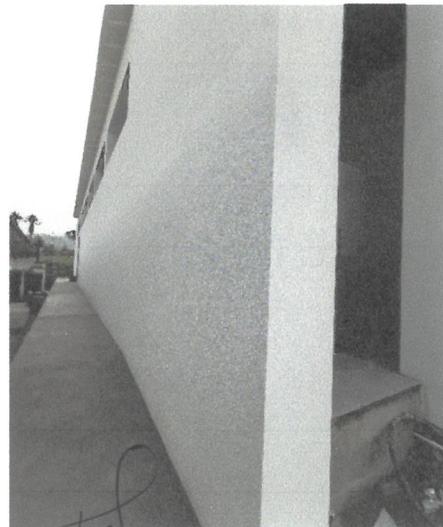


**WILDER ALEXANDER
VELASQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14.888**

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO (FASE II) 2A. AVENIDA ZONA 2, ALDEA SAN JOSE CABEN SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"DETALLES, ARTE EN ARQUITECTURA"**

Durante el mes de abril se ejecutan los renglones de: preparación de base (e=0.20) y Pavimento (0.18 m).

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA

31.61%

CONTRATO No. 039-2,020



**WILDER ALEXANDER
VELASQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888**

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL)
CASERIO AGUA TIBIA, ALDEA MAVIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"CONSTRUCTORA RD"**

Durante el mes de abril se ha trabajado en los renglones de: preparación de la base (e= 0.18 m),
bordillos laterales (0.10 x 0.35 m.)


Fecha de inicio: 18/02/2021

Fecha de finalización: 18/06/2021

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 30.8%

CONTRATO No. 038-2,020




**WILDER ALEXANDER
VELÁSQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,858**

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN INGRESO PRINCIPAL CASERIO LOS JAZMINES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**


El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"CONSTRUCTORA G&G"**

Durante el mes de abril se ha estado ejecutando principalmente el renglón de muro de contención ciclópeo

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 31.7%

CONTRATO No. 029-2,020

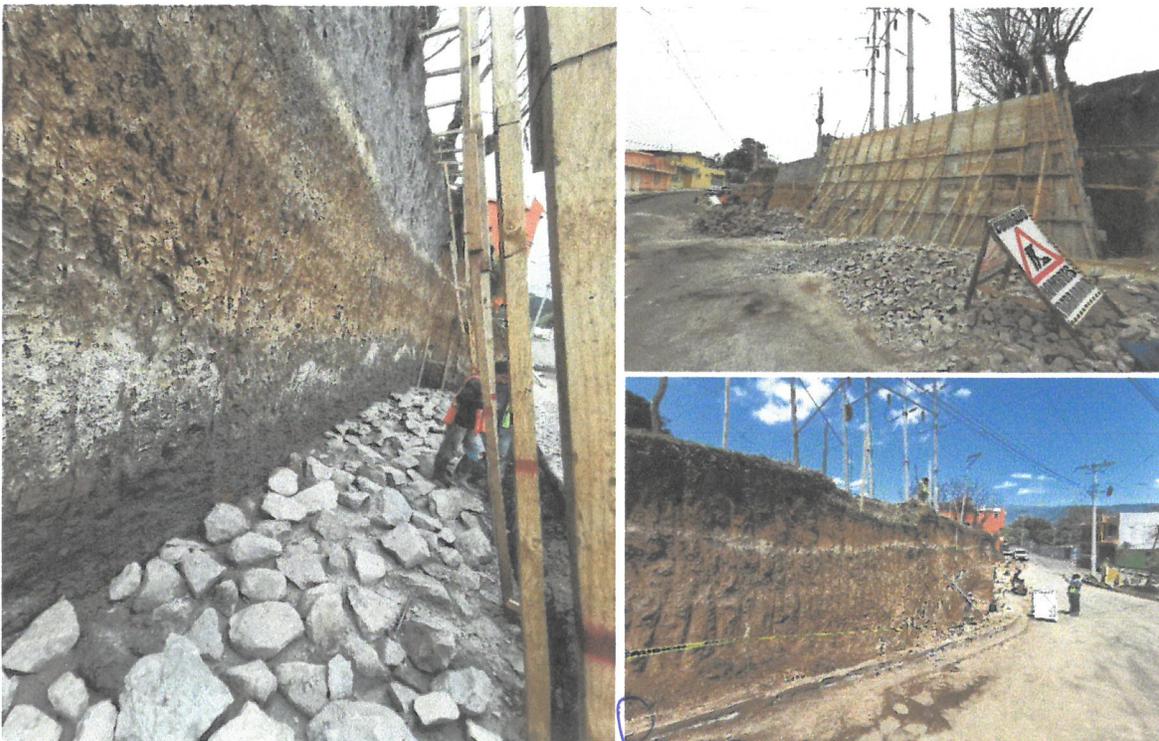


**WILDER ALEXANDER
VELASQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,800**

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) ZONA 4, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.


Constructora: **"DETALLES, ARTE EN ARQUITECTURA"**

Durante el mes de abril se han ejecutado los renglones de: preparación de la base (e=0.20 m), bordillos laterales (0.10 x 0.40 m.), adoquinado (0.24 m x 0.22 m x 0.10 m.)

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA

90.26%

CONTRATO No. 022-2,020

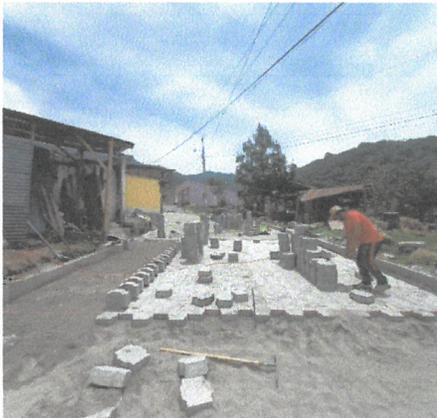


**WILDER ALEXANDER
VELASQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14.888**

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) 1A.
CALLE ZONA 3, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**


El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"C Y R INGENIERÍA"**

Durante el mes de abril se han ejecutado principalmente los renglones de: Carrileras de concreto (e=0.18 m) y empedrado (e=0.10 m.) + lechado

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 70.10%

CONTRATO No. 006-2,021

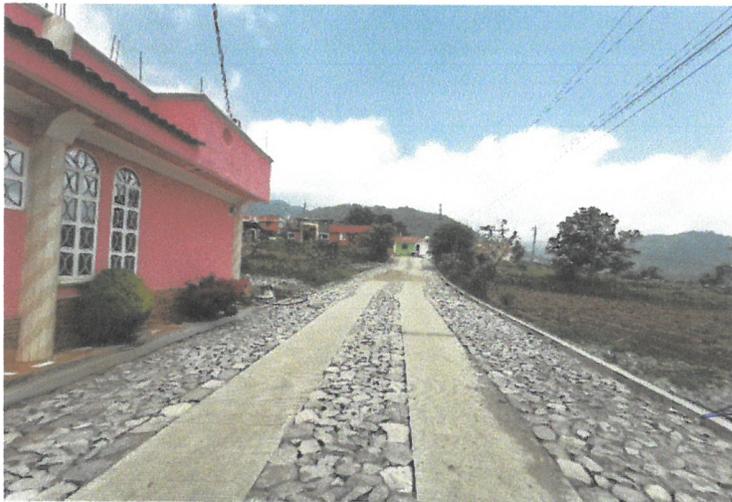

**WILDER ALEXANDER
VELASQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14.885**

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO DE CALLE OSCAR BARRIOS HACIA ESC PRIMARIA Z. 4 SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"CONSTRUCTORA JC 3"**

Durante el mes de abril se han ejecutado principalmente los renglones de Conformación de base granular (e=0.18 m.), Bordillos laterales (0.40 m x 0.10 m) de concreto de 3000 PSI y Carrileras de concreto (0.80 m) T = 0.18 m., 4000 PSI


Fecha de inicio: 05/03/2021

Fecha de finalización: 01/09/2021

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 50.02%

CONTRATO No. 007-2,021

WILDER ALEXANDER
VELASQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888

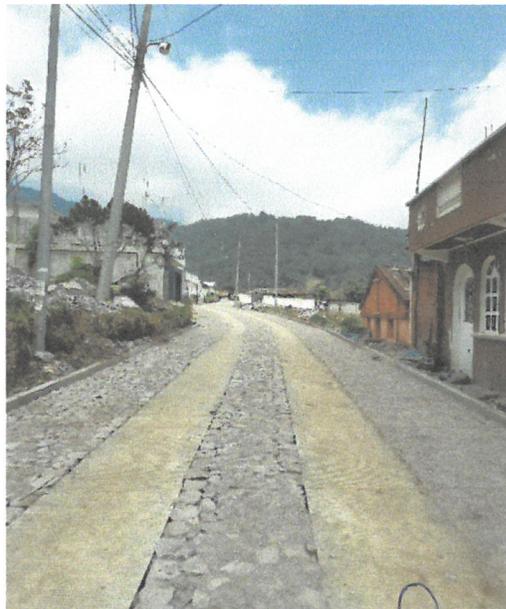


WILDER ALEXANDER
VELASQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERÍO ALTA VISTA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"S.M.C. SERVICIOS MÚLTIPLES EN CONSTRUCCIÓN"**

Durante el mes de abril se han estado realizando acabados en instalaciones generales PTAR y concluyendo los caminamientos.

Fecha de inicio: 28/10/2020 **Fecha de finalización:** 24/08/2021

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 96.14% **CONTRATO No.** 013-2,020




**WILDER ALEXANDER
VELÁSQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14.258**

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **CONSTRUCCIÓN EDIFICIO EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"COINPRO"**

Durante el mes de abril se han trabajado principalmente los renglones: Instalación eléctrica de iluminación, Decoración de fachada, muro de block para cerramiento

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 85.00%

CONTRATO No. 083-2,019




**WILDER ALEXANDER
VELASQUEZ MIRANO
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14.888**



SUPERVISION DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
ABRIL 2021
INGENIERO CIVIL GUSTAVO ADOLFO VELÁSQUEZ JUÁREZ
COLEGIADO No. 18,186



San Pedro Sacatepéquez, 06 de mayo de 2021

Doctor:

Juan Eliézer González González

Alcalde Municipal.

Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

Departamento de San Marcos

Un gusto saludarlo, deseándole lo mejor al frente de tan digno cargo.

Adjunto en la presente encontrara el informe ejecutivo de los trabajos ejecutados durante el mes de abril del año 2021, supervisiones a los Proyectos en ejecución, una breve descripción y su Avance Físico, de los proyectos por cotización y licitación.

Sin otro particular.

Atentamente

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,180

Ing. Gustavo Adolfo Velásquez Juárez

Supervisor de Obras

Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) CALLE PRINCIPAL, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“DETALLES, ARTE EN ARQUITECTURA”**
- Durante este mes se finalizaron los trabajos de armado, fundición de canal + rejilla y también se continúan con el empedrado.
- Fecha de inicio: 23-12-2020 Fecha de Finalización: 23-05-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 95.00 % CONTRATO No. 019-2020**




SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR 7 LOS CEREZALES Y CALLE MIRALVALLE, ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"PROSEINCA"**
- Durante el mes de abril, se finalizó con el armado, fundición de rejilla tipo 3, se continua con el empedrado del sector los cerezales, también se iniciaron con los trabajos de la base (material granular) de la calle miralvalle.
- Fecha de inicio: 09-03-2021 Fecha de Finalización: 09-09-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 80.00 %** **CONTRATO No. 028-2020**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“SEDIPRO”**
- Durante el mes se finalizaron los trabajos de, armado y fundición y repello de columnas de rampas de acceso al segundo nivel, de cubierta de lámina, de baranda de metal, instalación de ventanas + vidrio y de limpieza final.
- Fecha de inicio: 14-12-2020 Fecha de Finalización: 14-04-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % CONTRATO No. 021-2020**

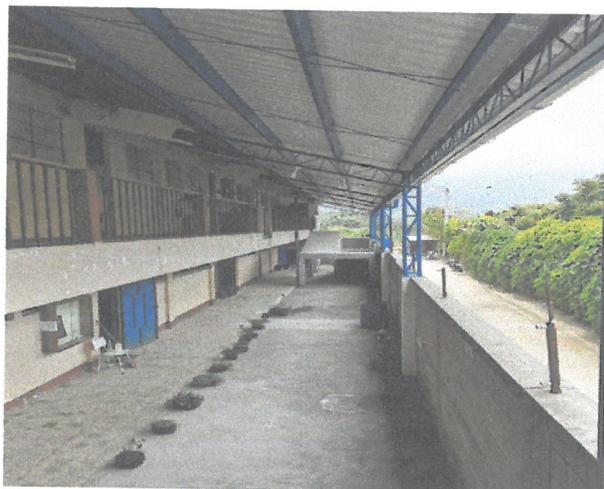

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"CONSTRUCCION POZO(S) PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"S.M.C. Servicios Múltiples en Construcción"**
- Durante el mes de abril se realizó la limpieza, cubeteo, pistoneado, cepillado del pozo, aforo y prueba de bombeo e instalación de la bomba sumergible con sus respectivos accesorios.
- Fecha de inicio: 19-02-2020 Fecha de Finalización: 19-08-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 80.00 % CONTRATO No. 032-2020**




SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE PRINCIPAL CASERIO ENTRE RIOS, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"INGARQ"**
- Durante el mes se han realizado los trabajos de fundición de bordillos, se finalizaron de fundir las transversales y se iniciaron los trabajos de adoquinado.
- Fecha de inicio: 11-03-2021 Fecha de Finalización: 11-07-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 60.00 % CONTRATO No. 042-2020**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1A. SOBRE 2A. AVENIDA ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“G & G”**
- Durante el mes se finalizó con los trabajos de adoquinado, loseta de remate y limpieza general.
- Fecha de inicio: 05-03-2021 Fecha de Finalización: 05-06-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % CONTRATO No. 027-2020**

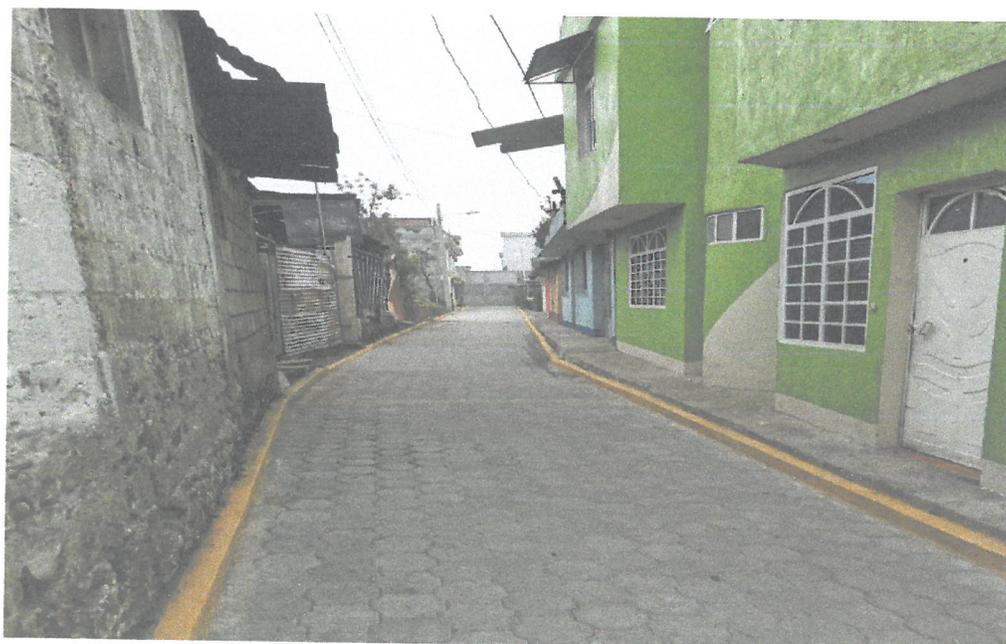

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“FERRCONS BALCARCEL”**
- Durante el mes de abril se finalizó con el armado de la losa y fundición, también se trabaja en el módulo de gradas. Se le solicitó al contratista el diseño de mezcla y los diferentes estudios de laboratorio
- Fecha de inicio: 25-01-2020 Fecha de Finalización: 25-06-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 55.00 % CONTRATO No. 036-2020**




SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION E IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALES DE TRAFICO EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatépéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“GONZALEZ”**
- Durante el mes se finalizaron con los trabajos de remozamiento de estructuras tipo bandera y con la cimentación para bases.
- Fecha de inicio: 25-03-2021 Fecha de Finalización: 25-07-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 6.35 % CONTRATO No. 034-2020**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"S.M.C. Servicios Múltiples en Construcción"**
- Se ha realizado el zanjeado para los muros de contención tipo 1,2 y 3, se sigue fundiendo los muros de contención tipo 1 ,2 y 3. Se le pidió al contratista los diseños de mezclas y pruebas de laboratorio.
- Fecha de inicio: 15-01-2021 Fecha de Finalización: 15-08-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 65.00 % CONTRATO No. 031-2020**

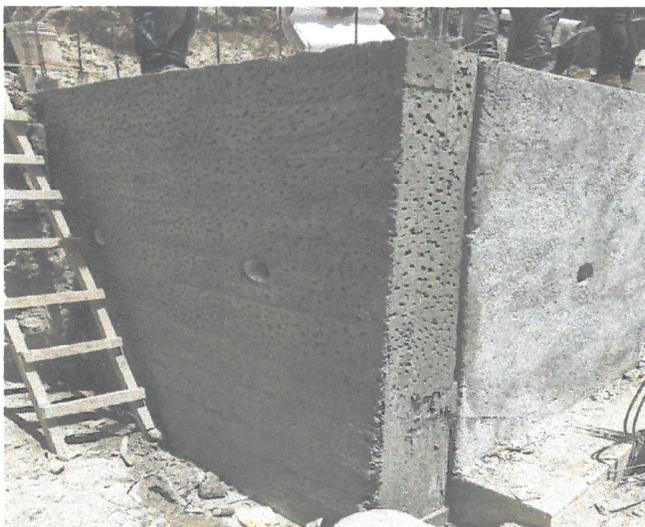

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL CALLE PRINCIPAL ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“EL PROGRESO”**
- Durante el mes se finalizaron los trabajos de bordillo, se realizan los trabajos de armado y fundición de llaves de confinamiento y se iniciaron con los trabajos de adoquinado.
- Fecha de inicio: 04-03-2021 Fecha de Finalización: 04-07-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 70.00 % CONTRATO No. 041-2020**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) 3A. AVENIDA ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“JC 3”**
- Durante el mes se finalizaron los trabajos de bordillo, se realizan los trabajos de armado y fundición de llaves de confinamiento y se continúa con los trabajos de adoquinado.
- Fecha de inicio: 09-03-2021 Fecha de Finalización: 09-09-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 80.00 % CONTRATO No. 004-2021**





SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) CANTON CAROLINA, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“OCCIDENTE”**
- Durante el mes se finalizaron los trabajos de fundición de bordillos, llaves de confinamiento, canal + rejilla y se continua con el adoquinado.
- Fecha de inicio: 09-02-2021 Fecha de Finalización: 09-06-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 95.00 % CONTRATO No. 008-2021**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL (MODULOS 2 Y 3) MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“ARCHILA”**
- Durante el mes se realizaron los trabajos de fundición de zapatas tipo 1, armado de viga de amarre 1, se le solicitaron al contratista los estudios de suelo, el diseño de mezclas y los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 01-03-2021 Fecha de Finalización: 01-11-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 10.00 % CONTRATO No. 040-2020**

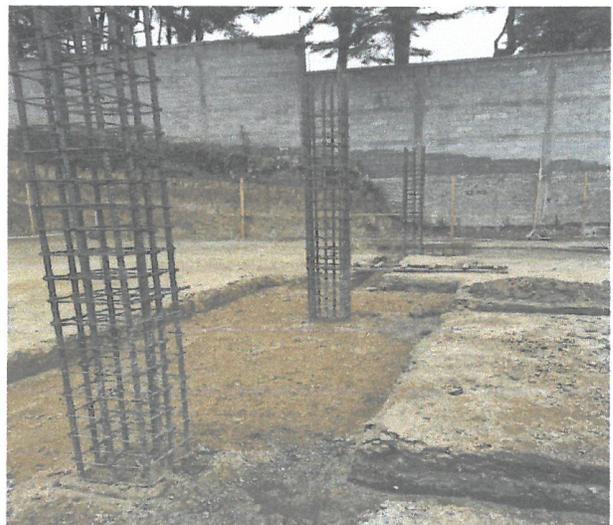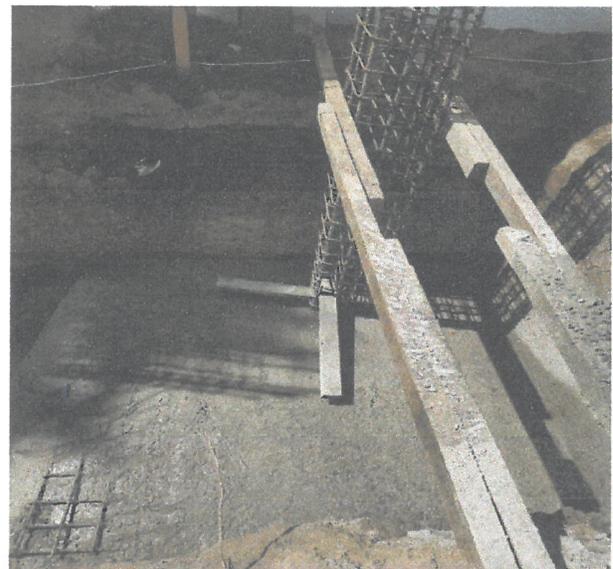

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) AVENIDA NUEVA PRIMAVERA ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“JC 3”**
- Durante el mes se realizaron los trabajos de trazo y replanteo, desmolido, corte de cajuela, conformación de Sub-rasante, al contratista se le solicitaron los diferentes estudios de suelo.
- Fecha de inicio: 08-03-2021 Fecha de Finalización: 08-07-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 10.00 % CONTRATO No. 003-2021**

