

San Pedro Sacatepéquez, 30 de diciembre de 2021

Doctor:

Juan Eliézer González González

Alcalde Municipal.

Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

Departamento de San Marcos

Un gusto saludarlo, deseándole lo mejor al frente de tan digno cargo.

Adjunto en la presente encontrara el informe ejecutivo de los trabajos ejecutados durante el mes de diciembre del año 2021, supervisiones a los Proyectos en ejecución, una breve descripción y su Avance Físico, de los proyectos por cotización y licitación.

Sin otro particular.

Atentamente



Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

Ing. Gustavo Adolfo Velásquez Juárez

Supervisor de Obras

Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez



**SUPERVISION DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
DICIEMBRE 2021**

**INGENIERO CIVIL GUSTAVO ADOLFO VELÁSQUEZ JUÁREZ
COLEGIADO No. 18,186**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN INICIO CALLE PRIMERO DE MAYO CASERIO CRUZ VERDE ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“JC 3”**
- Durante el mes se finalizaron los trabajos de limpieza final, instalación de rotulo de identificación del proyecto y mitigación ambiental.
- Fecha de inicio: 06-09-2021 Fecha de Finalización: 06-12-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % CONTRATO No. 013-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18.186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN + MURO DE CONTENCIÓN 4A, AVENIDA A ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: "G & G"
- Durante el mes se continúa con los trabajos de corte de cajuela ($e=0.25m$), la conformación de la sub-rasante y la preparación de la base.
- Fecha de inicio: 01-10-2021 Fecha de Finalización: 01-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 60.00 % CONTRATO No. 017-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL.
Colegiado No. 18.186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA URBANA MIXTA CANTON EL MOSQUITO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CIFUENTES VELASQUEZ"**
- Durante el mes se trabajó con el armado de losa y se realizó la fundición de losa, se le solicitaron las pruebas de laboratorio al contratista.
- Fecha de inicio: 12-04-2021 Fecha de Finalización: 13-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 60.00 %** **CONTRATO No. 037-2020**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18.186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS FUENTES CANTON LAS FLORES ALDEA CHAMPOLLAP, DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCCIONES PROGRESO"**
- Durante el mes se finalizaron los trabajos de conformación de sub-rasante preparación de la base y fundición de bordillos, se solicitaron los estudios de laboratorio al contratista.
- Fecha de inicio: 16-11-2021 Fecha de Finalización: 16-03-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 35.00 % CONTRATO No. 034-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juar.
INGENIERO CIVIL
Colegiado No 18.186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CANTON CAROLINA HACIA CRUCE CALLE PRINCIPAL ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CONSTRUCTORA Y COMERCIAL AG”**
- Durante el mes se iniciaron los trabajos de corte de cajuela + reacondicionamiento de subrasante, también se trabajó la base de material granular y el bordillo.
- Fecha de inicio: 22-11-2021 Fecha de Finalización: 22-03-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 33.00 % CONTRATO No. 039-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CIFUENTES VELASQUEZ”**
- Durante el mes se trabajó en el armado de las cámaras de sedimentación y también con el muro de contención tipo 2.
- Fecha de inicio: 12-04-2021 Fecha de Finalización: 12-01-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 50.00 %** **CONTRATO No. 033-2020**

Gustavo Adolfo Velásquez Juar.
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL (MODULOS 2 Y 3) MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“ARCHILA”**
- Durante el mes se continúa con los trabajos de repello y cernido del módulo de talleres del nivel 1 y 2, también se continúa trabajando en el armado y fundición de zapatas del módulo de administración.
- Fecha de inicio: 01-03-2021 Fecha de Finalización: 01-12-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 31.50 % CONTRATO No. 040-2020**


Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE PRINCIPAL SECTOR BAÑOS CANTON BUENA VISTA ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"G & G"**
- Durante el mes se continúa trabajando en la cama de arena de asiento y en el adoquinado de tráfico pesado y llaves de confinamiento.
- Fecha de inicio: 22-09-2021 Fecha de Finalización: 22-01-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 95.00 % CONTRATO No. 021-2021**


Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No 18.186

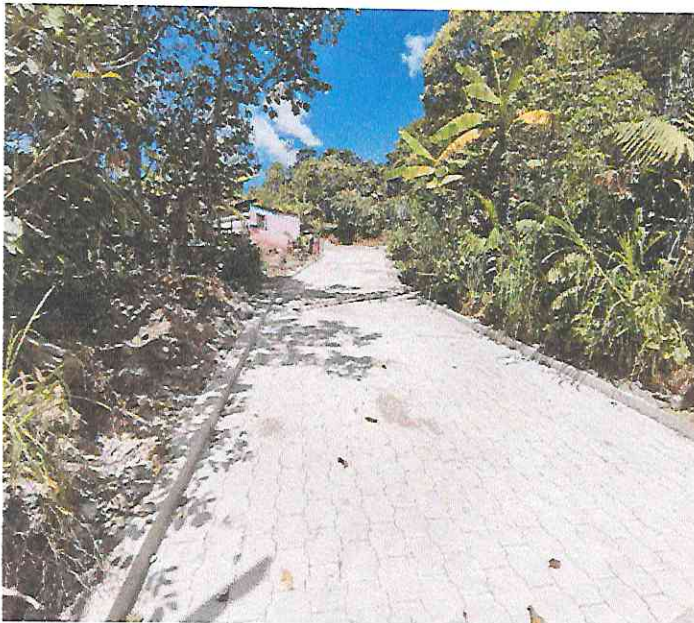

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"DETALLES ARTE EN ARQUITECTURA"**
- Durante el mes se continúa con el levantado de muros de block, el armado y fundición de solera intermedia, también se trabaja en el entarimado para el armado de la viga canal.
- Fecha de inicio: 04-10-2021 Fecha de Finalización: 04-03-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 19.00 % CONTRATO No. 016-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

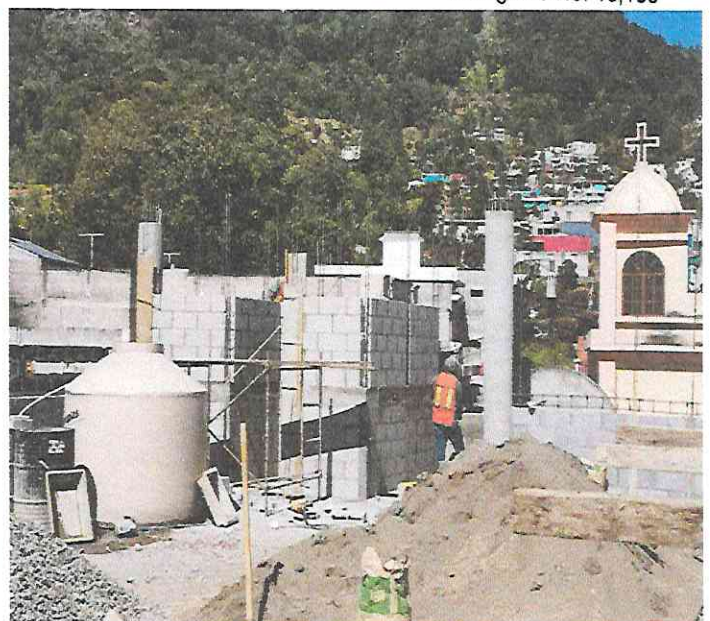

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: “AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. CALLE ZONA 5 ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: “G & G”
- Durante el mes se continúa trabajando con la construcción de pozos de visita, instalación de tubería y relleno + compactación de zanja.
- Fecha de inicio: 16-11-2021 Fecha de Finalización: 16-04-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 80.00 %** **CONTRATO No. 031-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1 CANTON VISTA HERMOSA ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CONSTRUCCIONES PROGRESO”**
- Durante el mes se iniciaron los trabajos de trazo, replanteo y corte de cajuela (esp=0.33m)
- Fecha de inicio: 16-12-2021 Fecha de Finalización: 16-05-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 4.50 % CONTRATO No. 041-2021**


Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO ENTRADA CASERIO SANTA TERESA ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: “CONSTRUCCIONES PROGRESO”
- Durante el mes se iniciaron los renglones de trazo y replanteo, conformación de sub-rasante, corte de cajuela, preparación de la base y bordillos laterales.
- Fecha de inicio: 02-12-2021 Fecha de Finalización: 02-05-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 12.40 % CONTRATO No. 038-2021**


Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18.186

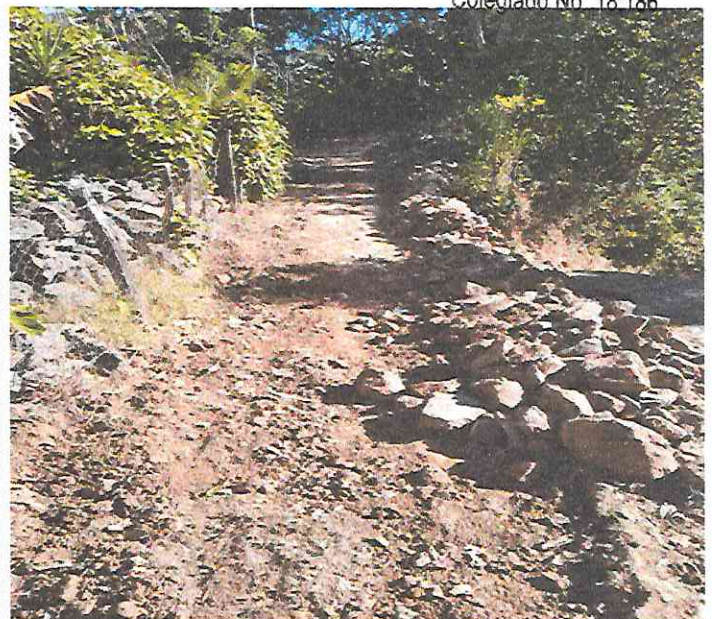

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: “MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA APARICIO MERIDA MORALES CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: “MEGA-CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE”
- Durante el mes se trabajó con los renglones de trazo y replanteo, excavación + compactación, zapata Z-1, columna C-1, columna costanera doble 3”X2”, viga costanera doble 3”X2”, construcción de techo de estructura, columna C-3, levantado de muros, solera intermedia, viga V-3, techo losa de concreto armado, módulo de gradas y rotulo de identificación del proyecto.
- Fecha de inicio: 26-11-2021 Fecha de Finalización: 26-03-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 73.00 % CONTRATO No. 040-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

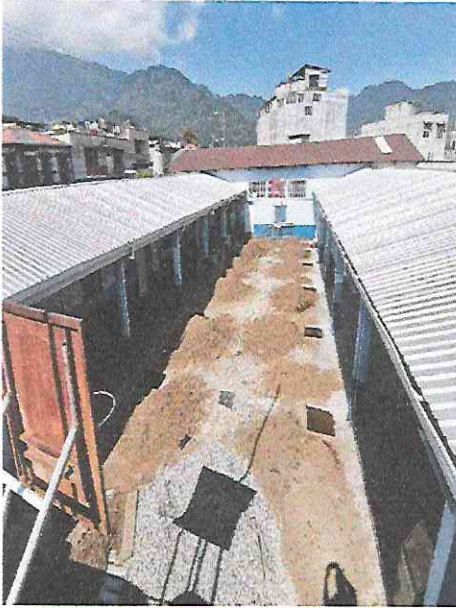

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA (TECHO PATIO) CANTON EL ZAPOTE, ALDEA CORRAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CONSTRUCTORA EL PROGRESO”**
- Durante el mes se trabajó los renglones de columnas C-1, columnas costanera doble de 2”X6”, vigas costanera doble tipo C de 2”X6”, construcción de techo de estructura.
- Fecha de inicio: 12-11-2021 Fecha de Finalización: 12-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 91.00 % CONTRATO No. 012-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“C Y R INGENIERIA”**
- Durante el mes se trabajó con los renglones de trabajos preliminares (limpieza del lugar), extracción de material de cimentación existente, trazo y replanteo. También se trabaja con la excavación y el armado de zapata Z-1 y columna C-1.
- Fecha de inicio: 26-11-2021 Fecha de Finalización: 26-08-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 6.00 % CONTRATO No. 045-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No 18.186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CALLEJON 1 DE 2A. AVENIDA ZONA 4, CANTON TONALA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR”**
- Durante el mes se trabajó con los renglones de trazo y replanteo topográfico y nivelación y compactación de sub-rasante (cajuela).
- Fecha de inicio: 14-12-2021 Fecha de Finalización: 14-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 9.00 % CONTRATO No. 044-2021**


Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No 18.186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 9A. CALLE ACCESO 6 CANTON SAN JUAN DEL POZO ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto de compra directa de la Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CONSTRUCTORA EL PROGRESO”**
- Durante el mes se trabajó con los renglones de trazo y replanteo, corte de cajuela, conformación de sub-rasante, preparación de la base, bordillos laterales, cama de arena de asiento, adoquinado de tráfico pesado, llaves de confinamiento, loseta de remate, rotulo de identificación del proyecto y limpieza final.
- Fecha de inicio: 20-10-2021 Fecha de Finalización: 20-11-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % ACUERDO MUNICIPAL No. 035-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

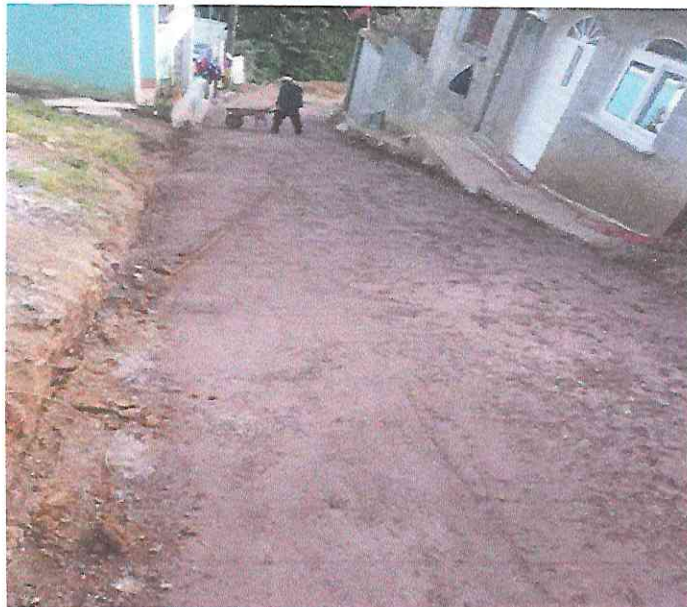




MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS
 ADMINISTRACIÓN 2020 - 2024


NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 9° CALLE ACCESO 6
CANTÓN SAN JUAN DEL POZO ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

PROCEDENCIA DEL FINANCIAMIENTO
FONDOS MUNICIPALES

APORTE MUNICIPAL:	Q.69,986.40
COSTO DEL PROYECTO:	Q.69,986.40


EMPRESA EJECUTORA: CONSTRUCTORA EL PROGRESO
TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 1 MES


Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
 INGENIERO CIVIL
 Colegiado No. 18,186

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 6 ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CONSTRUCTORA EL PROGRESO”**
- Durante el mes se trabajó con los renglones de trazo y replanteo, corte de cajuela ($e=0.33m$) y la conformación de Sub-rasante.
- Fecha de inicio: 08-11-2021 Fecha de Finalización: 08-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 14.10 % CONTRATO No. 044-2020**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18.186

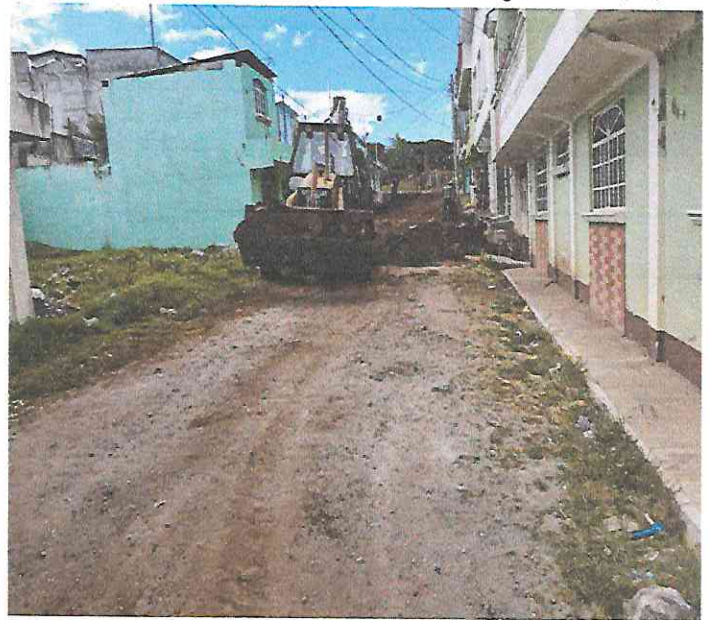



San Pedro Sacatepéquez, 31 de diciembre de 2021

Dr. Juan Eliezer González González
Alcalde Municipal
Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez
Departamento de San Marcos

Es un gusto saludarlo, deseándole lo mejor al frente de tan digno cargo.

Adjunto a la presente encontrará el informe ejecutivo de los trabajos supervisados durante el mes de diciembre de 2021 en los diferentes proyectos que me han sido asignados, en estos se incluyen: descripción y sus correspondientes avances físicos.


Sin otro particular.

Respetuosamente:


WILDER ALEXANDER
VELÁSQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14.888

Ing. Wilder Alexander Velásquez Miranda
Supervisor de Obras Municipales
Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS



ALAS: 4:54 FIRMA: 



WILDER ALEXANDER
VELÁSQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14.588

INGENIERO CIVIL
WILDER ALEXANDER VELÁSQUEZ MIRANDA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES



SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 1A. AVENIDA A ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"COINPRO"**

En el mes de Diciembre se realizaron visitas de supervisión para verificar avance físico y calidad de obra del proyecto, verificando que se realizaron las reparaciones al tramo de pavimento y con ello se da conclusión a la obra y a los renglones contratados.

AVANCE FÍSICO FINAL

100.00%

CONTRATO No. 006-2,020




WILDER ALEXANDER
VELAZQUEZ MORAÑA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888

SUPERVISION DE OBRAS

MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) CASERIO AGUA TIBIA, ALDEA MAVIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.
 Proyecto:

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"CONSTRUCTORA RD"**

Durante el mes de Diciembre se realizaron visitas de supervisión para verificar avance físico y calidad de obra del proyecto. Los vecinos solicitaron la construcción de un muro de contención para evitar hundimientos en un espacio pequeño de calle, dicha obra no contratada fue ejecutada de manera conjunta entre vecinos y contratista. A solicitud de la comunidad no fue construido el drenaje transversal contratado.

Fecha de inicio:	18/02/2021	Tiempo de ejecución:	4 Meses
AVANCE FISICO FINAL	98.70%	CONTRATO No.	038-2,020



WILDER ALEJANDRO
 SACATEPEQUEZ, GUATEMALA
 INGENIERO CIVIL
 COLEGIADO 14,566

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PALENCIA ALDEA SACUCHUM,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **Constructora El Progreso**

En el mes de Diciembre se realizó visita de supervisión para verificar avance físico y calidad de obra del proyecto.

FECHA DE INICIO DE OBRA

15/04/2021


Tiempo de Ejecución: 6 meses

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA:

80.00%

CONTRATO No. 026-2,021




WILDER ALEXANDER
VELASQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14.888

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE RAMON GRAMAJO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO**

El proyeccto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Empresa Ejecutora: **CONSTRUCTORA "INGARQ", INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**

En el mes de Diciembre se realizaron visitas de supervisión para verificar avance físico y calidad de obra del proyecto

Tiempo de Ejecución: 8 Meses

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA

100.00%

CONTRATO No.

043-2,020




WILDER ALEXANDER
VELÁSQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 6 SOBRE 2A. CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE**


El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **Constructora y Comercial SEDIPRO**

En el mes de Diciembre se realizó visita de supervisión para verificar avance físico y calidad de obra del proyecto. El proyecto a la fecha se encuentra concluido.

Fecha de inicio: 9/08/2021 **Tiempo de Ejecución:** 2 meses

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 114.45% **CONTRATO No.** 001-2,021

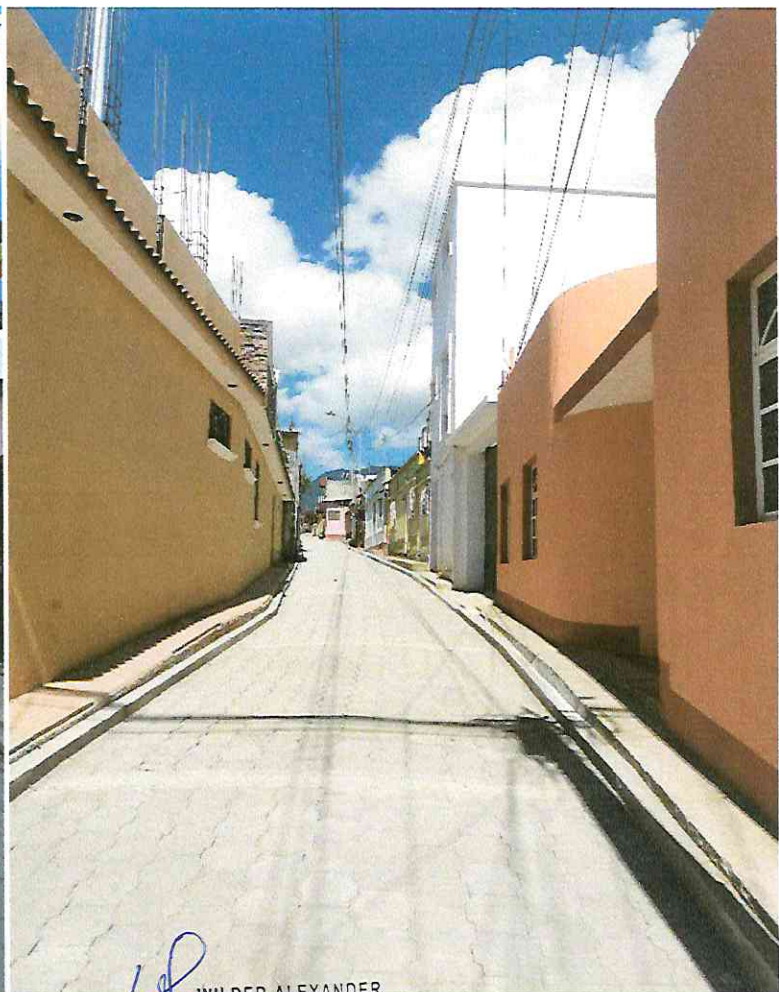


WILDER ALEXANDER
VELÁSQUEZ MIRANZA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **CONSTRUCCIÓN EDIFICIO EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.


Constructora: **"COINPRO"**

En el mes de Diciembre se realizaron visitas de supervisión para verificar avance físico y calidad de obra del proyecto:

Fecha de inicio: 4/12/2019

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 119.85% CONTRATO No. 083-2,019




WILDER ALEXANDER
DELASQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO AGUA TIBIA AREA ECOLOGICA ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **Constructora Earveco**

En el mes de Diciembre se realizó visita de supervisión para verificar avance físico y calidad de obra del proyecto.

Fecha de inicio: 4/10/2021 Tiempo de Ejecución: 5 meses

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 60.00% CONTRATO No. 011-2,021




WILDER ALEXANDER
VELASQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,638

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 6 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **Ingeniería para proyectos Civiles**

En el mes de Diciembre se realizó visita de supervisión para verificar avance físico y calidad de obra del proyecto.

Fecha de inicio:	4/10/2021	Tiempo de Ejecución:	3 meses
AVANCE FÍSICO DE	100.00%	CONTRATO No.	014-2,021




WILDER A. VELASQUEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,618

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO 2a. CALLE ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **CONSTRUCTORA GONZALEZ**

En el mes de Diciembre se realizó visita de supervisión para verificar avance físico y calidad de obra del proyecto.

Fecha de contrato	3/08/2021	Tiempo de Ejecución:	5 meses
AVANCE ACUMULADO A LA FECHA:	50.00%	CONTRATO No.	022-2,021




WILDER ALEXANDER VELASQUEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1E SOBRE 8A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **Construcciones Progreso**

En el mes de Diciembre se realizó visita de supervisión para verificar avance físico y calidad de obra del proyecto.

Fecha de inicio: 4/11/2021 **Tiempo de Ejecución:** 3 meses

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 95.00% **CONTRATO No.** 028-2,021




WILDER ALEXANDER
VELÁSQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,838

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE III) 8A. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **Ingeniería y Constructora Emanuel**

En el mes de Diciembre se realizó visita de supervisión para verificar avance físico y calidad de obra del proyecto.

Fecha de contrato 10/11/2021

Tiempo de Ejecución: 4 meses

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 5.00%

CONTRATO No. 037-2,021




WILDER ALEXANDER
VELASQUEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 16,808

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CASERIO EL BOQUERON HACIA LIMITE CON CENTRO DE COMUNIDAD ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **Constructora CODIPA**

En el mes de Diciembre se realizó visita de supervisión para verificar avance físico y calidad de obra del proyecto.

Fecha de contrato 15/11/2021 Tiempo de Ejecución: 4 meses

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 30.00% CONTRATO No. 046-2,021



WILDER ALEJANDRO DELASQUEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,938



San Pedro Sacatepéquez, 31 de diciembre del 2,021.


SR:

Dr. Juan Eliezer González González
Alcalde Municipal
San Pedro Sacatepéquez.

Adjunto a la presente encontrara el informe ejecutivo del trabajo ejecutado durante el mes de diciembre, supervisiones a los proyectos en ejecución una breve descripción y su avance Físico del proyecto por Licitación y Cotización.

Sin otro particular

Atentamente:


Edwin René Barrios Sandoval
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 10343
Ing. Edwin René Barrios Sandoval
Supervisor de Obras
Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS
RECIBIDO
06 ENE 2022
A LAS 5:00 P.M. FIRMA: 

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 4A. AVENIDA A ZONA 1 CANTON SAN AGUSTIN TONALA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.
- CONSTRUCTORA GONZALEZ
- Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se ejecutan, es importante mencionar que se aprobaron Documentos de Cambio por el Concejo Municipal según acta 094-2021, por lo que al realizar la visita de campo se comprobó la finalización de los renglones de trabajo en: Trazo y Replanteo, Rotulo de Identificación, Muro de Concreto Ciclópeo, Solera Intermedia Block "U" 0.14 X 0.19 X 0.39, (módulo de baños), Losa de Concreto H=0.10 M, se continúan los trabajando en los renglones de: Reacondicionamiento de la Sub-Rasante (85.00 M * 45.00 M), Corte de Cajuela y terraplén (85.00 M * 45.00 M), Preparación de Base H=0.10 M, Relleno Controlado, Caja de Registro + Caja Unión, Drenaje Frances, tubo PVC 4" 80 Psi, Sub-Drenaje, Tubo PVC 6" 80 Psi, Tubo PVC 8" 80 Psi Zapata Z-2 (1.00 X 0.80) M, Zapata Z-3 (0.40 X 0.40) M, Cimiento Corrido CC-2 (0.40 X 0.20) M, Muro de Block 0.14 X 0.19 X 0.39, Solera de humedad (0.15 X 0.20) M, Solera de humedad (0.15 X 0.30) M, Columna C-2 (0.25 X 0.25), Columna C-3 (0.15 X 0.20) M, Solera Corona V-1 DE (0.20 M X 0.15 M) M, Muro Perimetral de Malla, comprobando que se realizaron ensayos de laboratorio, para el control de calidad de los materiales y de los trabajos.

Fecha de Inicio:13-04-2,021 Fecha de Finalización por ampliación de tiempo: 13-04-2,022

- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 61.00% CONTRATO No.: 035-2020**



Edwin
INGENIERO
COLLEGIADO
No. 10343



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) ACCESO 1 SOBRE 4A. CALLE ZONA 3, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.
- CONSTRUCTORA "MEGA-CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE"
- Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se ejecutan, es importante mencionar que se aprobó por concejo una orden modificatoria por lo que al realizar la visita de campo se comprobó la finalización de los renglones de trabajo en Trazo y Replanteo, Corte de Cajuela, conformación de Sub-rasante, preparación de la base (e=0.20), bordillos (0.10x0.40), cama de arena de asiento (e=0.03), Adoquinado, llaves de confinamiento y Loseta de remate, brocales nuevos más reacondicionamiento, señal vial horizontal, paso de cebra con pintura de tráfico, pintura para bordillo, señal de alto, señal de una vía comprobando que se realizaron ensayos de laboratorio, para el control de calidad de los materiales y de los trabajos.
- Fecha de Inicio: 19-08-2021 Fecha de Finalización: 19-12-2021.
- Fecha de Inicio: 19-08-2021 Fecha de Finalización: 19-12-2021

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 100.00% CONTRATO No.: 015-2021



Ing. José Carlos Barrios Sandoval
INGENIERO CIVIL
COLEGADO No. 10343

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.
- CONSTRUCTORA "CONSTRUCTORA JC 3"
- Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se ejecutan, por lo que al realizar la visita de campo se comprobó que están haciendo trabajos en los renglones de: Trabajos Preliminares, Estabilización de Suelo, Zapata continua tipo 1, Zapata continua tipo 2, Zapata continua tipo 3, Zapata continua tipo 4, Zapata continua tipo 5, Zapata continua tipo 6, Zapata continua tipo 7, Zapata continua tipo 8, Zapata continua tipo 9, Viga conectora tipo 1, Viga conectora tipo 2, Solera conectora S-C (0.25*0.40), Cimiento Corrido (0.20*0.40), Levantado sobre Cimiento, Columnas Tipo 1 (Sección = 0.60), Columnas Tipo 2 (0.50*0.50), Columnas Tipo 2 A (0.50*0.50), Columnas Tipo 3 (0.50*0.30), Columnas Tipo 4 (0.40*0.40), Columnas Tipo 5 (0.50*0.40), Columnas Tipo 6 (0.15*0.15), Columnas Tipo 7 (0.15*0.10), Columnas Tipo 8 (0.10*0.10), Columnas Tipo 9 (Sección = 0.05), Solera de Humedad (0.25*0.15) e Instalación de agua potable, comprobando que se realizaron ensayos de laboratorio, para el control de calidad de los materiales y de los trabajos.
- Fecha de Inicio: 16-09- 2,021 Fecha de Finalización: 16-10- 2,022

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 25.00% CONTRATO No.: 026-2021



Ing. Carlos Barrios Sandoval
INGENIERO CIVIL
C.O.C.A.M.C. No. 10343

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INGRESO PRINCIPAL ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LIBERTAD ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.
- CONSTRUCTORA "CONSTRUCTORA JC 3"
- Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se ejecutan, es importante mencionar que el proyecto tiene una orden de cambio por lo que al realizar la visita de campo se comprobó la finalización de los renglones de trabajo en Trazo y Replanteo, Desempedrado, Tubería de Pvc Ø 6", Pozo de vista h = 1.75, Pozo de vista h = 1.50, Cajas Muertas, Pozo de vista h = 1.65, Tubería de Pvc Ø 8", Excavación, Relleno + Compactación de Zanja, Pozo de vista h = 1.60, Levantar y Colocar Adoquín, Empedrado Lechado, el trabajo se encuentra terminado debido a que presenta inconsistencias en la terminación del empedrado se le solicita al contratista repararlas a la brevedad posible dándole un tiempo prudencial de 10 días por esa razón no se le da el avance físico al 100.00 % , se comprobó que se realizaron ensayos de laboratorio, para el control de calidad de los materiales y de los trabajos.
- Fecha de Inicio: 17-09- 2,021 Fecha de Finalización: 17-12- 2,021

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 97.00% CONTRATO No.: 019-2021




Ing. Carlos Sandoval
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 10343



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO IXHUAL ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.
- CONSTRUCTORA "INGENIERIA Y COSNTRUCTORA EMANUEL"
- Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se ejecutan, por lo que al realizar la visita de campo se comprobó la finalización de los renglones de trabajo en Trazo y Replanteo, Rotulo, Desempedrado, Excavación, Pozos de vista h = 1.65, Pozo de vista h = 1.75, Pozo de vista h = 1.80, Pozo de vista h = 1.85, Pozo de vista h = 2.15, Pozo de vista h = 2.50, Pozo de vista h = 2.95, Pozo de vista h = 2.65, Pozo de vista h = 3.20, Tubería de Pvc Ø 6", Tubería de Pvc Ø 8", Cajas Muertas, Relleno + Compactación de Zanja, Empedrado, Levantar y Fundir Concreto, Lechado se continúan los trabajando en los renglones de: Limpieza final, comprobando que se realizaron ensayos de laboratorio, para el control de calidad de los materiales y de los trabajos.
- Fecha de Inicio: 16-09- 2,021 Fecha de Finalización: 16-02- 2,022

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 98.00% CONTRATO No.: 020-2021

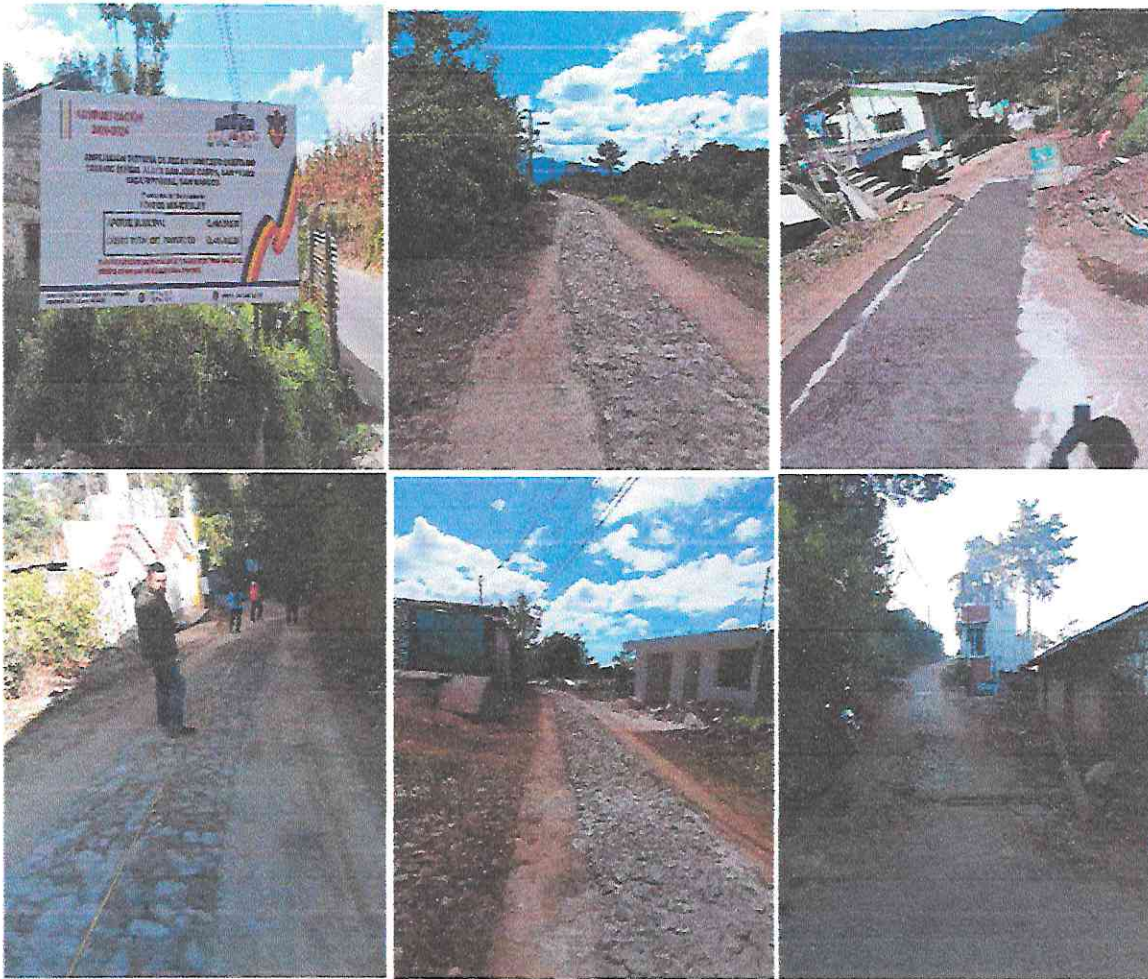

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL 10A AVENIDA ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.
- CONSTRUCTORA "CONSTRU-IR"
- Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se ejecutan, por lo que al realizar la visita de campo se comprobó la finalización de los renglones de trabajo en Pozos de vista, Instalación de Tubería para drenaje, Muro de Contención, Corte y nivelación de la Subrasante, Preparación de la Base Trazo y Replanteo, Corte y nivelación de la Subrasante, Preparación de la Base, se continúan los trabajando en los renglones de: Bordillo Prefabricado, Llaves de Confinamiento Transversales, Capa de Asiento de Adoquín, Adoquinado y Rejillas comprobando que se realizaron ensayos de laboratorio, para el control de calidad de los materiales y de los trabajos.
- Fecha de Inicio: 18-10- 2,021 Fecha de Finalización: 18-02- 2,022

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 81.00% CONTRATO No.: 030-2021



Eswin R. Barros Sandoval
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 10343

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ENTRADA 9A AVENIDA ZONA 4 SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.
- CONSTRUCTORA: "CONSTRUCTORA INNOVACIONES EN CONSTRUCCION"
- Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se ejecutan, por lo que al realizar la visita de campo se comprobó que están trabajando en los renglones de trazo y replanteo y el corte de cajuela, es importante mencionar que la comunidad está metiendo el drenaje por eso se ha atrasado el proyecto teniendo por ende el mismo avance
- Fecha de Inicio: 08-11- 2,021 Fecha de Finalización: 08-03- 2,022

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 5.00% CONTRATO No.: 035-2021



Edwin A. Carras Salvador
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 10343

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA RITA II, ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.
- **CONSTRUCTORA: " CODIPA "**
- Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se ejecutan, por lo que al realizar la visita de campo se comprobó la finalización de los renglones de trabajo en: Trazo y Replanteo, Excavación + Compactación, Zapata z-1 (1.20x1.20x0.20), Columna c-1 (0.30x0.30x1.80), Columna c-1 (0.30x0.30x1.80), Columnas Costanera doble de 2" x 6", Vigas, Costanera doble tipo c de 2" x 6", Construcción Techo de Estructura, Instalación Bajadas de Aguas Pluviales, Rotulo de Identificación del Proyecto, Limpieza Final
- Fecha de Inicio: 10-11- 2,021 Fecha de Finalización: 10-03- 2,022

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 100.00% CONTRATO No.: 027-2021



Ing. Carlos Roberto Sandoval
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 10343

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR NUEVA JERUSAEM ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.**

- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.
- **CONSTRUCTORA: " AMERICANA KRCC "**
- Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se ejecutan, por lo que al realizar la visita de campo se comprobó la finalización de los renglones de trabajo en: Trazo y Replanteo, Corte de Cajuela ($e=0.33$ m), Conformación de Sub Rasante, están trabajando en los renglones de: Preparación de la base ($e=0.20$ m) y Bordillos Laterales (0.10×0.40 m)
- Fecha de Inicio: 22-12- 2,021 Fecha de Finalización: 22-04- 2,022

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 23.00% CONTRATO No.: 054-2021



SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CANTON LOS LOPEZ ALDEA SANTA TEREZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.**

- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.
- CONSTRUCTORA Y COMERCIAL: "AG "
- Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se ejecutan, por lo que al realizar la visita de campo se comprobó el inicio de los renglones de trabajo en: Trabajos Preliminares, Trazo y Replanteo y la extracción del material sobrante, están trabajando en el armado de las columnas.

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 5.00% CONTRATO No.: 057-2021



Edwin José Carras Salvador
INGENIERO CIVIL
COLIGADO No. 10343

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO 5A. AVENIDA FINAL SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.
- **CONSTRUCTORA: "MEGA-CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE "**
- Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se ejecutan, por lo que al realizar la visita de campo se comprobó la finalización en los renglones de trabajo: rotulo de identificación de proyecto, se continúan los trabajos en: Trazo y Replanteo, Conformación de Sub-rasante, Conformación Base Granular, Carrileras de Concreto de 0.70 (T=0.18M), Bordillos Laterales de 0.10x0.35M,
- Fecha de Inicio: 26-11- 2,021 Fecha de Finalización: 26-03- 2,022

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 51.00% CONTRATO No.: 043-2021



Edwin A. Ch. Torres Sandoval
ING. EN INGENIERIA CIVIL
COLEGADO No. 10343
