


SUPERVISION DE OBRAS  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPECQUEZ  
ENERO 2021  
INGENIERO TRIN ORLANDO CERRADOS MORALES  
CARRERA NO. 3266

Ingeniero Trino Morales  
INGENIERO CIVIL  
CARRERA NO. 3266

## SUPERVISION DE OBRAS


- Proyecto: "CONSTRUCCION EDIFICIO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: "COINPRO"
- Durante este mes se realizaron trabajos de se terminaron las fundiciones y se iniciaron con trabajos de levantado de muros, y modulo de gradas.
- Fecha de inicio: 04-12-2019 Fecha de Finalización: 11-11 2020
- AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 76.00 % CONTRATO No. 083-2019



Ing. Carlos A. Morales  
INGENIERO CIVIL  
C.O.L. 1254

## SUPERVISION DE OBRAS


- Proyecto: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A. AVENIDA ZONA 4, ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: "AMERICANA K.R.C.C."
- Durante el mes de enero, se continuaron con trabajos de excavación colocación de tubería y fundición de pozos de visita, relleno, se trabaja en los documentos de cambio, y se aprobó ampliación de tiempo por dos meses.
- Fecha de inicio: 21 -10-2020 Fecha de Finalización: 21-02-2021
- AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 90 .00 % CONTRATO No. 009-2020



*Erwin Armando Morales*  
INGENIERO CIVIL  
C.C.L. 5764

## SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"
- El proyecto financiamiento CODEDE
- Constructora: "S.M.C. Servicios Múltiples en Construcción"
- Se han realizado fundición de losa, se tiene fraguando, el adoquin esta finalizado, así como accesorios, únicamente faltan acabados.
- Fecha de inicio: 28 -10-2020 Fecha de Finalización: 28-06-2021
- AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 97.00 % CONTRATO No. 012-2019



Ing. Gerardo Morales  
ING. CIVIL  
C. 2014

## SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE ALDEA EL CEDRO HACIA CANTON SAN RAFAEL, ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad,
- Constructora: "EL PROGRESO"
- Durante el mes se finalizaron los trabajos, por lo que se fue a medir y cuantificar, verificando que los trabajos se ejecutaron satisfactoriamente.
- Fecha de inicio: 19-10-2020 Fecha de Finalización: 19-01-2021
- AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00% CONTRATO No. 005-2020



## SUPERVISION DE OBRAS


- Proyecto: "SUBSIDIO AUIBES CASERIO BELLA VISTA, ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad,
- Constructora: "COINPRO"
- Durante el mes se finalizaron los trabajos, se le indico al contratista que aplicara pintura a las cajas, los trabajos se finalizaron satisfactoriamente.
- Fecha de inicio: 19-10-2020 Fecha de Finalizacion: 19-01-2021
- AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00%4 CONTRATO No. 007 2020



INGENIERO DE OBRAS  
INGENIERO  
COL. 100.00%4




## SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO (FASE II) CALLE PRINCIPAL CASERIO PACONCHE, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad,
- Constructora: "CONSTRUCTORAJ.L.C."
- Durante el mes se han realizado trabajos de colocación de empedrado, fundición de bordillo y se iniciaron los trabajos de fundición de cuneta.
- Fecha de inicio: 04-12-2020 Fecha de Finalización: 04-04-2021
- AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 60.00% CONTRATO No. 016-2020



Levis Guzmán Morúa  
INGENIERO CIVIL  
C.O.L. 3264

- Proyecto \*8 0 AMIENTO CALLE CON EMPEDRADO CALLE PRINCIPA1 CASERIO CRUZ DE PKEMA, AEDÉA SAN PEDRO PETZ MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, OgPARTAMEMTO DE SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad,
- Constructora: "INGENIERIA PARA PROYECTOS CIVILES"
- Ourante el mes se finalizaron los trabajos de fundicion de bordillo, se esta colocando empedrado y se han colocado las dos alcantarillas.
- Fecha de micro: 16 11 2020 Fecha de Finalizacion: 16-04-2021
- AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 6S.IXP 96 CONTRATO No. 010-2020



INGENIERIA PARA PROYECTOS CIVILES  
 COL. JUCA  
 7712





## SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CONADOQUIN 5A, CALLE TRAMO FINAL Y 3A, AVENIDA ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto CODEDE,
- Constructora: **"CONSTRU-IR"**
- Durante el presente mes se realizaron trabajos de corte y nivelación de la subrasante, colocación del material de base granular, y se inició la función de bordillo, se le pidió al contratista los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 15-12-2020 Fecha de Finalización: 13-04-2021
- AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 60.00% CONTRATO No. 023-2020



David Arredondo Morales  
INGENIERO CIVIL  
C.O.L. 3784



- o q "S GO AMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN CANTON CENTRO 1, ALDEA \$, CLJE4U 0010R65, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"
- Elpro /\*DA Mtinirikalirl.an
  - Constnx ioxa- t t RROEO NS BALCARCEL"
  - e LXxai tp pl orr5ritt ives sr realizaroti trabajos de corte y nivelaci6n de la subrasante, re a<-1n cfrimatt'rial rtp hase granular, y se inicio la fundicion de bordillo, y colocaci6n de adoqu6n. xr ie oido at contratista los estudios de laboratorio.
  - Fecha de inicio: 11-12-2020 Fecha de Finalizacion: 11-04-2021
  - AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 60.00% CONTRATO No. 022-2020

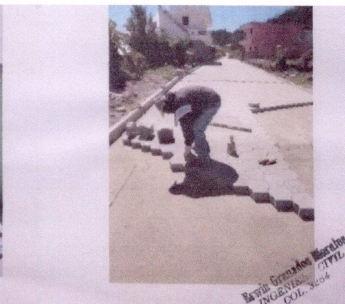

Estudio Gerardo Morales  
INGENIERO CIVIL  
C.O.C. No. 0204

## SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA EL CEDERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"
- El proyecto POA, Municipalidad.
- Constructora: "CONSTRUCTORA Y COMERCIAL SEDIPRO"
- Durante el presente mes se realizaron trabajos de fundicion de soleras, y levantado de muro, fundicion de columnas y fundicion de losa.
- Fecha de inicio: 07-12-2020 Fecha de Finalizacion: 07-03-2021
- AVANCE ACUMULADO ALA FECHA 60.00 % CONTRATO No. 020-2020



INGENIERIA CIVIL  
3394
