




DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS



A LAS: 9:45 FIRMA: 

SUPERVISION DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
NOVIEMBRE 2021
INGENIERO CIVIL GUSTAVO ADOLFO VELÁSQUEZ JUÁREZ
COLEGIADO No. 18,186



San Pedro Sacatepéquez, 06 de diciembre de 2021

Doctor:

Juan Eliézer González González

Alcalde Municipal.

Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

Departamento de San Marcos

Un gusto saludarlo, deseándole lo mejor al frente de tan digno cargo.

Adjunto en la presente encontrara el informe ejecutivo de los trabajos ejecutados durante el mes de noviembre del año 2021, supervisiones a los Proyectos en ejecución, una breve descripción y su Avance Físico, de los proyectos por cotización y licitación.

Sin otro particular.

Atentamente

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

Ing. Gustavo Adolfo Velásquez Juárez


Supervisor de Obras

Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN INICIO CALLE PRIMERO DE MAYO CASERIO CRUZ VERDE ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“JC 3”**
- Durante el mes se finalizaron los trabajos de bordillos de concreto, adoquín de tráfico pesado, llaves de confinamiento y viga de remate.
- Fecha de inicio: 06-09-2021 Fecha de Finalización: 06-12-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 97.60 % CONTRATO No. 013-2021**


Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No 18.186

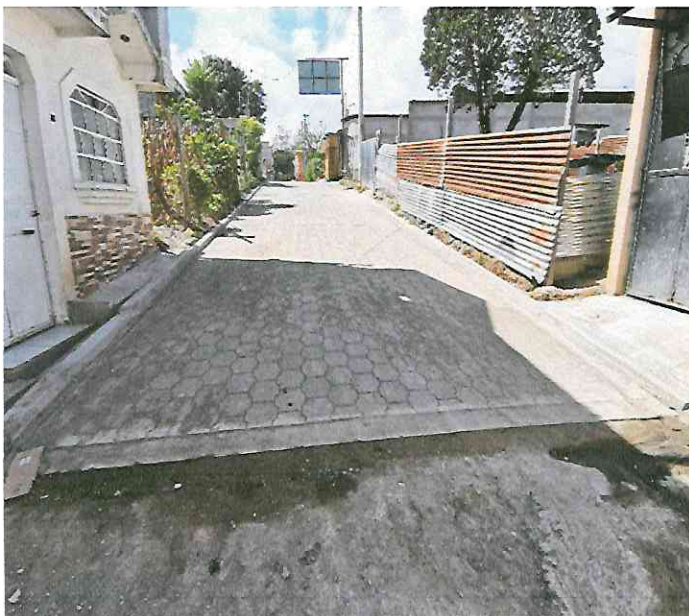

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN + MURO DE CONTENCIÓN 4A, AVENIDA A ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: “G & G”
- Durante el mes se continúa con los trabajos de muro de contención y se iniciaron los trabajos de trazo y replanteo para el corte de cajuela.
- Fecha de inicio: 01-10-2021 Fecha de Finalización: 01-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 47.00 % CONTRATO No. 017-2021**



Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

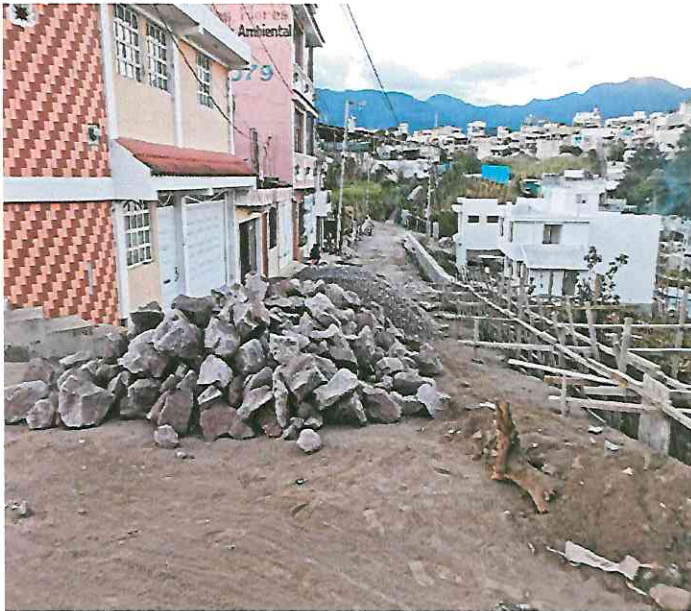

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA URBANA MIXTA CANTON EL MOSQUITO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CIFUENTES VELASQUEZ”**
- Durante el mes se trabajó con el armado de la viga V-1 y V-2, el encofrado de las vigas y con el entarimado para hacer el armado de la losa.
- Fecha de inicio: 12-04-2021 Fecha de Finalización: 13-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 48.00 % CONTRATO No. 037-2020**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

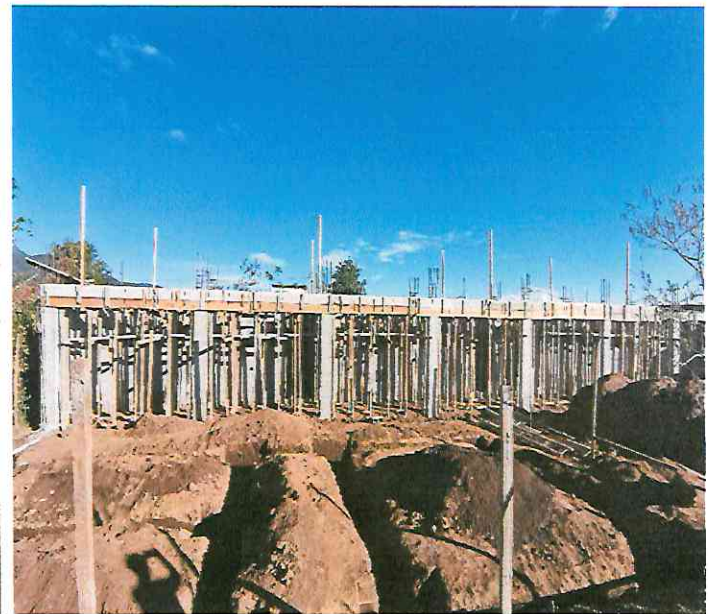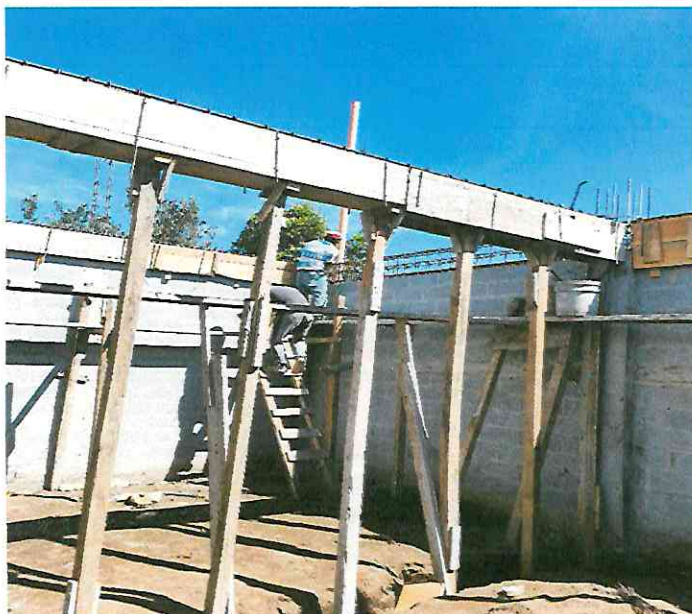

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS FUENTES CANTON LAS FLORES ALDEA CAHMPOLLAP, DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CONSTRUCCIONES PROGRESO”**
- Durante el mes se iniciaron los trabajos de trazo y replanteo, corte de cajuela, conformación de sub-rasante y preparación de la base.
- Fecha de inicio: 16-11-2021 Fecha de Finalización: 16-03-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 25.00 % CONTRATO No. 034-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: “MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION E IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALES DE TRAFICO EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: “GONZALEZ”
- Durante el mes se finalizaron los trabajos de instalación de semáforos con contador y las cámaras de control de tráfico, señalización y pasos de cebra.
- Fecha de inicio: 25-03-2021 Fecha de Finalización: 25-11-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % CONTRATO No. 034-2020**

Gustavo Adolfo Velásquez Juan...
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“DETALLES ARTE EN ARQUITECTURA”**
- Durante el mes se realizó el trazo y marcación, armado de columna tipo C-1, C-2, C-3, levantado de muros de block, solera intermedia y la fundición de cada estructura, se le solicitaron los estudios de laboratorio al contratista.
- Fecha de inicio: 04-10-2021 Fecha de Finalización: 04-03-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 18.00 %** **CONTRATO No. 016-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186





San Pedro Sacatepéquez, 04 de diciembre del 2,021.

SR:

Dr: Juan Eliezer González González
Alcalde Municipal
San Pedro Sacatepéquez.

Adjunto a la presente encontrara el informe ejecutivo del trabajo ejecutado durante el mes de noviembre, supervisiones a los proyectos en ejecución una breve descripción y su avance Físico del proyecto por Licitación y Cotización.


Sin otro particular

Atentamente:



Ing. Edwin René Barrios Sandoval
Supervisor de Obras
Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.

Edwin René Barrios Sandoval
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 10343

7 dic 2021
15:51


SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 4A. AVENIDA A ZONA 1 CANTON SAN AGUSTIN TONALA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.
 - El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.
 - CONSTRUCTORA GONZALEZ
 - Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se ejecutan, es importante mencionar que se aprobaron Documentos de Cambio por el Concejo Municipal según acta 094-2021, por lo que al realizar la visita de campo se comprobó la finalización de los renglones de trabajo en: Trazo y Replanteo, Rotulo de Identificación, Muro de Concreto Ciclópico, Solera Intermedia Block "U" 0.14 X 0.19 X 0.39, (módulo de baños), Losa de Concreto H=0.10 M, se continúan los trabajando en los renglones de: Reacondicionamiento de la Sub-Rasante (85.00 M * 45.00 M), Corte de Cajuela y terraplén (85.00 M * 45.00 M), Preparación de Base H=0.10 M, Relleno Controlado, Caja de Registro + Caja Unión, Drenaje Frances, tubo PVC 4" 80 Psi, Sub-Drenaje, Tubo PVC 6" 80 Psi, Zapata Z-2 (1.00 X 0.80) M, Zapata Z-3 (0.40 X 0.40) M, Cimiento Corrido CC-2 (0.40 X 0.20) M, Muro de Block 0.14 X 0.19 X 0.39, Solera de humedad (0.15 X 0.20) M, Solera de humedad (0.15 X 0.30) M, Columna C-2 (0.25 X 0.25), Columna C-3 (0.15 X 0.20) M, Solera Corona V-1 DE (0.20 M X 0.15 M) M, Muro Perimetral de Malla, comprobando que se realizaron ensayos de laboratorio, para el control de calidad de los materiales y de los trabajos.
- Fecha de Inicio: 13-04-2,021 Fecha de Finalización por ampliación de tiempo: 13-04-2,022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 60.00% CONTRATO No.: 035-2020**



Edwin René Pérez Sandoval
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 20343

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) ACCESO 1 SOBRE 4A. CALLE ZONA 3, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.
- CONSTRUCTORA "MEGA-CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE"
- Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se ejecutan, por lo que al realizar la visita de campo se comprobó la finalización de los renglones de trabajo en Trazo y Replanteo, Corte de Cajuela, conformación de Sub-rasante, preparación de la base (e=0.20), bordillos (0.10x0.40), cama de arena de asiento (e=0.03), se continúan los trabajando en los renglones de: Adoquinado, llaves de confinamiento y Loseta de remate comprobando que se realizaron ensayos de laboratorio, para el control de calidad de los materiales y de los trabajos.
- Fecha de Inicio: 19-08- 2,021 Fecha de Finalización: 19-12- 2,021

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 88.00% CONTRATO No.: 015-2021



Edwin Guzmán Paredes Sacatepéquez
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 10343

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.
- CONSTRUCTORA "CONSTRUCTORA JC 3"
- Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se ejecutan, por lo que al realizar la visita de campo se comprobó que están haciendo trabajos en los renglones de: Trabajos Preliminares, Estabilización de Suelo, Zapata continua tipo 1, Zapata continua tipo 2, Zapata continua tipo 3, Zapata continua tipo 4, Zapata continua tipo 5, Zapata continua tipo 6, Zapata continua tipo 7, Zapata continua tipo 8, Zapata continua tipo 9, Viga conectora tipo 1, Viga conectora tipo 2, Solera conectora S-C (0.25*0.40), Cimiento Corrido (0.20*0.40), Levantado sobre Cimiento, Columnas Tipo 1 (Sección = 0.60), Columnas Tipo 2 (0.50*0.50), Columnas Tipo 2 A (0.50*0.50), Columnas Tipo 3 (0.50*0.30), Columnas Tipo 4 (0.40*0.40), Columnas Tipo 5 (0.50*0.40), Columnas Tipo 6 (0.15*0.15), Columnas Tipo 7 (0.15*0.10), Columnas Tipo 8 (0.10*0.10), Columnas Tipo 9 (Sección = 0.05), Solera de Humedad (0.25*0.15) e Instalación de agua potable, comprobando que se realizaron ensayos de laboratorio, para el control de calidad de los materiales y de los trabajos.
- Fecha de Inicio: 16-09- 2,021 Fecha de Finalización: 16-10- 2,022

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 24.385625404% CONTRATO No.: 026-2021



Edwin Carlos Sandoval
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 10343

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INGRESO PRINCIPAL ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LIBERTAD ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.
- CONSTRUCTORA "CONSTRUCTORA JC 3"
- Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se ejecutan, por lo que al realizar la visita de campo se comprobó la finalización de los renglones de trabajo en Trazo y Replanteo, Desempedrado, Tubería de Pvc Ø 6", Pozo de vista h = 1.75, Pozo de vista h = 1.50, Cajas Muertas, Pozo de vista h = 1.65, Tubería de Pvc Ø 8", Excavación, se continúan los trabajando en los renglones de: Relleno + Compactación de Zanja, Pozo de vista h = 1.60, Levantar y Colocar Adoquín, Empedrado y Lechado, comprobando que se realizaron ensayos de laboratorio, para el control de calidad de los materiales y de los trabajos.
- Fecha de Inicio: 17-09-2021 Fecha de Finalización: 17-12-2021

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 95.00% CONTRATO No.: 019-2021




Edwin René Pineda Sandoval
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 10543

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO IXHUAL ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.
- CONSTRUCTORA "INGENIERIA Y COSNTRUCTORA EMANUEL"
- Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se ejecutan, por lo que al realizar la visita de campo se comprobó la finalización de los renglones de trabajo en Trazo y Replanteo, Rotulo, Desempedrado, Excavación, Pozos de vista h = 1.65, Pozo de vista h = 1.75, Pozo de vista h = 1.80, Pozo de vista h = 1.85, Pozo de vista h = 2.15, Pozo de vista h = 2.50, Pozo de vista h = 2.95, Pozo de vista h = 2.65, Pozo de vista h = 3.20, Tubería de Pvc Ø 6", Tubería de Pvc Ø 8", se continúan los trabajando en los renglones de: Relleno + Compactación de Zanja, Cajas Muertas, Empedrado, comprobando que se realizaron ensayos de laboratorio, para el control de calidad de los materiales y de los trabajos.
- Fecha de Inicio: 16-09- 2,021 Fecha de Finalización: 16-02- 2,022

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 85.00% CONTRATO No.: 020-2021

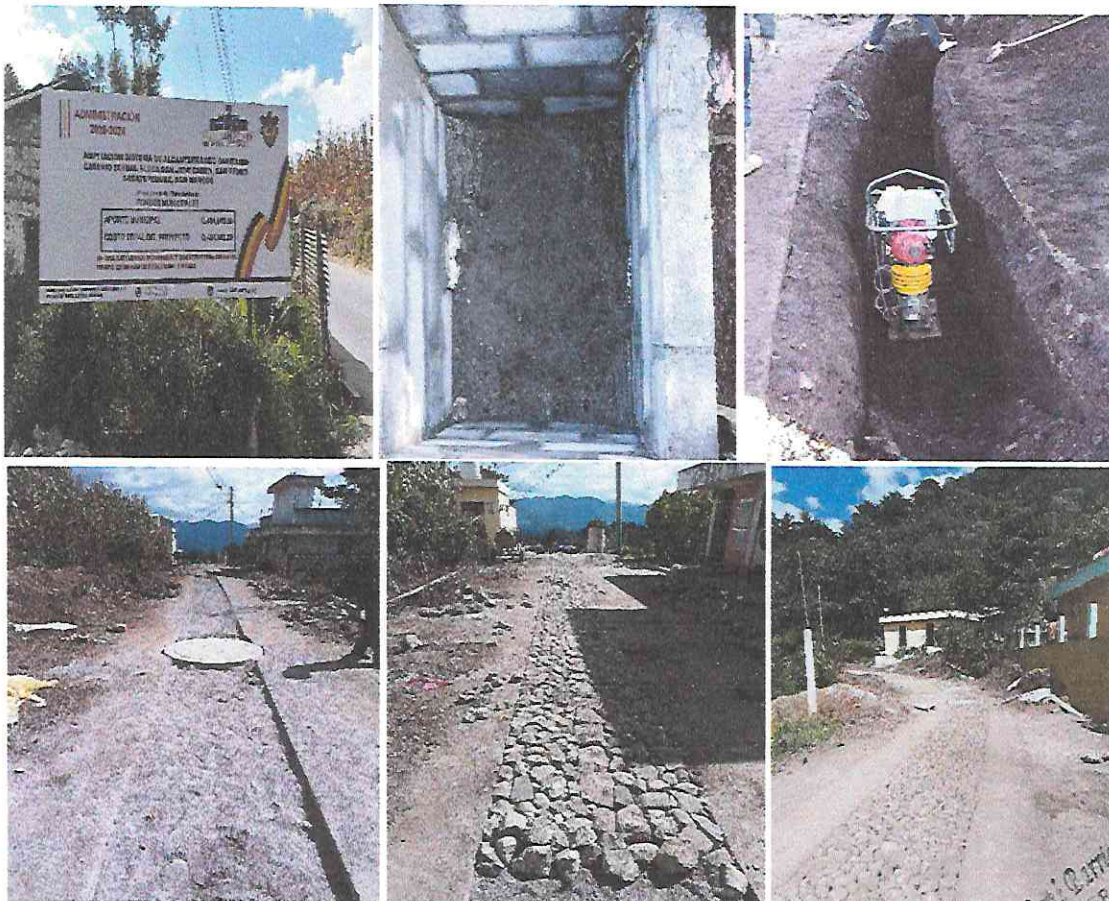


Edwin Quijón Carreros Sanfornal
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 10343

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL 10A AVENIDA ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCÓS.
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.
- CONSTRUCTORA "CONSTRU-IR"
- Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se ejecutan, por lo que al realizar la visita de campo se comprobó la finalización de los renglones de trabajo en Pozos de vista, Instalación de Tubería para drenaje, Muro de Contención, se continúan los trabajando en los renglones de: Trazo y Replanteo, Corte y nivelación de la Subrasante, Preparación de la Base, Bordillo Prefabricado, Llaves de Confinamiento Transversales, Capa de Asiento de Adoquín, Adoquinado y Rejillas comprobando que se realizaron ensayos de laboratorio, para el control de calidad de los materiales y de los trabajos.
- Fecha de Inicio: 18-10-2021 Fecha de Finalización: 18-02-2022

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 80.00% CONTRATO No.: 030-2021

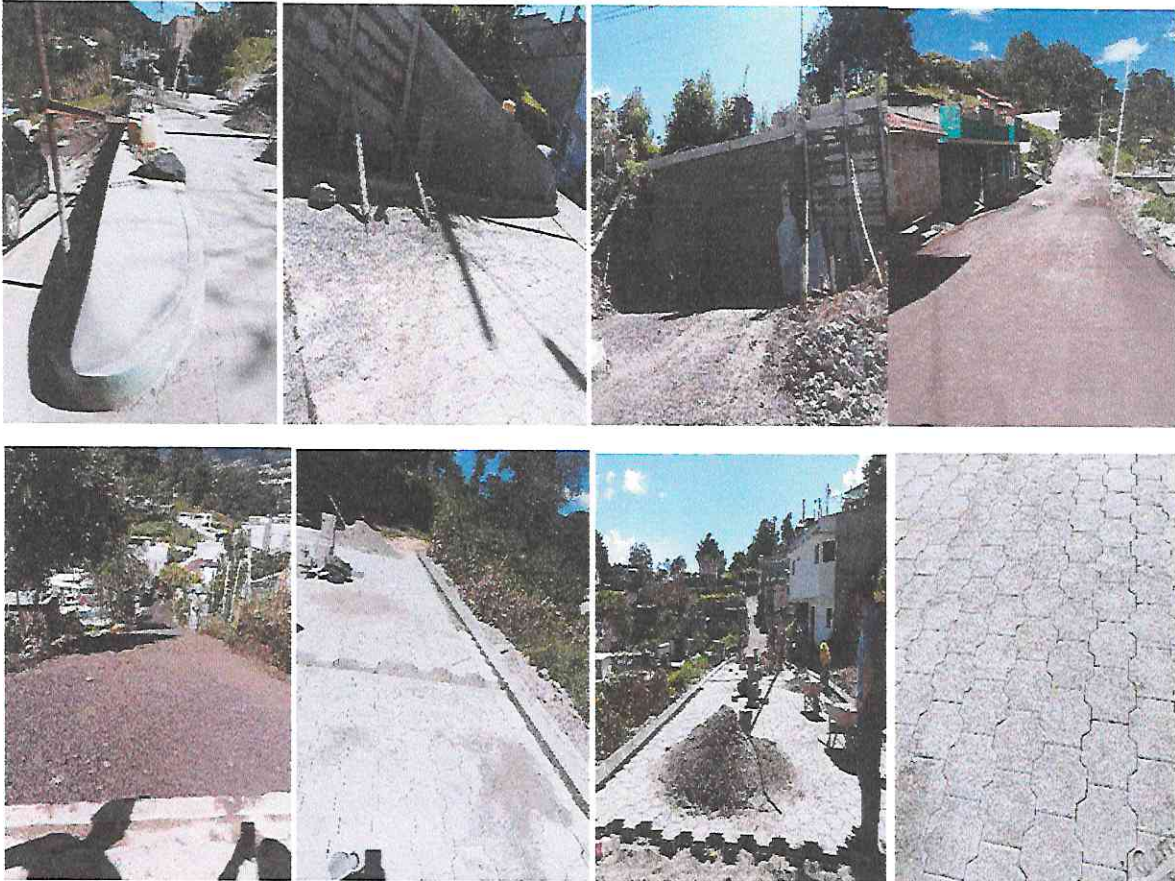

Clayton Acosta Torres San Marcos
INGENIERO CIVIL
COLIGIADO No. 10343

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ENTRADA 9A AVENIDA ZONA 4 SAN ISIDR CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.
- CONSTRUCTORA: "CONSTRUCTORA INNOVACIONES EN CONSTRUCCION"
- Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se ejecutan, por lo que al realizar la visita de campo se comprobó que están trabajando en los renglones de trazo y replanteo y el corte de cajuela, es importante mencionar que la comunidad está metiendo el drenaje por donde pasara el adoquín el cual ya tienen la zanja hecha y están colocando la tubería de PVC.
- Fecha de Inicio:08-11- 2,021 Fecha de Finalización: 08-03- 2,022

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 5.00% CONTRATO No.: 035-2021



Escuela Superior de Ingenieros San Carlos
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 10373



San Pedro Sacatepéquez, 7 de diciembre de 2021

Dr. Juan Eliezer González González
Alcalde Municipal
Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez
Departamento de San Marcos

Es un gusto saludarlo, deseándole lo mejor al frente de tan digno cargo.

Adjunto a la presente encontrará el informe ejecutivo de los trabajos supervisados durante el mes de noviembre de 2021 en los diferentes proyectos que me han sido asignados, en estos se incluyen: descripción y sus correspondientes avances físicos.


Sin otro particular.

Respetuosamente:

WILDER ALEXANDER
VELÁSQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888

Ing. Wilder Alexander Velásquez Miranda
Supervisor de Obras Municipales
Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS



A LAS: 5:05 FIRMA: _____



WILDER ALEXANDER
VELÁSQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,833

INGENIERO CIVIL

WILDER ALEXANDER VELÁSQUEZ MIRANDA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1E SOBRE 8A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **Construcciones Progreso**

En el mes de Noviembre se realizó visita de supervisión para verificar avance físico y calidad de obra del proyecto.

Fecha de inicio: 4/11/2021 **Tiempo de Ejecución:** 3 meses
AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 60.00% **CONTRATO No.** 028-2,021




WILDER ALEXANDER VELÁSQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,838

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 6 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **Ingeniería para proyectos Civiles**

En el mes de Noviembre se realizó visita de supervisión para verificar avance físico y calidad de obra del proyecto.

Fecha de inicio: 4/10/2021 **Tiempo de Ejecución:** 3 meses
AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 90.00% **CONTRATO No.** 014-2,021



(Handwritten signature)
WILDER ALEXANDER VELASQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO AGUA TIBIA AREA ECOLOGICA ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.**


El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **Constructora Earveco**

En el mes de Noviembre se realizó visita de supervisión para verificar avance físico y calidad de obra del proyecto.

Fecha de inicio:	4/10/2021	Tiempo de Ejecución:	5 meses
AVANCE ACUMULADO A LA FECHA:	55.00%	CONTRATO No.	011-2,021




WILDER ALEXANDER
VELASQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. AVENIDA A ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"COINPRO"**

En el mes de Noviembre se realizaron visitas de supervisión para verificar avance físico y calidad de obra del proyecto

Fecha de inicio: 15/07/2021

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 100.00% **CONTRATO No. 010-2,021**




WILDER ALEXANDER
VELASQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14.888

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **CONSTRUCCIÓN EDIFICIO EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.

Constructora: **"COINPRO"**

En el mes de Noviembre se realizaron visitas de supervisión conjuntamente con el Ingeniero superintendente para verificar avance físico y calidad de obra del proyecto:

Fecha de inicio: 4/12/2019

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 119.00% CONTRATO No. 083-2,019




WILDER ALEXANDER
VELÁSQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 6 SOBRE 2A. CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **Constructora y Comercial SEDIPRO**

En el mes de Noviembre se realizó visita de supervisión para verificar avance físico y calidad de obra del proyecto. En Fecha 13 de septiembre de 2021 se solicitó suspensión en la ejecución del proyecto y en Acta 166-2021 de fecha 3 de noviembre de 2021 del libro de Actas del Concejo Municipal se aprobó continuar con la ejecución. La ejecución atiende a lo descrito en especificaciones técnicas y a detalles en planos, los procesos de ejecución se han llevado a cabo conforme a buenas prácticas de construcción, igualmente se han empleado materiales de calidad adecuada que atienden a especificaciones técnicas. En fecha 18 de noviembre de 2021 se aprobó ampliación al monto del Contrato de Ejecución de Obra No. 01-2021 por 14.45%.

Fecha de inicio:	9/08/2021	Tiempo de Ejecución:	2 meses
AVANCE ACUMULADO A LA FECHA:	105.00%	CONTRATO No.	001-2,021



(Handwritten signature)
WILDER ALEXANDER VELÁSQUEZ MIRANDA
 INGENIERO CIVIL
 COLEGIADO 14.588

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE RAMON
GRAMAJO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Empresa Ejecutora: **CONSTRUCTORA "INGARQ", INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**


En el mes de Noviembre se realizaron visitas de supervisión para verificar avance físico y calidad de obra del proyecto


Tiempo de Ejecución: 6 Meses

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA

95.00%

CONTRATO No. 043-2,020

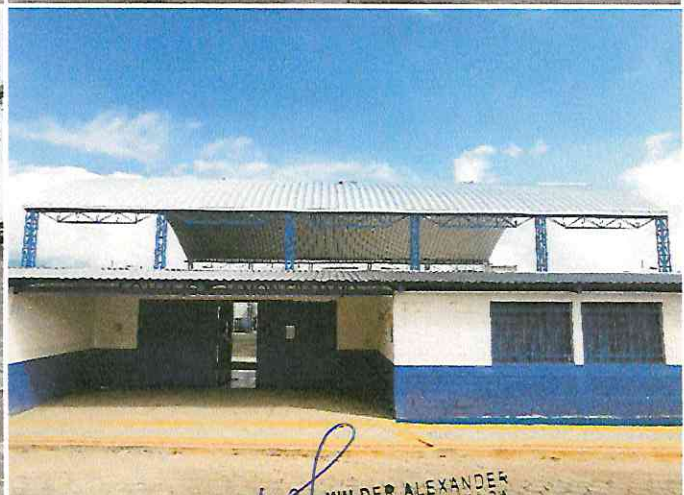


WILDER ALEXANDER
VELASQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,558

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) CASERIO AGUA TIBIA, ALDEA MAVIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"CONSTRUCTORA RD"**

Durante el mes de Noviembre se realizaron visitas de supervisión para verificar avance físico y calidad de obra del proyecto, la empresa realiza trabajos e intervención con la finalidad de conservar garantías. Los vecinos solicitaron la construcción de un muro de contención para evitar hundimientos en un espacio pequeño de calle, dicha obra no contratada fue ejecutada de manera conjunta entre vecinos y contratista.

Fecha de inicio: 18/02/2021 Tiempo de ejecución: 4 Meses

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 98.50% CONTRATO No. 038-2,020



(Handwritten signature)
WILDER ALEXANDER
VELASQUEZ MIRANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888

SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 1A. AVENIDA A ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"COINPRO"**

En el mes de Noviembre se realizaron visitas al proyecto, físicamente se concluyó, sin embargo al verificar ciertas fracturas en planchas de concreto, se determinó que la tubería de agua potable que alimenta el casco urbano del Municipio de San Pedro Sacatepéquez sufrió daños y provocó socavamientos bajo ciertas áreas del proyecto afectando la base y algunos espacios de las plachas de concreto. Se dieron instrucciones de atender prontamente y reparar dichos trabajos (aunque es un factor ajeno a la ejecución, afecta directamente), es de hacer notar y recordar que el proyecto estuvo suspendido por varios meses mientras se realizaban trabajos de instalación de las tuberías mencionadas.

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA:

92.00%

CONTRATO No. 006-2,020




WILDER ALEXANDER
VELASQUEZ MARANDA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 14,888
