



SUPERVISION DE OBRAS  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ  
MAYO 2021  
INGENIERO CIVIL GUSTAVO ADOLFO VELÁSQUEZ JUÁREZ  
COLEGIADO No. 18,186



San Pedro Sacatepéquez, 04 de junio de 2021

Doctor:  
Juan Eliézer González González  
Alcalde Municipal.  
Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez  
Departamento de San Marcos

Un gusto saludarlo, deseándole lo mejor al frente de tan digno cargo.

Adjunto en la presente encontrara el informe ejecutivo de los trabajos ejecutados durante el mes de mayo del año 2021, supervisiones a los Proyectos en ejecución, una breve descripción y su Avance Físico, de los proyectos por cotización y licitación.

Sin otro particular.

Atentamente

Ing. Gustavo Adolfo Velásquez Juárez

Supervisor de Obras

Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez  
INGENIERO CIVIL  
Colegiado No. 18,186



## SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) CALLE PRINCIPAL, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"DETALLES, ARTE EN ARQUITECTURA"**
- Durante este mes se finalizaron los trabajos de empedrado, lechado y limpieza del lugar.
- Fecha de inicio: 23-12-2020 Fecha de Finalización: 23-05-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % CONTRATO No. 019-2020**





### SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR 7 LOS CEREZALES Y CALLE MIRALVALLE, ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"PROSEINCA"**
- Durante el mes de mayo, se finalizó el empedrado del sector los cerezales, se continúa con los trabajos de fundición de carrileras y de bordillos, se iniciaron los trabajos de empedrado de la calle miralvalle.
- Fecha de inicio: 09-03-2021 Fecha de Finalización: 09-09-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 87.00 %      CONTRATO No. 028-2020**





## SUPERVISION DE OBRAS


- Proyecto: **“CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“S.M.C. Servicios Múltiples en Construcción”**
- Se continúa con el zanjeado para los muros de contención y el armado para fundir, también se continúa con el levantado de muro. Se le pidió al contratista los diseños de mezclas y pruebas de laboratorio.
- Fecha de inicio: 19-02-2021 Fecha de Finalización: 18-09-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 70.00 % CONTRATO No. 031-2020**





### SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "CONSTRUCCION POZO(S) PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: "S.M.C. Servicios Múltiples en Construcción"
- Durante el mes de mayo se realizó la instalación de la bomba sumergible con sus respectivos accesorios.
- Fecha de inicio: 19-02-2021 Fecha de Finalización: 19-08-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 85.00 %      CONTRATO No. 032-2020**

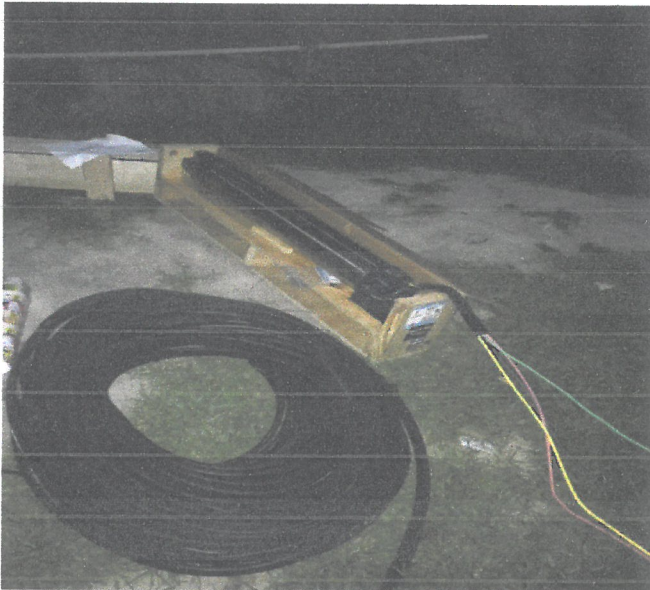



### SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE PRINCIPAL CASERIO ENTRE RIOS, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: “INGARQ”
- Durante el mes siguen los trabajos de adoquinado y fundición de llaves de confinamiento y de rejilla. Se le solicitaron al contratista los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 11-03-2021 Fecha de Finalización: 11-07-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 75.00 % CONTRATO No. 042-2020**





**SUPERVISION DE OBRAS**

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1A. SOBRE 2A. AVENIDA ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“G & G”**
- Durante el mes se realizó la limpieza general.
- Fecha de inicio: 05-03-2021 Fecha de Finalización: 05-06-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % CONTRATO No. 027-2020**





## SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: "FERRCONS BALCARCEL"
- Durante el mes de abril se trabaja en el levantado de muro del segundo nivel y en el encofrado de las vigas, se fundieron las soleras intermedias.
- Fecha de inicio: 01-02-2020 Fecha de Finalización: 01-07-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 60.00 % CONTRATO No. 036-2020**





## SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION E IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALES DE TRAFICO EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatépéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“GONZALEZ”**
- Durante el mes se instalaron las estructuras tipo bandera.
- Fecha de inicio: 25-03-2021 Fecha de Finalización: 25-07-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 7.00 %      CONTRATO No. 034-2020**





## SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL CALLE PRINCIPAL ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"EL PROGRESO"**
- Durante el mes se finalizaron los trabajos de adoquinado, llaves de confinamiento y muro de contención, se iniciaron con los trabajos de corte de bordillos.
- Fecha de inicio: 26-03-2021 Fecha de Finalización: 25-07-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 90.00 % CONTRATO No. 041-2020**





## SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) 3A. AVENIDA ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“JC 3”**
- Durante el mes se finalizaron los trabajos de adoquinado, llaves de confinamiento y loseta de remate.
- Fecha de inicio: 09-03-2021 Fecha de Finalización: 09-09-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 95.00 % CONTRATO No. 004-2021**





## SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) CANTON CAROLINA, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“OCCIDENTE”**
- Durante el mes se finalizaron los trabajos de llaves de confinamiento, llaves de remate, adoquinado y limpieza final.
- Fecha de inicio: 09-02-2021 Fecha de Finalización: 09-06-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % CONTRATO No. 008-2021**





## SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL (MODULOS 2 Y 3) MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“ARCHILA”**
- Durante el mes se realizaron los trabajos de fundición de viga de amarre 1, solera intermedia, se trabaja con el levantado de muros, se le solicitaron al contratista el diseño de mezclas y los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 01-03-2021 Fecha de Finalización: 01-11-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 10.23 % CONTRATO No. 040-2020**





## SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) AVENIDA NUEVA PRIMAVERA ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"JC 3"**
- Durante el mes se realizaron los trabajos de encofrado y fundición de bordillos, se iniciaron los trabajos de adoquinado, se le solicitaron al contratista el diseño de mezclas y los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 08-03-2021 Fecha de Finalización: 08-07-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 65.00 % CONTRATO No. 003-2021**







San Pedro Sacatepéquez, 7 de junio de 2021

Doctor:

Juan Eliezer González González

Alcalde Municipal.

Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

Departamento de San Marcos

Un gusto saludarlo, deseándole lo mejor al frente de tan digno cargo.

Adjunto en la presente encontrará el informe ejecutivo de los trabajos ejecutados durante el mes de mayo del año 2021, supervisiones a los Proyectos en ejecución, una breve descripción y su Avance Físico, de los proyectos por cotización y licitación; así como proyectos supervisados con miembros del Concejo Municipal

Sin otro particular.

Atentamente

WILDER ALEXANDER  
VELÁSQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14,888


Ing. Wilder Alexander Velásquez Miranda  
Supervisor de Obras  
Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez





**SUPERVISION DE OBRAS  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDROS SACATEPÉQUEZ  
ABRIL DE 2021**

**INGENIERO CIVIL WILDER ALEXANDER VELÁSQUEZ MIRANDA  
COLEGIADO NO. 14,888**



**WILDER ALEXANDER  
VELÁSQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14,888**



**SUPERVISION DE OBRAS**

Proyecto: **AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A. AVENIDA ZONA 4, ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**


El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"CONSTRUCTORA AMERICANA, KRCC"**

Durante el mes de mayo se ha ejecutado el **98.98%** de los renglones contratados después de realizar inspección final en visita conjunta con el superintendente del proyecto y miembros del Cocode, se determinó que debían realizarse correcciones mínimas en algunos renglones ejecutados.

Fecha de inicio: **21/10/2020**

**AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 98.98% CONTRATO No. 009-2,020**

**WILDER ALEXANDER VELASQUEZ MORALES**  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14.858



## SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **S.M.C. SERVICIOS MÚLTIPLES EN CONSTRUCCIÓN**

Durante el mes de mayo se ha ejecutado el 99.00% de los renglones contratados, quedan pendientes por realizar inspección final a los renglones de Adoquinado de ingreso y trabajos finales.

Fecha de inicio: 28/10/2020

Fecha de finalización: 25/06/2021

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 99.00%

CONTRATO No. 012-2020



WILDER ALEXANDER  
VELASQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14,888





**SUPERVISION DE OBRAS**

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA SAN PEDRO PETZ MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **INGENIERIA PARA PROYECTOS CIVILES**

Se realizaron las visitas al proyecto, verificando que se han ejecutado las cantidades contratadas.

Fecha de inicio: 16/11/2020 Fecha de finalización: 15/04/2021

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00% CONTRATO No. 010-2,020



WILDER ALEXANDER  
VELASQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14,888



### **SUPERVISION DE OBRAS**

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 1A. AVENIDA A ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"COINPRO"**


Hasta el mes de mayo se han ejecutado los renglones de Demolición y Traslado de Planchas, Replanteo, Corte de Cajuela y Conformación de Sub-Rasante.

**AVANCE ACUMULADO A LA FECHA**

**10.00%**

**CONTRATO No. 006-2,020**



  
WILDER ALEXANDER  
VELASQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14.888



### **SUPERVISION DE OBRAS**

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO (FASE II) CALLE PRINCIPAL CASERIO PACONCHE, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"CONSTRUCTORA J.L.C."**

Se realizaron las visitas al proyecto verificando la ejecución de los renglones de trabajo contratados, logrando un avance físico final de 99.96%.

Fecha de inicio: 4/12/2020


Fecha de finalización: 3/04/2021

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA

99.96%

CONTRATO No. 016-2,020



  
WILDER ALEXANDER  
VELASQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14,888



**SUPERVISION DE OBRAS**

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 5A. CALLE TRAMO FINAL Y 3A. AVENIDA ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"CONSTRU-IR"**

En visitas de verificación de renglones ejecutados del proyecto se determinó que el mismo ha sido concluido, lográndose un avance físico final de 98.34%.

**AVANCE ACUMULADO A LA FECHA**

**98.34%**

**CONTRATO No. 023-2,020**



*(Signature)*  
WILBER ALEXANDER  
VELASQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14,888



### SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) CASERIO EL BOQUERON ALDEA SACUCHUM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"CONSTRUCTORA CIFUENTES VELASQUEZ"**

El proyecto ha sido concluido alcanzándose un avance físico final de 96.57%


Fecha de inicio: 8/12/2020

Fecha de finalización: 8/03/2021

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 96.57%

CONTRATO No. 022-2,020



  
WILDER ALEXANDER  
VELASQUEZ MIRAN  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO N.º 14 3



## SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN CANTON CENTRO 1, ALDEA SACUCHUM DOLORES SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"FERRCONS BALCARCEL"**


Durante el mes de mayo se realizaron visitas para verificar el avance físico del proyecto evidenciando un avance de 98.97%

**AVANCE ACUMULADO A LA FECHA**

**98.97%**

**CONTRATO No. 022-2,020**



  
WILDER ALEXANDER  
VELASQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14,888



### **SUPERVISION DE OBRAS**

Proyecto: **CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA CANTEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"CONSTRUCTORA SIGLO 21"**

Durante el mes de mayo se realizaron visitas para verificar el avance físico del proyecto evidenciando un avance 85.60%


Fecha de inicio: 25/01/2021

Fecha de finalización: 24/06/2021

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 85.60%

CONTRATO No. 030-2,020



  
WILDER ALEXANDER  
VELASQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14.538



### **SUPERVISION DE OBRAS**

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO (FASE II) 2A. AVENIDA ZONA 2, ALDEA SAN JOSE CABEN SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.


Constructora: **"DETALLES, ARTE EN ARQUITECTURA"**


Durante el mes de mayo se realizaron visitas para verificar el avance físico del proyecto evidenciando un avance de 80.00%

**AVANCE ACUMULADO A LA FECHA**

**80.00%**

**CONTRATO No. 039-2,020**

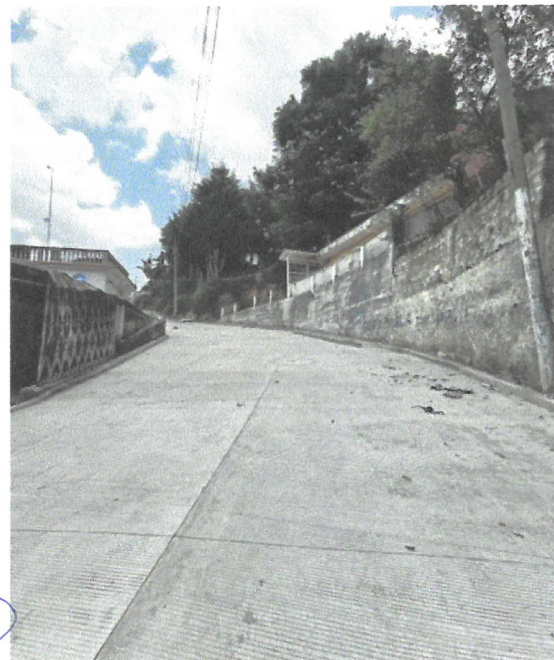

  
WILDER ALEXANDER  
VELÁSQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14.888



**SUPERVISION DE OBRAS**

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL)  
CASERIO AGUA TIBIA, ALDEA MAVIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"CONSTRUCTORA RD"**

Durante el mes de mayo se realizaron visitas para verificar el avance físico del proyecto evidenciando un avance 37.50%


Fecha de inicio: 18/02/2021

Fecha de finalización: 18/06/2021

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 37.5%

CONTRATO No. 038-2,020



  
WILDER ALEXANDER  
VELASQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14.888







### **SUPERVISION DE OBRAS**

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) ZONA 4, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"DETALLES, ARTE EN ARQUITECTURA"**

Durante el mes de mayo se realizaron visitas para verificar el avance físico del proyecto evidenciando un avance de **97.00%** de los renglones contratados.

**AVANCE ACUMULADO A LA FECHA**

**97.00%**

**CONTRATO No. 022-2,020**



WILDER ALEXANDER  
VELASQUEZ MIRANCA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14,888



## **SUPERVISION DE OBRAS**

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) 1A.  
CALLE ZONA 3, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.


Constructora: **"C Y R INGENIERÍA"**

Durante el mes de mayo se realizaron visitas para verificar el avance físico del proyecto evidenciando un avance 90.00% de los renglones contratados.

**AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 90.00%**

**CONTRATO No. 006-2,021**



  
ALEXANDER ESCOBEDO MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14,888



**SUPERVISION DE OBRAS**

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO DE CALLE OSCAR BARRIOS HACIA ESC PRIMARIA Z. 4 SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.


Constructora: **"CONSTRUCTORA JC 3"**

Durante el mes de mayo se realizaron visitas para verificar el avance físico del proyecto evidenciando un avance **77.84%** de los renglones contratados.

Fecha de inicio: **5/03/2021** Fecha de finalización: **1/09/2021**

**AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 77.84% CONTRATO No. 007-2,021**



  
WILDER ALEXANDER  
VELASQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14.888



### **SUPERVISION DE OBRAS**

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 4 ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **Construcciones Progreso**


Durante el mes de mayo se realizaron visitas para verificar el avance físico del proyecto evidenciando un avance de 36.46% de los renglones contratados.

**AVANCE ACUMULADO A LA FECHA**

**36.46%**

**CONTRATO No. 005-2,021**



  
WILDER ALEXANDER  
DE LASQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14,888



## **SUPERVISION DE OBRAS**

Proyecto: **CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERÍO ALTA VISTA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**


El proyeccto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.


Constructora: **"S.M.C. SERVICIOS MÚLTIPLES EN CONSTRUCCIÓN"**

Durante el mes de mayo se realizaron visitas para verificar el avance físico del proyecto evidenciando un avance de 99.00% de los renglones contratados.

**Fecha de inicio:** 28/10/2020 **Fecha de finalización:** 24/08/2021

**AVANCE ACUMULADO A LA FECHA** 99.00% **CONTRATO No.** 013-2,020

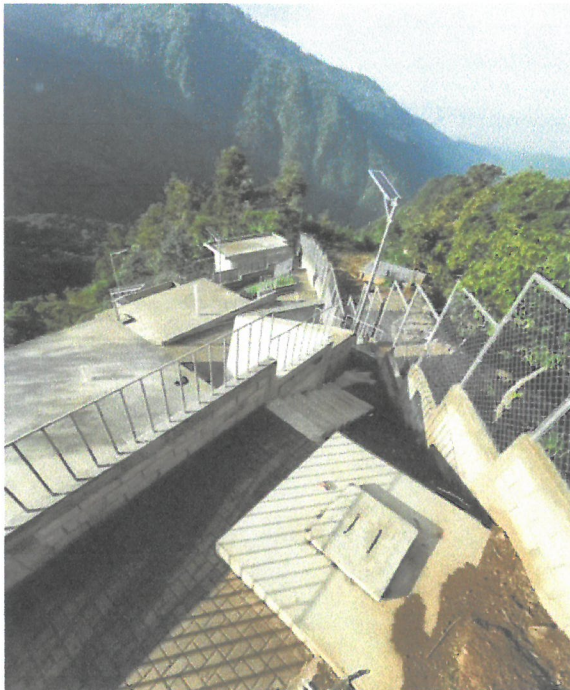

  
WILDER ALEXANDER  
VELASQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14.588
