



San Pedro Sacatepéquez, 8 de noviembre de 2021

Dr. Juan Eliezer González González  
Alcalde Municipal  
Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez  
Departamento de San Marcos

Es un gusto saludarlo, deseándole lo mejor al frente de tan digno cargo.

Adjunto a la presente encontrará el informe ejecutivo de los trabajos supervisados durante el mes de octubre de 2021 en los diferentes proyectos que me han sido asignados, en estos se incluyen: descripción y sus correspondientes avances físicos.


Sin otro particular.

Respetuosamente:

WILDER ALEXANDER  
VELÁSQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14.538

Ing. Wilder Alexander Velásquez Miranda  
Supervisor de Obras Municipales  
Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

8 Nov 2021  
16:49 pm

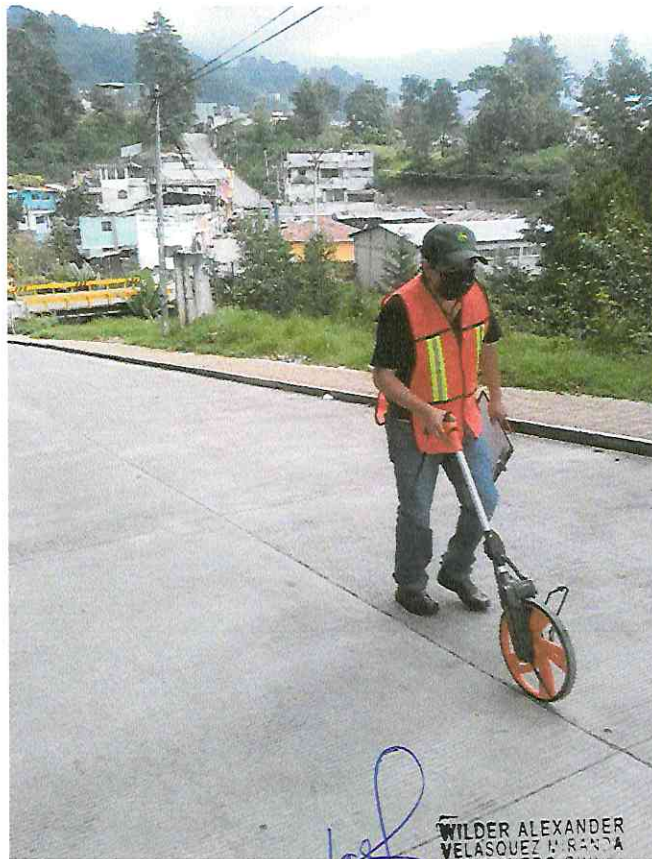

WILDER ALEXANDER  
VELÁSQUEZ M. MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14.498

INGENIERO CIVIL  
WILDER ALEXANDER VELÁSQUEZ MIRANDA  
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

### SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 1A. AVENIDA A ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"COINPRO"**

En el mes de octubre se realizaron visitas al proyecto, aunque físicamente se encuentra concluido, al verificar, se determinó que en algunos espacios deben realizarse correcciones, es de hacer notar que la tubería de agua potable que alimenta el casco urbano del Municipio de San Pedro Sacatepéquez sufrió daños y ha provocado socavamientos afectando la base y algunas placas de concreto, se dieron instrucciones de atender prontamente y reparar dichos trabajos y de esta manera recibir el proyecto a entera satisfacción, es de recordar que el proyecto estuvo suspendido por varios meses mientras se realizaban trabajos de instalación de las tuberías mencionadas.

**AVANCE ACUMULADO A LA FECHA:**

**92.00%**

**CONTRATO No. 006-2,020**



  
**WILDER ALEXANDER  
VELÁSQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14.832**

**SUPERVISION DE OBRAS**

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) CASERIO AGUA TIBIA, ALDEA MAVIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"CONSTRUCTORA RD"**

Durante el mes de octubre se realizaron visitas de supervisión para verificar avance físico y calidad de obra del proyecto, la empresa realiza trabajos e intervención con la finalidad de conservar garantías. Los vecinos solicitaron la construcción de un muro de contención para evitar hundimientos en un espacio pequeño de calle, dicha obra no contratada fue ejecutada de manera conjunta entre vecinos y contratista.

Fecha de inicio: 18/02/2021      Tiempo de ejecución: 4 Meses

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 98.00%      CONTRATO No. 038-2,020



*(Handwritten signature)*  
**ALEXANDER VASQUEZ MIRANDA**  
 INGENIERO CIVIL  
 COLEGIADO 14,888

## SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE RAMON  
GRAMAJO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Empresa Ejecutora: **CONSTRUCTORA "INGARQ", INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**

En el mes de octubre se realizaron visitas de supervisión para verificar avance físico y calidad de obra del proyecto

Tiempo de Ejecución: 4 Meses

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA

45.00%

CONTRATO No. 043-2,020



  
WILDER ALEXANDER  
VELASQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14,888

### SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 6 SOBRE 2A. CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **Constructora y Comercial SEDIPRO**

En el mes de octubre se realizó visita de supervisión para verificar avance físico y calidad de obra del proyecto. Se tuvo suspensión en la ejecución a solicitud de los vecinos y con aprobación del Concejo Municipal, esto con la finalidad de instalar tuberías para abastecimiento de agua y colector de drenaje en el tramo.

**Fecha de inicio:** 9/08/2021 **Tiempo de Ejecución:** 2 meses

**AVANCE ACUMULADO A LA FECHA:** 85.00% **CONTRATO No.** 001-2,021



*[Handwritten Signature]*  
VICENTE ALEJANDRO  
VILLARREAL MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14,888

### **SUPERVISION DE OBRAS**

Proyecto: **CONSTRUCCIÓN EDIFICIO EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO  
SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.


Constructora: **"COINPRO"**

En el mes de octubre se realizaron visitas de supervisión conjuntamente con el Ingeniero superintendente para verificar avance físico y calidad de obra del proyecto:

Fecha de inicio: 4/12/2019

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 118.50%      CONTRATO No. 083-2,019



  
WILDER ALEXANDER  
VELASQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14,888

## SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 6 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.


Constructora: **Ingeniería para proyectos Civiles**

En el mes de octubre se realizó visita de supervisión para verificar avance físico y calidad de obra del proyecto, a la fecha se trabaja en renglón de: PREPARACIÓN DE LA BASE ( material granular t= 0.20 mts.)

**Fecha de inicio:** 4/10/2021 **Tiempo de Ejecución:** 3 meses

**AVANCE ACUMULADO A LA FECHA:** 15.00% **CONTRATO No.** 014-2,021



  
WILBER ALEXANDER  
VELASQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14,888



## SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO AGUA TIBIA AREA ECOLOGICA ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **Constructora Earveco**

En el mes de octubre se realizó visita de supervisión para verificar avance físico y calidad de obra del proyecto.

**Fecha de inicio:** 4/10/2021 **Tiempo de Ejecución:** 5 meses

**AVANCE ACUMULADO A LA FECHA:** 20.00% **CONTRATO No.** 011-2,021



  
WILDER ALEXANDER  
VELASQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14,883



**SUPERVISION DE OBRAS**

Proyecto: **MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. AVENIDA A ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**

El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Constructora: **"COINPRO"**

En el mes de septiembre se realizaron visitas de supervisión para verificar avance físico y calidad de obra del proyecto

Fecha de inicio: 15/07/2021

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 98.00% **CONTRATO No. 010-2,021**



  
WILDER ALEXANDER  
VELASQUEZ MIRANDA  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 14,888



SUPERVISION DE OBRAS  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ  
OCTUBRE 2021

INGENIERO CIVIL GUSTAVO ADOLFO VELÁSQUEZ JUÁREZ  
COLEGIADO No. 18,186

8 nov. 2021

16.22 pm



San Pedro Sacatepéquez, 08 de noviembre de 2021

Doctor:

Juan Eliézer González González

Alcalde Municipal.

Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

Departamento de San Marcos

Un gusto saludarlo, deseándole lo mejor al frente de tan digno cargo.

Adjunto en la presente encontrara el informe ejecutivo de los trabajos ejecutados durante el mes de octubre del año 2021, supervisiones a los Proyectos en ejecución, una breve descripción y su Avance Físico, de los proyectos por cotización y licitación.

Sin otro particular.

Atentamente

*Gustavo Adolfo Velásquez Juárez*  
INGENIERO CIVIL  
Colegiado No. 18,186

Ing. Gustavo Adolfo Velásquez Juárez

Supervisor de Obras

Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

### SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN INICIO CALLE PRIMERO DE MAYO CASERIO CRUZ VERDE ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“JC 3”**
- Durante el mes se trabajó con los bordillos de concreto, la cama de arena de asiento para la instalación del adoquín de tráfico pesado, llaves de confinamiento y viga de remate.
- Fecha de inicio: 06-09-2021 Fecha de Finalización: 06-12-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 85.00 %      CONTRATO No. 013-2021**

*Gustavo Adolfo Velásquez Juárez*  
**INGENIERO CIVIL**  
Colegiado No. 186



### SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN + MURO DE CONTENCIÓN 4A, AVENIDA A ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: “G & G”
- Se iniciaron los trabajos de trazo y replanteo y los trabajos de muro de contención.
- Fecha de inicio: 01-10-2021 Fecha de Finalización: 01-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 15.25 % CONTRATO No. 017-2021**

*Gustavo Adolfo Velásquez Juárez,*  
INGENIERO CIVIL  
Colegiado No. 18,186



### SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA URBANA MIXTA CANTON EL MOSQUITO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CIFUENTES VELASQUEZ"**
- Durante el mes se trabajó con el levantado de muro, con el armado y fundición de la solera intermedia y el armado de la viga V-1 y V-2.
- Fecha de inicio: 12-04-2021 Fecha de Finalización: 13-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 37.00 % CONTRATO No. 037-2020**

*Gustavo Adolfo Velásquez Juárez*  
INGENIERO CIVIL  
Colegiado No. 18,186



**SUPERVISION DE OBRAS**

- Proyecto: **“CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“FERRCONS BALCARCEL”**
- Durante el mes se finalizaron los trabajos del techo de estructura, pintura y limpieza final.
- Fecha de inicio: 01-02-2020 Fecha de Finalización: 30-09-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 %      CONTRATO No. 036-2020**

*Gustavo Adolfo Velásquez Juárez*  
INGENIERO CIVIL  
Colegiado No. 18 188





### SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION E IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALES DE TRAFICO EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“GONZALEZ”**
- Durante el mes se trabajó en la instalación de juego de 3 luces para semáforos con contador y las cámaras de control de tráfico.
- Fecha de inicio: 25-03-2021 Fecha de Finalización: 25-11-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 72.00 %      CONTRATO No. 034-2020**

*Gustavo Adolfo Velásquez Juárez*  
INGENIERO CIVIL  
Colegiado No. 18,186



### SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CIFUENTES VELASQUEZ”**
- Durante el mes se trabajó en la fundición, en el desencofrado y el relleno del muro tipo 1, se solicitaron los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 12-04-2021 Fecha de Finalización: 12-01-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 20.20 % CONTRATO No. 033-2020**

*Gustavo Adolfo Velásquez Juárez*  
INGENIERO CIVIL  
Colegiado No. 18,186



### SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL (MODULOS 2 Y 3) MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“ARCHILA”**
- Durante el mes se realizaron los trabajos de levantado de muros de block, solera intermedia, solera sillar, columna tipo C-1, columna tipo C-2 y viga tipo V-1.
- Fecha de inicio: 01-03-2021 Fecha de Finalización: 01-12-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 20.35 %      CONTRATO No. 040-2020**

*Gustavo Adolfo Velásquez Juárez*  
INGENIERO CIVIL  
Colegiado No. 18,186



### SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE PRINCIPAL SECTOR BAÑOS CANTON BUENA VISTA ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“G & G”**
- Durante el mes se realizaron los trabajos de trazo y replanteo, corte de cajuela, conformación de sub-rasante y preparación de la base.
- Fecha de inicio: 22-09-2021 Fecha de Finalización: 22-01-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 26.00 % CONTRATO No. 021-2021**

*Gustavo Adolfo Velásquez Juárez:*  
INGENIERO CIVIL  
Colegiado No. 18.186





San Pedro Sacatepéquez, 05 de Noviembre del 2,021.

SR:

Dr. Juan Eliezer González González  
Alcalde Municipal  
San Pedro Sacatepéquez.

Adjunto a la presente encontrara el informe ejecutivo del trabajo ejecutado durante el mes de octubre, supervisión al proyecto en ejecución una breve descripción y su avance Físico del proyecto por Licitación y Cotización.

Sin otro particular

Atentamente:

Ing. Edwin René Barrios Sandoval  
Supervisor de Obras  
Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.

*Edwin René Barrios Sandoval*  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO No. 10343

05 nov. 2021  
12:58 pm

## SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 4A. AVENIDA A ZONA 1 CANTON SAN AGUSTIN TONALA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.
- CONSTRUCTORA GONZALEZ
- Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se ejecutan, es importante mencionar que se aprobaron Documentos de Cambio por el Concejo Municipal según acta 094-2021, por lo que al realizar la visita de campo se comprobó la finalización de los renglones de trabajo en: Trazo y Replanteo, Rotulo de Identificación, Muro de Concreto Ciclópeo, Corte de Cajuela y terraplén (85.00 M \* 45.00 M), Solera Intermedia Block "U" 0.14 X 0.19 X 0.39, (módulo de baños), Zapata Z-1 (1.00 X 1.00) M, Zapata Z-3 (0.40 X 0.40) M, Cimiento Corrido CC-2 (0.40 X 0.20) M, Losa de Concreto H=0.10 M, Reacondicionamiento de la Sub-Rasante (85.00 M \* 45.00 M), Muro de Block 0.14 X 0.19 X 0.39, Sub-Drenaje, Tubo PVC 6" 80 Psi y el Drenaje Frances, tubo PVC 4" 80 Psi, se continúan los trabajando en los renglones de: Sub-Drenaje, Tubo PVC 8" 80 Psi, Cimiento Corrido CC-2 (0.40 X 0.20) M, Caja de Registro + Caja Unión, comprobando que se realizaron ensayos de laboratorio, para el control de calidad de los materiales y de los trabajos.

Fecha de Inicio:13-04-2,021 Fecha de Finalización por ampliación de tiempo: 13-04-2,022

- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 49.00% CONTRATO No.: 035-2020**



Edwin René Barrios Sandoval  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO No. 10343

## SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) ACCESO 1 SOBRE 4A. CALLE ZONA 3, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.
- CONSTRUCTORA "MEGA-CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE"
- Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se ejecutan, por lo que al realizar la visita de campo se comprobó la finalización de los renglones de trabajo en Trazo y Replanteo, Corte de Cajuela, conformación de Sub-rasante, preparación de la base ( $e=0.20$ ), bordillos ( $0.10 \times 0.40$ ) se continúan los trabajando en los renglones de: cama de arena de asiento ( $e=0.03$ ), Adoquinado, llaves de confinamiento y Loseta de remate comprobando que se realizaron ensayos de laboratorio, para el control de calidad de los materiales y de los trabajos.
- Fecha de Inicio: 19-08- 2,021 Fecha de Finalización: 19-12- 2,021

**AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 87.00% CONTRATO No.: 015-2021**



*Edwin René Serrano Sandoval*  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO No. 10343

## SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.
- CONSTRUCTORA "CONSTRUCTORA JC 3"
- Durante este mes se verificó en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se ejecutan, por lo que al realizar la visita de campo se comprobó que están haciendo trabajos en los renglones de: Trabajos Preliminares, Estabilización de Suelo, Zapata continua tipo 2, Zapata continua tipo 3, Zapata continua tipo 5, Zapata continua tipo 6, Zapata continua tipo 7, Columnas Tipo 2 (0.50\*0.50), Viga conectora tipo 1, comprobando que se realizaron ensayos de laboratorio, para el control de calidad de los materiales y de los trabajos.
- Fecha de Inicio: 16-09-2021 Fecha de Finalización: 16-10-2022

**AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 20.00% CONTRATO No.: 026-2021**



Edwin René Sánchez  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO No. 10343



## SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INGRESO PRINCIPAL ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LIBERTAD ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.
- CONSTRUCTORA "CONSTRUCTORA JC 3"
- Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se ejecutan, por lo que al realizar la visita de campo se comprobó la finalización de los renglones de trabajo en Trazo y Replanteo, Desempedrado, Tubería de Pvc Ø 6", Pozo de vista h = 1.75, Pozo de vista h = 1.50, Pozo de vista h = 1.60, Cajas Muertas, Excavación se continúan los trabajando en los renglones de: Pozo de vista h = 1.65, Tubería de Pvc Ø 8", Relleno + Compactación de Zanja, Levantar y Colocar Adoquín y Empedrado, comprobando que se realizaron ensayos de laboratorio, para el control de calidad de los materiales y de los trabajos.
- Fecha de Inicio: 17-09-2021 Fecha de Finalización: 17-12-2021

**AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 90.00% CONTRATO No.: 019-2021**




*Edwin René Barrón Sandoval*  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO No. 10343

## SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO IXHUAL ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.
- CONSTRUCTORA "INGENIERIA Y COSNTRUCTORA EMANUEL"
- Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se ejecutan, por lo que al realizar la visita de campo se comprobó la finalización de los renglones de trabajo en Trazo y Replanteo, Rotulo, Desempedrado, Excavación, Pozos de vista h = 1.65, Pozo de vista h = 1.75, Pozo de vista h = 1.80, Pozo de vista h = 1.85, Pozo de vista h = 2.15, Pozo de vista h = 2.50, Pozo de vista h = 2.95, Tubería de Pvc Ø 8", se continúan los trabajando en los renglones de: Pozo de vista h = 2.65, Pozo de vista h = 3.20, Tubería de Pvc Ø 6", Relleno + Compactación de Zanja, Cajas Muertas, comprobando que se realizaron ensayos de laboratorio, para el control de calidad de los materiales y de los trabajos.
- Fecha de Inicio: 16-09- 2,021 Fecha de Finalización: 16-02- 2,022

**AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 73.00% CONTRATO No.: 020-2021**

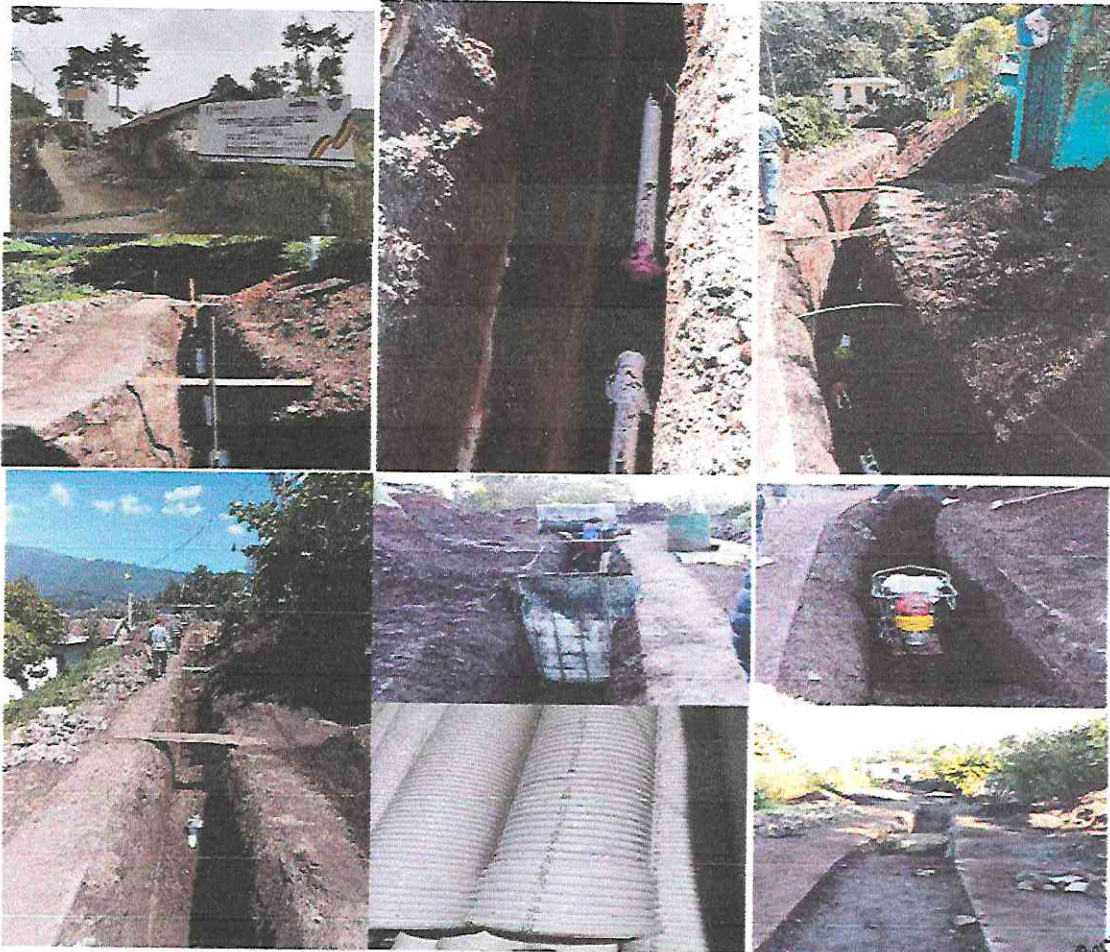


*Eduvin Rene Barrios Sandoval*  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO No. 10543

## SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL 10A AVENIDA ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.
- CONSTRUCTORA "CONSTRU-IR"
- Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se ejecutan, por lo que al realizar la visita de campo se comprobó la finalización de los renglones de trabajo en Trazo y Replanteo, Corte y nivelación de la Subrasante, Pozos de vista, Instalación de Tubería para drenaje, se continúan los trabajos en los renglones de: preparación de la base y Muro de Contención comprobando que se realizaron ensayos de laboratorio, para el control de calidad de los materiales y de los trabajos.
- Fecha de Inicio: 18-10- 2,021    Fecha de Finalización: 18-02- 2,022

**AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 35.00% CONTRATO No.: 030-2021**

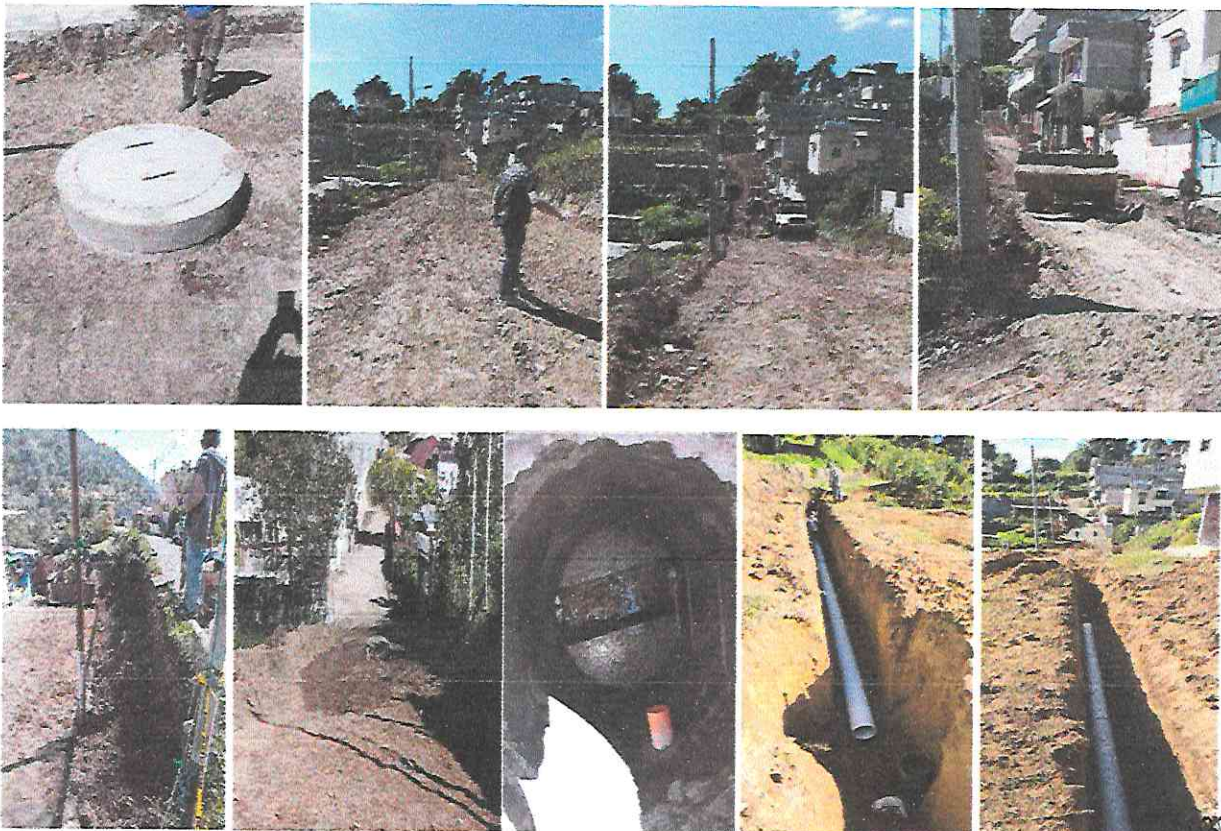


*Edwin René Barrios Samalot*  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO No. 10343

## SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) CANTON CAROLINA, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.
- CONSTRUCTORA: "CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE"
- Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se ejecutan, por lo que al realizar la visita de campo se comprobó la finalización de los de los renglones de trabajo en Trazo y Replanteo, Desempedrado Corte de Cajuela, conformación de Sub-rasante, preparación de la base (e=0.20), bordillos (0.10x0.40 m), cama de arena de asiento (e=0.03), Adoquinado, llaves de confinamiento y Loseta de remate, comprobando que se realizaron ensayos de laboratorio, para el control de calidad de los materiales y de los trabajos.
- Fecha de Inicio: 15-07- 2,021 Fecha de Finalización: 15-11- 2,021

**AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 100.00% CONTRATO No.: 008-2021**

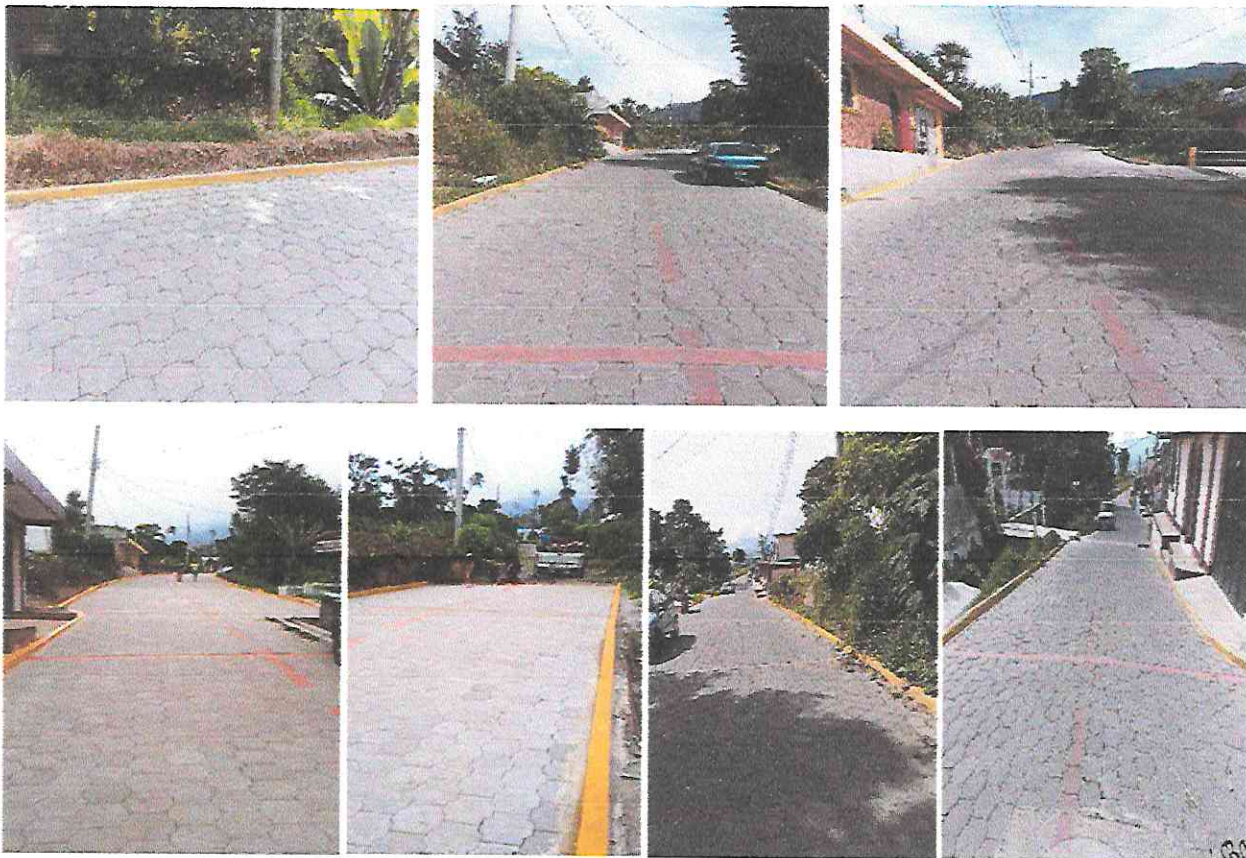

*Elwin René Barrios Sandoval*  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO No. 10548
