



DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

RECIBIDO
05 ENE 2023

A LAS: 16:47 FIRMA: 

SUPERVISION DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
DICIEMBRE 2022
INGENIERO CIVIL GUSTAVO ADOLFO VELÁSQUEZ JUÁREZ
COLEGIADO No. 18,186



San Pedro Sacatepéquez, 05 de enero de 2023

Doctor:

Juan Eliézer González González

Alcalde Municipal

Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez


Departamento de San Marcos

Un gusto saludarlo, deseándole lo mejor al frente de tan digno cargo.

Adjunto en la presente encontrara el informe ejecutivo de los trabajos ejecutados durante el mes de diciembre del año 2022, supervisiones a los Proyectos en ejecución, una breve descripción y su Avance Físico, de los proyectos por cotización y licitación.

Sin otro particular


Atentamente


Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186
Ing. Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
Supervisor de Obras
Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"S.M.C. SERVICIOS MULTIPLES EN CONTRUCCION"**
- Durante el mes se continúa trabajando el renglón de reactores anaerobios de flujo ascendente, filtros percoladores y digestor de lodos. Se solicitaron los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 11-08-2022 Fecha de Finalización: 11-04-2023
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 65.00 % CONTRATO No. 015-2022**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

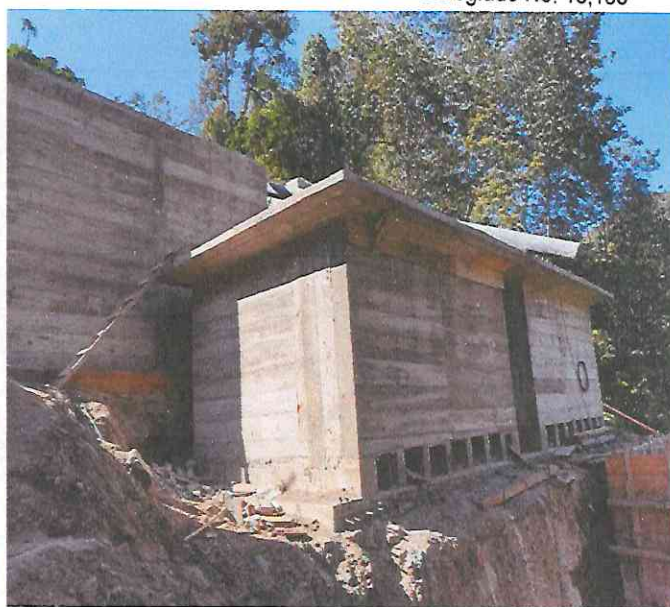

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CIFUENTES VELASQUEZ”**
- Durante el mes se continúa con el armado y la fundición de las cortinas de cámaras de sedimentación y su fundición, también se trabaja con la caseta de control y la cama de contacto. Se solicitaron los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 12-04-2021 Fecha de Finalización: 04-10-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 80.00 % CONTRATO No. 033-2020**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186


PROYECTO SUSPENDIDO



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"C Y R INGENIERIA"**
- Durante el mes se finaliza el trabajo de repello + cernido en losa, vigas, solera y columnas, también se trabaja con el contrapiso y módulo de baños.
- Fecha de inicio: 26-11-2021 Fecha de Finalización: 20-05-2023
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 74.50 % CONTRATO No. 045-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

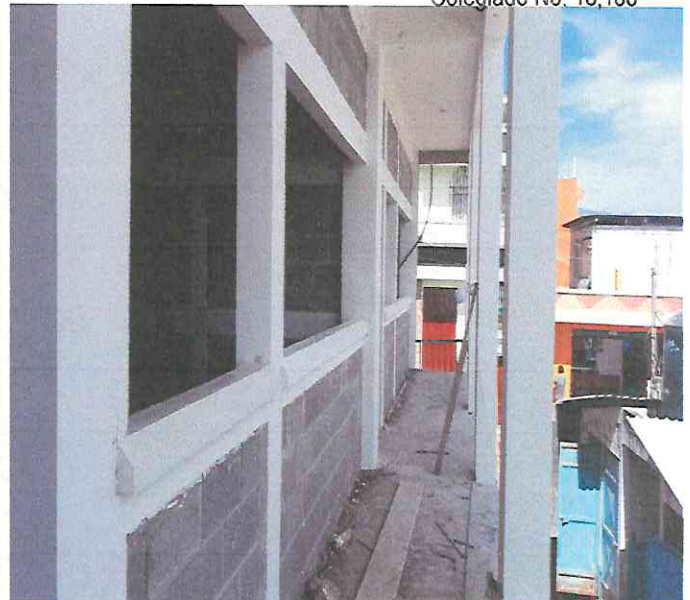

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN DEL CENTRO HACIA CANTON ENTRE RIOS ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCTORA J.L.C."**
- Durante el mes se realizaron los renglones de bordillos laterales, capa de arena de asiento, adoquinado, llaves de confinamiento, llaves de remate y reacondicionamiento de brocales pozo de visita. Se solicitaron los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 20-09-2022 Fecha de Finalización: 20-03-2023
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 70.00 % CONTRATO No. 029-2022**


Gustavo Adolfo Velásquez Juare.
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18.186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CANTON SAN FRANCISCO ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CONSTRUCCIONES PROGRESO”**
- Durante el mes se trabajó en preparación de la base, bordillos laterales, cama de arena de asiento, adoquinado tráfico pesado, llaves de confinamiento y drenaje francés. Se solicitaron los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 12-10-2022 Fecha de Finalización: 12-02-2023
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 70.00 %** **CONTRATO No. 027-2022**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

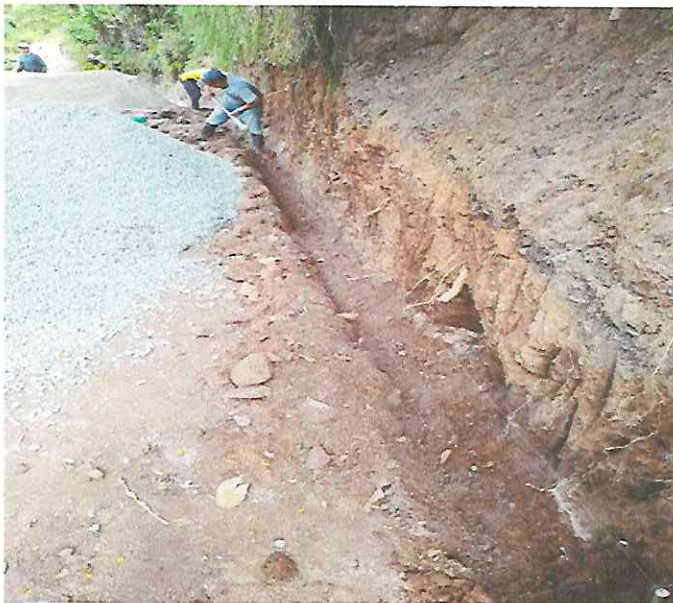

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO CANTON LA INDUSTRIA ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CONSTRUCTORA GONZALEZ”**
- Durante el mes se continúa trabajando la conformación de sub-rasante, corte de cajuela, preparación de la base, fundición de bordillos y función de carrileras de concreto. Se solicitaron los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 27-10-2022 Fecha de Finalización: 27-04-2023
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 40.00 %** **CONTRATO No. 036-2022**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No 18.186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO DEL CAMPO DE FUTBOL AL CENTRO DE ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CONSTRUCTORA MICHEL”**
- Durante el mes se continúa trabajando el corte de cajuela, preparación de la base, fundición de bordillos, función de carrileras de concreto y drenaje francés. Se solicitaron los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 12-10-2022 Fecha de Finalización: 12-04-2023
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 60.00 %** **CONTRATO No. 028-2022**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO VILLA NUEVA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCTORA MICHEL"**
- Durante el mes se trabajaron los renglones de corte de cajuela, conformación de sub-rasante, base material granular, carrileras de concreto, cuneta revestida, bordillos laterales, empedrado y lechado. Se solicitaron los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 24-10-2022 Fecha de Finalización: 24-03-2023
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 90.00 % CONTRATO No. 035-2022**


Gustavo Adolfo Velásquez Juan
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN CANTON BUENA VISTA ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CONSTRUCCIONES PROGRESO”**
- Durante el mes se trabajó en el trazo y replanteo, corte de cajuela, conformación de subrasante y preparación de la base. Se solicitaron los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 29-11-2022 Fecha de Finalización: 29-03-2023
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 21.00 % CONTRATO No. 043-2022**


Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

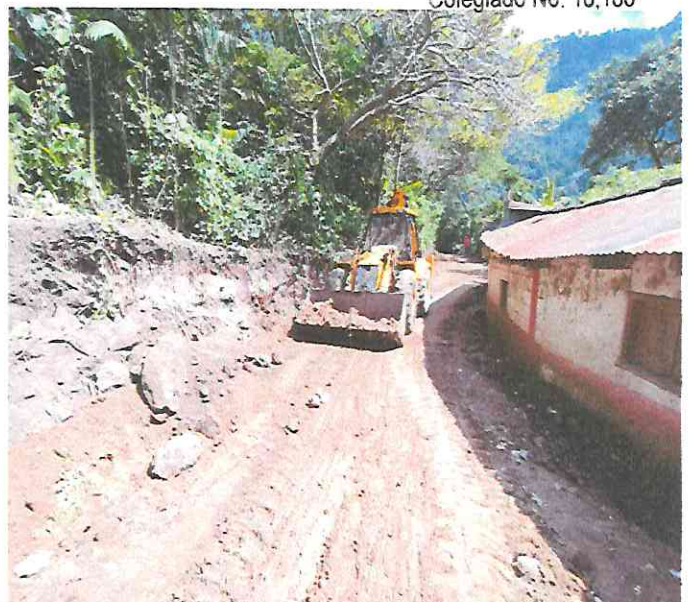

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO INICIAL CALLEJON 13 SOBRE 3A AVENIDA ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCTORA GONZALEZ"**
- Durante el mes se trabajó en el trazo y replanteo, corte de cajuela, conformación de subrasante y preparación de la base. Se solicitaron los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 21-11-2022 Fecha de Finalización: 21-03-2023
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 38.00 % CONTRATO No. 044-2022**


Gustavo Adolfo Velásquez Juaré
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

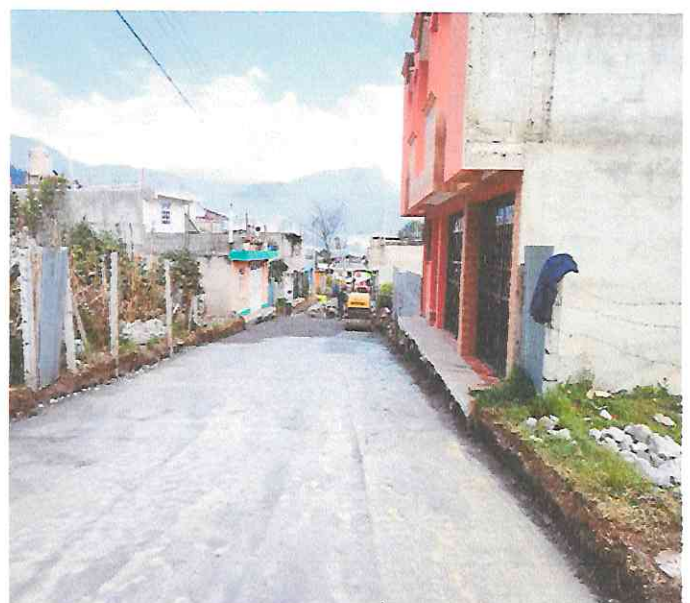

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL TRAMO FINAL DE 1A. CALLE A ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: "CONSTRUCTORA COINPRO"
- Durante el mes se trabajó los renglones de trabajos preliminares, remoción de adoquín existente, conformación de sub-rasante, demolición de banqueta existente y canal pluvial.
- Fecha de inicio: 09-11-2022 Fecha de Finalización: 09-04-2023
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 8.00 %** **CONTRATO No. 041-2022**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No 18.106

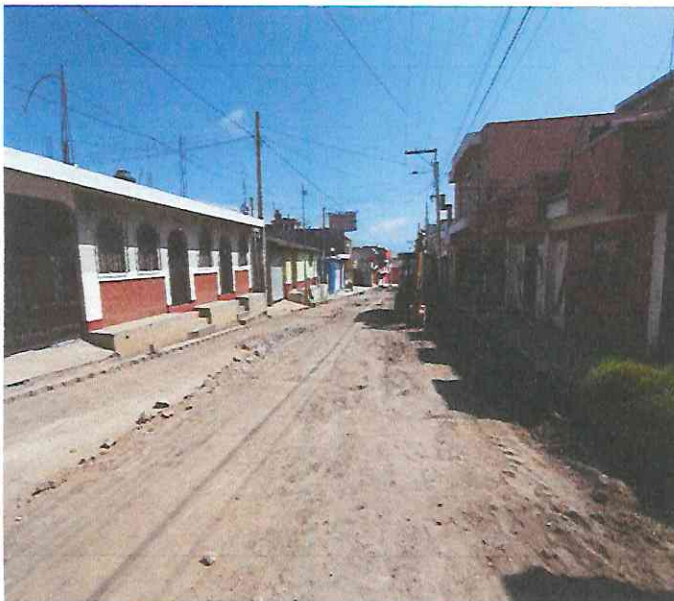

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR LOS EUCALIPTOS CANTON SAN RAFAEL ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"IC&C INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION"**
- Durante el mes se continúa trabajando la conformación de sub-rasante, corte de cajuela, preparación de la base y se van a iniciar los trabajos de bordillos laterales.
- Fecha de inicio: 19-10-2022 Fecha de Finalización: 19-04-2023
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 21.00 %** **CONTRATO No. 032-2022**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

