





DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS



A LAS: 16:09 FIRMA: 

**SUPERVISION DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
ABRIL 2022**

UNIDAD DE INFORMACIÓN MUNICIPAL **UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ**

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SAC., S. M.

COLEGIADO No. 2,605



UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605


SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto **CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI)**
CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS



- Constructora: **CONSTRUCTORA JC 3**
- Se realizaron varias supervisiones durante el mes de abril, en las fechas 06,12,19 , en los cuales se verifico armado de vigas V-1 y V-2 en losa del nivel 2, levantado de muros en Nivel2, armado de cimiento en muros de nivel 1, Fundición de losa en modulo de baños lado norte de la construcción, fundición de losa del Nivel 2, supervisión de ductos y mangas para instalaciones, desmontaje de formateja,
- Fecha de inicio: 16-09-2021 Fecha de Finalización: 16-10-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 42.00% CONTRATO No. 026-2021**

UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605

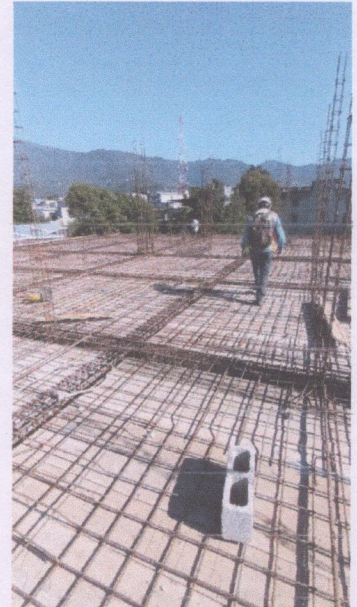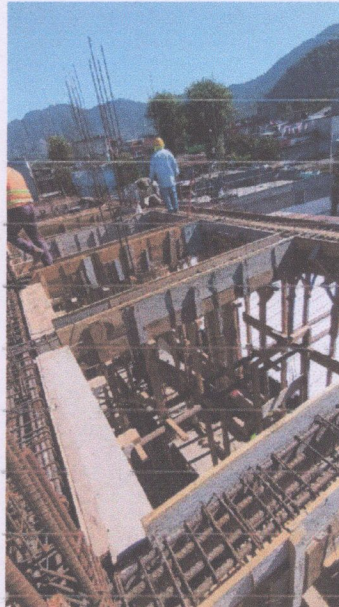

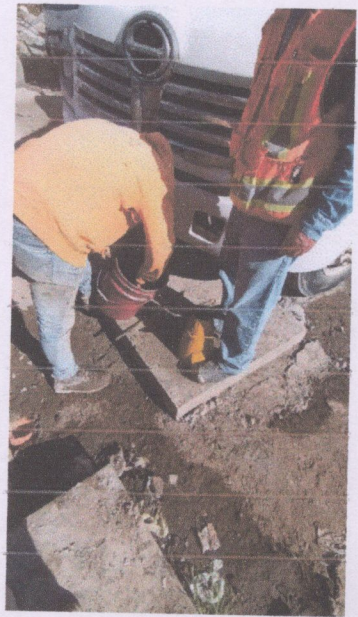

LUWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605


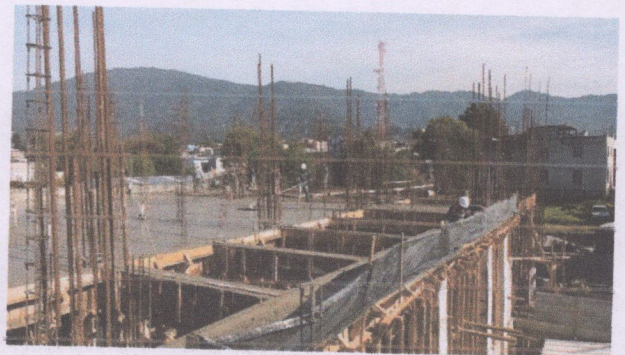
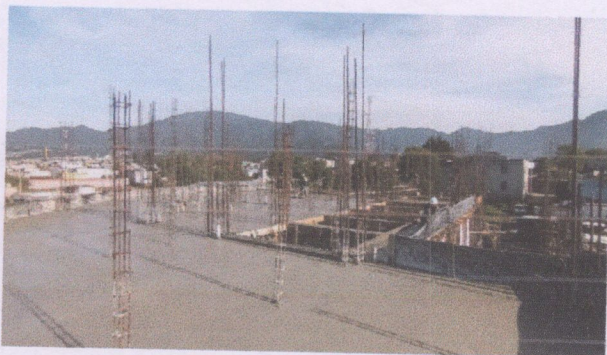


Proyecto:

**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 4A. AVENIDA A ZONA 1
CANTON SAN AGUSTIN TONALA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**

- Constructora: CONSTRUCTORA GONZALEZ
- En supervisión realizada en fecha 05 de abril se verifico la construcción de bancas en vestidores, instalación de pisos, construcción de mijitorio, acabados externos, colocación de malla en áreas perimetrales, y zanjeo en muro de parqueo **(El proyecto actualmente se encuentra suspendido)**
- Fecha de inicio: 13/04/2021 Fecha de Finalización: 13/10/2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA 60.00% CONTRATO No. 035-2,020**

LWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605




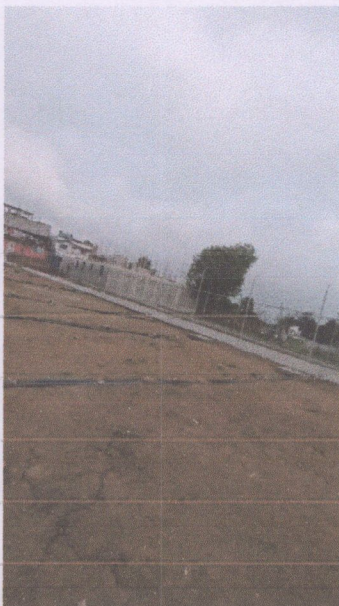
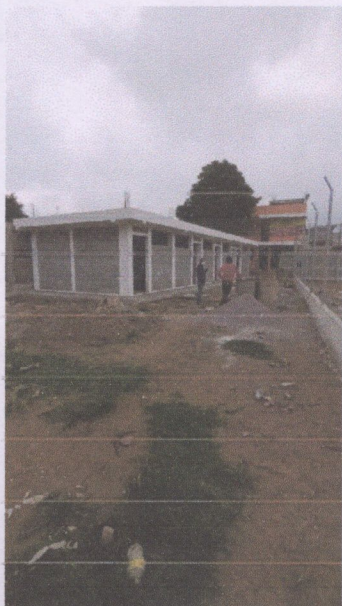
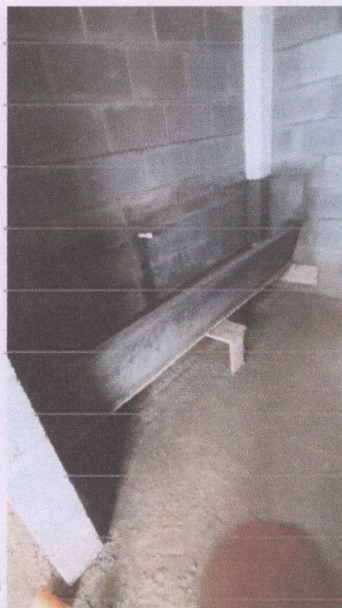


Proyecto:

**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 5A. AVENIDA ENTRE 7A. CALLE A PUENTE
PEATONAL ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**

- Constructora: CONSTRUCTORA EL PROGRESO
- En visita realizada en fechas 11 y 19 de abril se superviso la construcción de bordillos, subrasante y preparación de la base.
- Fecha de inicio: 17/01/2022 Fecha de Finalización: 17/04/2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 46.17% CONTRATO No. 056-2021**

UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605

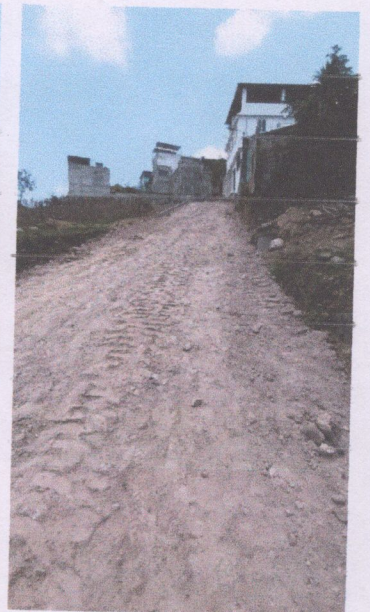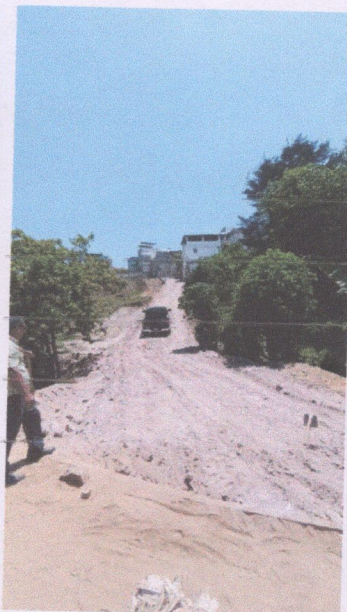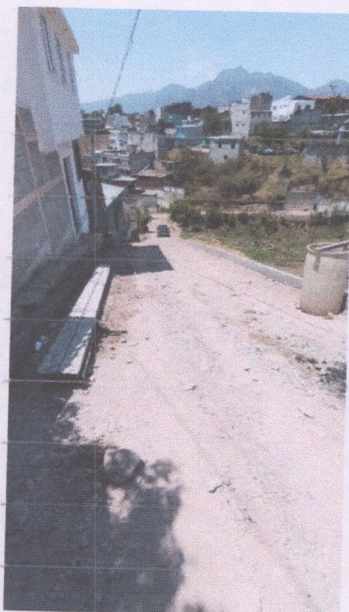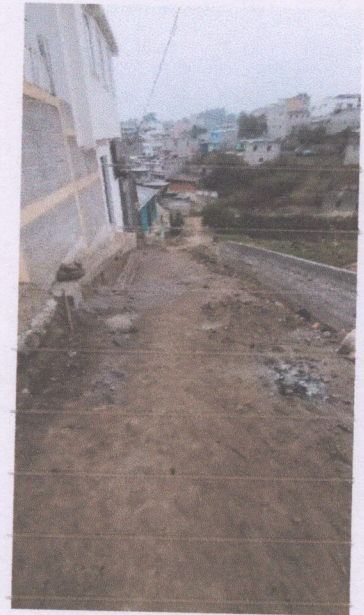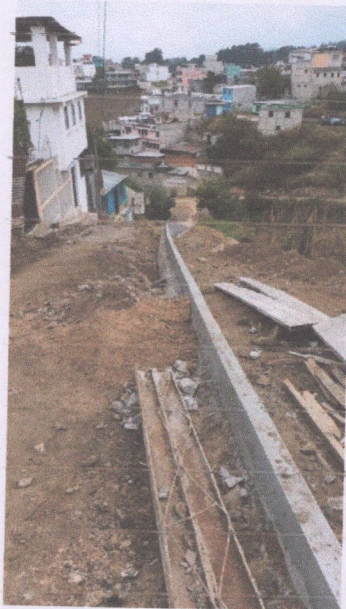
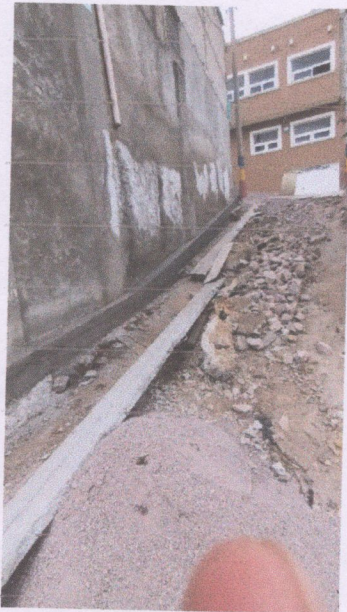


Proyecto:

**MEJORAMIENTO MERCADO PISO DE PLAZA, 5A. CALLE ENTRE 9 Y 10 AVENIDA ZONA 1,
CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.**

- Constructora: "IC&C INGENIERÍA CIVIL Y CONSTRUCCIÓN"
- En supervisión realizada en fecha 26 de abril se visito el taller de estructuras metálicas en el cual se están fabricando los módulos individuales de estructura de plaza con el acompañamiento Arq. Perla Rivera se verifico que se tienen fabricados 100 módulos de los cuales 80 tienen en bodega de almacenamiento y 20 están en proceso de ejecución en taller.
- Fecha de inicio: 07/02/2022 Fecha de Finalización: 07/05/2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 80.00% CONTRATO No. 072-2021**

UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605

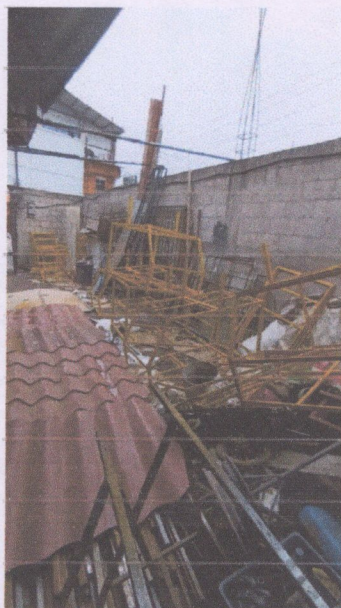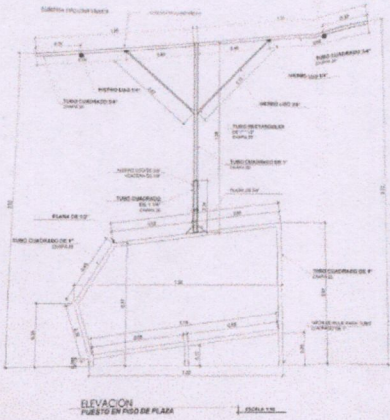


Proyecto:

MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 9A. CALLE B ENTRE 4A. Y 5A. AVENIDA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.

- Constructora: **DETALLES, ARTE EN ARQUITECTURA**
- Se realizo supervisión en fecha 04 de abril, se verifico que aun se encuentran los vecinos y COCODE realizando trabajos de mejoramiento del sistema de agua potable y drenaje, al día de hoy se tiene construido el muro de contención 2, y se están realizando trabajos en el área de Muro de contención 1, se está realizando trazo y zanqueo del mismo.
- Fecha de inicio: 02-03-2022 Fecha de Finalización: 02-09-2022

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 14.14 % CONTRATO No. 059-2,021

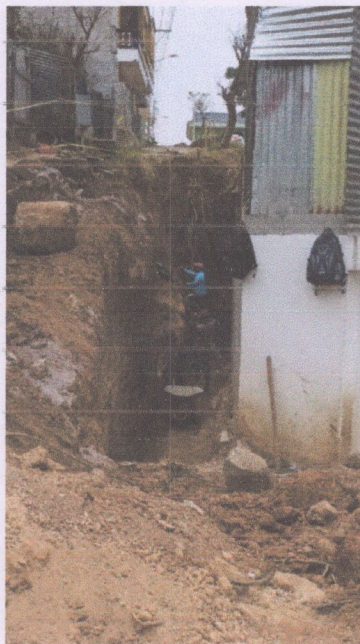

LWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605

Proyecto:

**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1B DE 2A. CALLE ZONA 2, SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.**



- Constructora: **CONSTRUCTORA CODIPA**
- Se realizo supervisión en fecha 06 de abril el proyecto está en trabajos iniciales, se están realizando trabajos preliminares y corte de cajuela.
- Fecha de inicio: 03-03-2022 Fecha de Finalización: 03-06-2022

JWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ

ARQUITECTO
Colegado N. 2605

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 16.51 %

CONTRATO No. 071-2,021

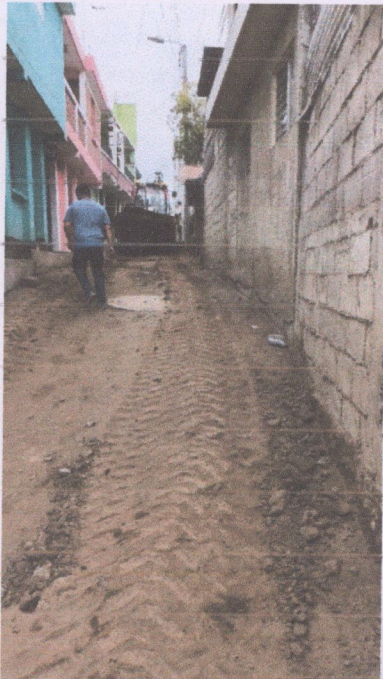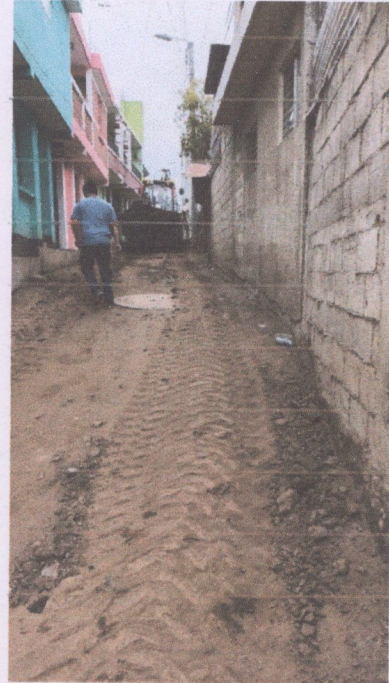

MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE III) ACCESO 3 DE 2A. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: **CONSTRUCTORA y COMERCIAL SEDIPRO**
- Se realizo supervisión en fecha 06 de abril se están realizando trabajos de construcción de muro de contención, se verificaron medidas de base y altura, también se verifico formaleta.
- Fecha de inicio: **no tiene acta de inicio** Fecha de Finalización: 00-00-2022
AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 18.07 % CONTRATO No. 005-2022





LWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605

Proyecto:

MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE QUE CONDUCE A CEMENTERIO CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: **FERRCONS BALCARCEL**
- Se realizo supervisión en fecha 21 de abril en la última visita que se realizo se le hicieron varias observaciones al superintendente de la obra por parte de supervisión y COCODE, por tal motivo se realizo recorrido, medición y verificación final, nuevamente se le hicieron observaciones al contratista, por lo que se le dio tiempo prudente para que realizara las respectivas reparaciones y completar cantidades que no coinciden según lo contratado.
- Fecha de inicio: 08-11-2021 Fecha de Finalización: 23-02-2022

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 99.34 % CONTRATO No. 036-2,021


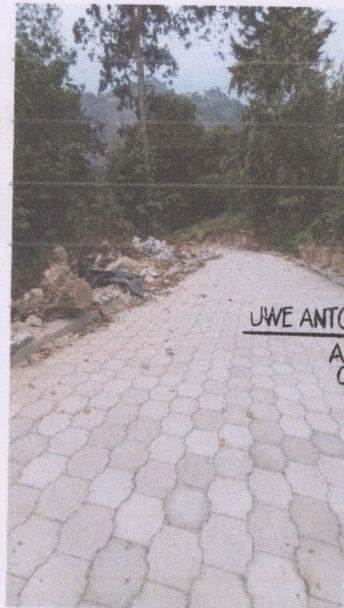
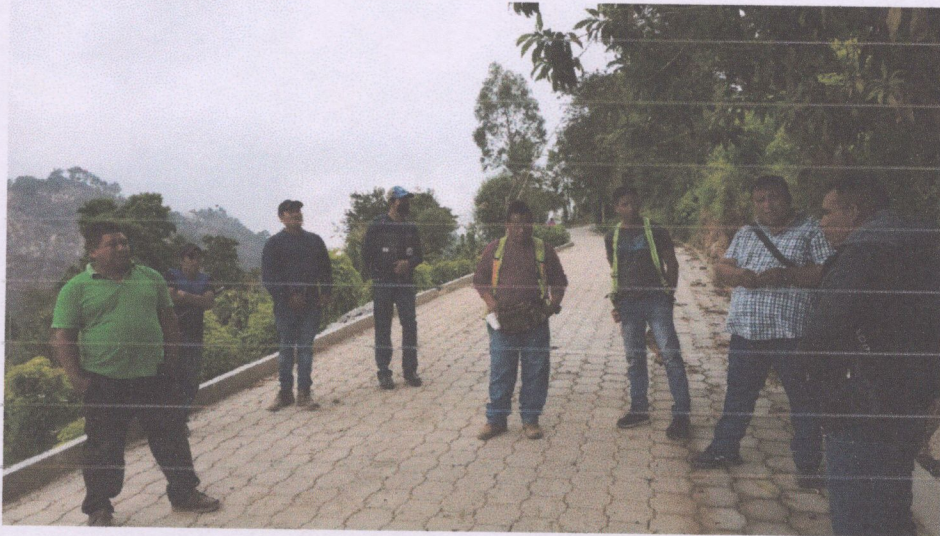


JWE ANTONIO MIRANDA MASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N 2605

Proyecto:

AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR PIEDRA LISA CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: **DETALLES, ARTE EN ARQUITECTURA**
- Se realizo supervisión en fecha 04 de abril 2022, los trabajos que se están efectuando son: levantado de muros, armado y fundición de soleras y columnas intermedias.
- Inicio: 25-02-2022 Fecha de Finalización: 25-07-2022
AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 30.76 % CONTRATO No. 002-2022

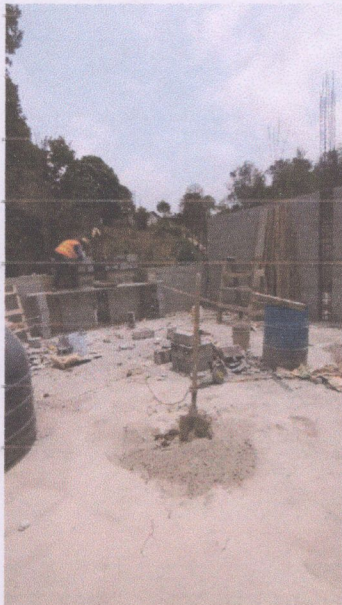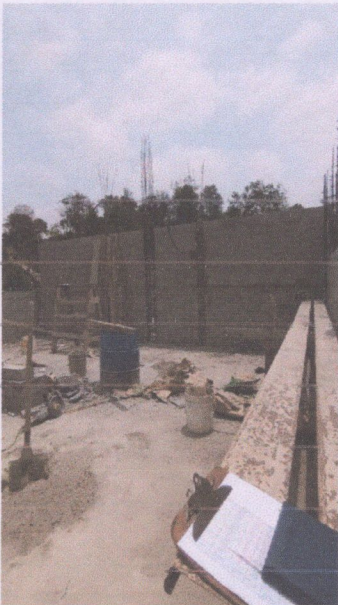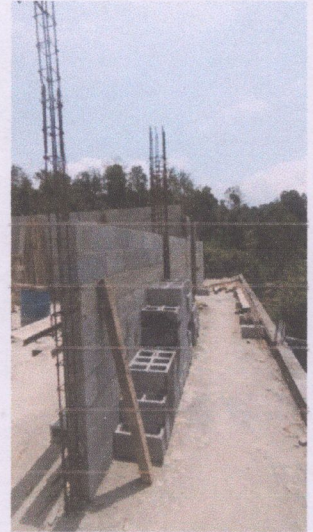


JWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605

Proyecto:

CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CANTON LOS LOPEZ ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: **CONSTRUCTORA Y COMERCIAL AG**
- Se realizo supervisión con fecha 05 de abril 2022 y se verifico el entarimado de losa, encofrado de vigas, se está realizando el armado de estructura de losa, se realizo medición de área de losa.
- Fecha de inicio: 28-12-2021 Fecha de Finalización: 28-04-2022

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 71.60 % CONTRATO No. 057-2,021

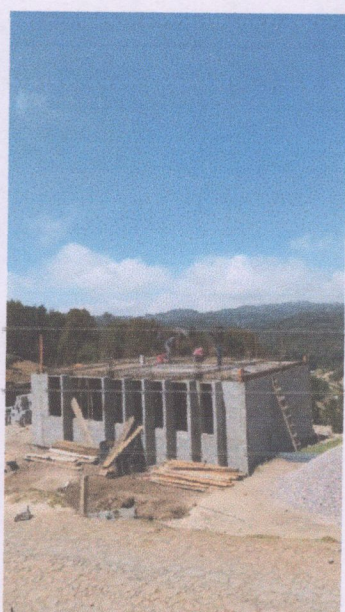

LUWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605

Proyecto:

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DISTRIBUCION) CASERIO LA CUCHILLA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: **CONSTRUCTORA CODIPA**
 - Se realizo Supervisión en fecha 26 de abril, para ver el avance físico, calidad de trabajo, actualmente se han culminado los trabajos de construcción de tanque de distribución, el día de hoy se iniciaron trabajos de trazo y zanqueo para la instalación de tubería en línea de conducción.
 - Fecha de inicio: 07-03-2022 Fecha de Finalización: 07-06-2022
- AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 23.30% CONTRATO No. 042-2,021**



UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605



Proyecto:

**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS PIEDRECITAS,
ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE
SAN MARCOS**

- Constructora: **CONSTRUCTORA G&G**
- Se realizo visita técnica en fecha 25 de abril 2022, para verificar el avance físico y la calidad de trabajos que se están realizando en la obra, actualmente se están realizando trabajos de levantado de muros de block, armado, formaleta y fundición de solera intermedia, se verifico que las tuberías de instalaciones estén ubicadas en los lugares indicados según planos, al momento se estima avance del 48.29%.
- Fecha de inicio: 28-12-2021 Fecha de Finalización: 28-04-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 48.29 % CONTRATO No. 053-2,021**



UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605





Proyecto:

MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO ENTRE CENTRO Y CASERIO SAN RAFAEL, ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: **IC&C INGENIERÍA CIVIL Y CONSTRUCCIÓN**
- Se realizo Supervisión en fechas 28 de abril, se verifico que se tienen construidas las carrileras del tramo 2, el bordillo está construido en su mayoría, pero el proyecto está suspendido por parte del contratista.

Fecha de inicio: 21-02-2022 Fecha de Finalización: 21-06-2022
AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 62.05% CONTRATO No. 051-2,021

UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605

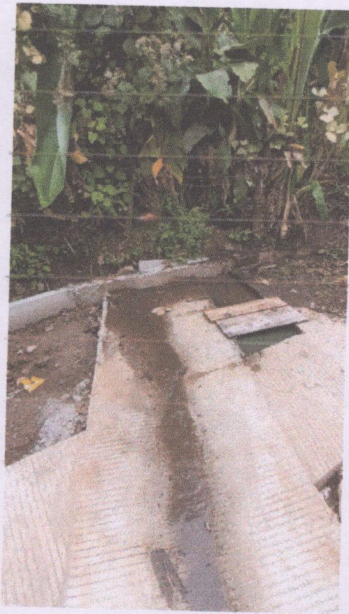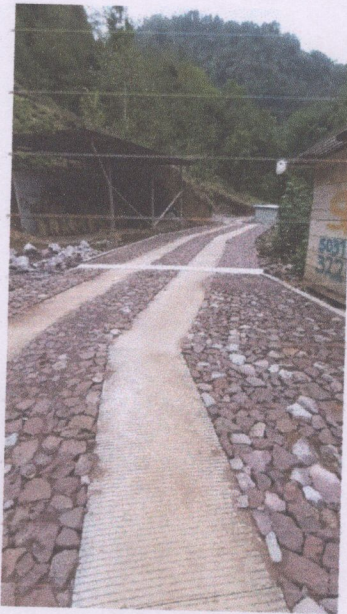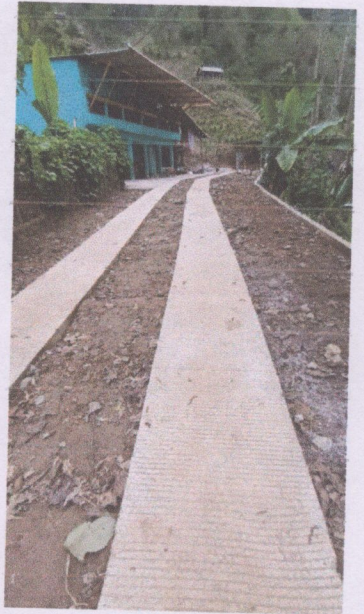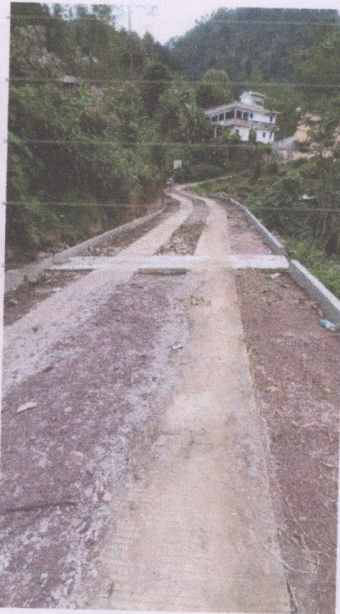


Proyecto:

MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR NUEVA JERUSALEN ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: **"CONSTRUCTORA AMERICANA, KRCC"**
- Se realizo Supervisión en fecha 19 de abril, el proyecto se encuentra culminado en su mayoría, se realizo recorrido para verificar que se hayan cumplido con los renglones contratados y se tiene proyectado hacer medición final, recorrido y verificación con COCODE y empresa el día viernes 30 de abril
- Fecha de inicio: 22-12-2021 Fecha de Finalización: 22-04-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 90.80% CONTRATO No. 054-2,021**

UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605





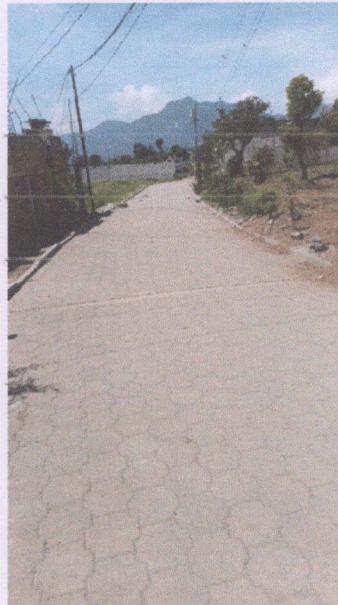


Proyecto:

**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ENTRADA SECTOR LOS RAMOS SANTA RITA II
ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.**

- Constructora: **CONSTRUCTORA JC 3**
- Se realizo primera Supervisión en fecha 22 de abril, para verificar el avance físico y la calidad de trabajos que se están realizando en la obra, se han realizado trabajos de trazo y replanteo, corte de cajuela, conformación de subrasante, preparación de base de 0.20mt. y se realizaron los estudios de densidad del suelo. Se hizo recorrido con Ing. Superintendente de obra y presidente de COCODE, Felipe Bautista
- Fecha de inicio: 15-02-2022 Fecha de Finalización: 15-06-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 35.22% CONTRATO No. 019-2021**


UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605

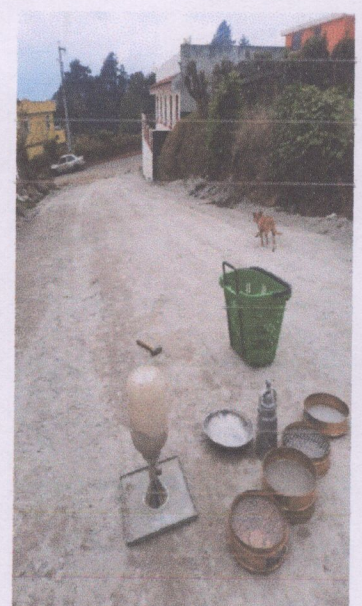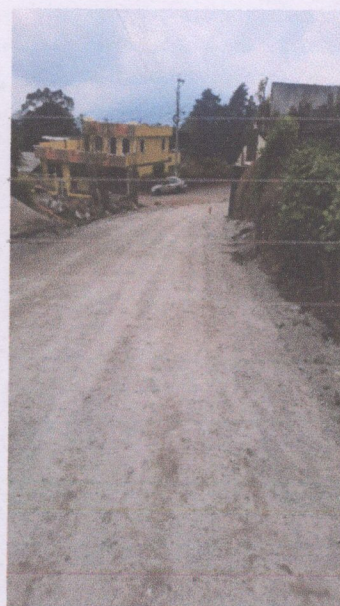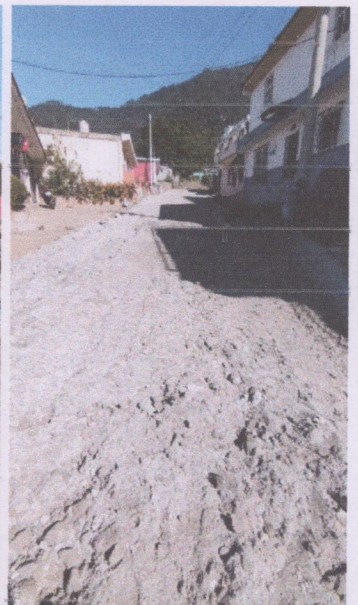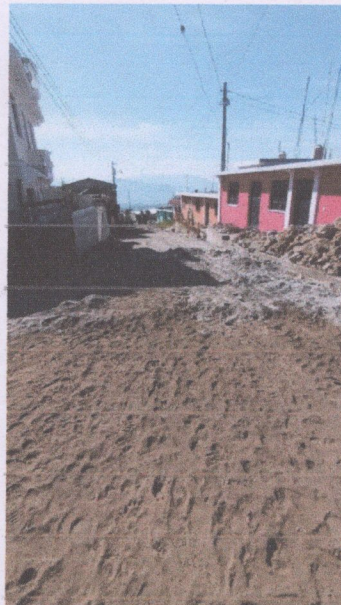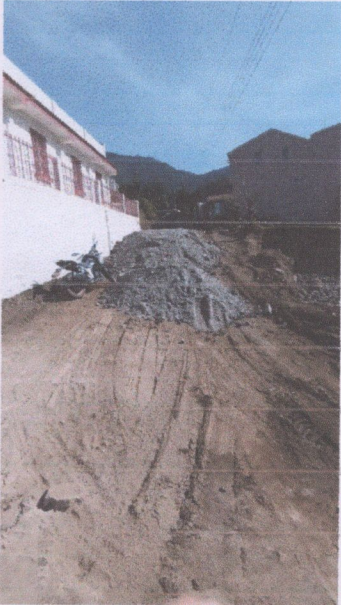

Proyecto:

MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ENTRADA 9A. AVENIDA ZONA 4 SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: **INNOVACIONES EN CONSTRUCCION**
- Se realizo supervisión en fecha **12 abril 2022**, A solicitud de la empresa ejecutora en la cual indican que el proyecto esta concluido al 100% Se realizo verificación, medición en acompañamiento del superintendente del proyecto y Presidente de COCODE Sr. Juan Carlos Velásquez, se realizo la respectiva medición y se constato que el proyecto esta culminado conforme a planos y renglones contratados.
- Fecha de inicio: **08-11-2021** Fecha de Finalización: **08-03-2022**
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00% CONTRATO No. 035-2,021**

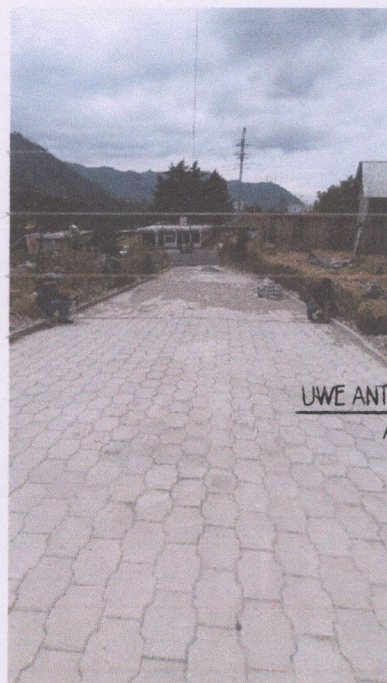

UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605

Proyecto:

**MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
SAN MARCOS**

- Constructora: **CONSTRUCTORA EARVECO**
- Se realizó supervisión en fecha 27 de abril 2022, se verificó que los trabajos que se están realizando estén conforme a lo contratado y planos, se están realizando acabados en muros, instalaciones hidráulicas y sanitarias, construcción de cajas de drenaje.
- Fecha de inicio: 22/11/2021 Fecha de Finalización: 22/05/2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 80.99% CONTRATO No. 032-2,021**

UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605



Proyecto:

MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO AGUA TIBIA AREA ECOLOGICA ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: **CONSTRUCTORA EARVECO**
- Se realizo supervisión en fecha 31 de marzo 2022, a solicitud del contratista se realizo el respectivo recorrido para realizar la recepción previo a solicitar comisión receptora, se verifico que los trabajos estuvieran ejecutados según contrato, pero si hicieron observaciones por lo cual se le dio tiempo de 15 días para las respectivas reparaciones pero el superintendente indico que las reparaciones las pueden cumplir en el tiempo sin embargo la fabricación de piso lleva un poco más de tiempo solicitando 25 días hábiles para completar las observaciones solicitada.
- Fecha de inicio: 10/09/2021 Fecha de Finalización: 10/02/2022 10/03/2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 93.57% CONTRATO No. 011-2021**



JWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605



LUWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605



San Pedro Sacatepéquez, 06 de mayo de 2022


Doctor:
Juan Eliézer González González
Alcalde Municipal
Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez
Departamento de San Marcos


Un gusto saludarlo, deseándole lo mejor al frente de tan digno cargo.

Adjunto en la presente encontrara el informe ejecutivo de los trabajos ejecutados durante el mes de abril del año 2022, supervisiones a los Proyectos en ejecución, una breve descripción y su Avance Físico, de los proyectos por cotización y licitación.


Sin otro particular

Atentamente





Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186
Ing. Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
Supervisor de Obras
Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN DE CANTON SAN LORENZO A CANTON OJO DE AGUA ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"GONZALEZ"**
- Durante el mes se trabajó los renglones de bordillos de concreto, cama de arena de asiento, adoquinado de tráfico pesado, llaves de confinamiento y viga de remate. Se le solicitaron los estudios de laboratorio al contratista.
- Fecha de inicio: 21-12-2021 Fecha de Finalización: 20-08-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 65.00 % CONTRATO No. 048-2021**

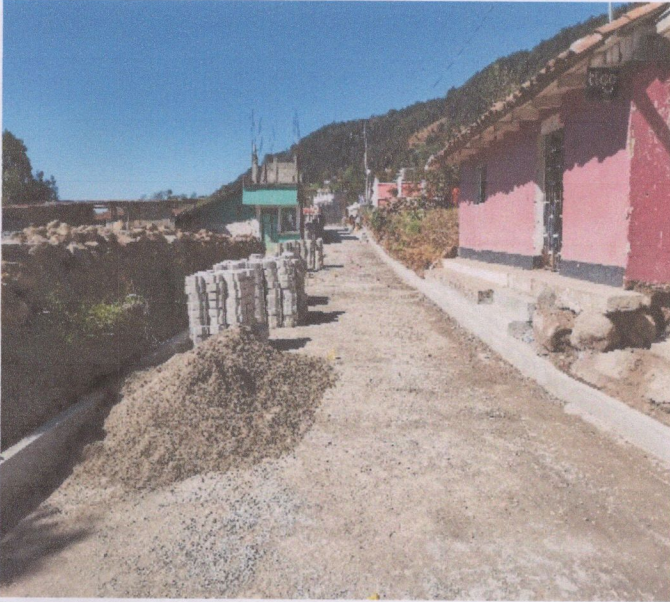

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NAVIDAD CASERIO IXCA ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: "EL PROGRESO"
- Durante el mes se continua con la instalación de tubería PVC Ø 6" e instalación de tubería PVC Ø 8" y el relleno + compactación de zanja.
- Fecha de inicio: 17-02-2022 Fecha de Finalización: 17-05-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 60.00 % CONTRATO No. 003-2022**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA URBANA MIXTA CANTON EL MOSQUITO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CIFUENTES VELASQUEZ”**
- Durante el mes se realizan correcciones al proyecto y limpieza final.
- Fecha de inicio: 12-04-2021 Fecha de Finalización: 18-03-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 99.06 % CONTRATO No. 037-2020**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE (CONDUCCION) CASERIO CIPRES GRANDE ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CONSTRUCOM”**
- Durante el mes se iniciaron los trabajos de trazo y replanteo, captación típica, zapata Z-1, cimiento corrido, muro de cimentación, solera de humedad, columna C-1, Columna C-2, Columna C-3 y levantado de muro en caseta.
- Fecha de inicio: 06-04-2022 Fecha de Finalización: 06-09-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 3.30 % CONTRATO No. 008-2022**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CIFUENTES VELASQUEZ”**
- Durante el mes se continúa con el armado de las vigas tipo 1 de cámaras de sedimentación y se continúa el armado de la estructura de la cámara de sedimentación 3.
- Fecha de inicio: 12-04-2021 Fecha de Finalización: 12-10-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 75.00 % CONTRATO No. 033-2020**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL (MODULOS 2 Y 3) MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“ARCHILA”**
- Durante el mes se continúa con los trabajos de armado de viga tipo V-1 y viga tipo V-2 del módulo de administración y también se trabajó el armado de las gradas y se fundieron.
- Fecha de inicio: 01-03-2021 Fecha de Finalización: 01-09-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 45.60 % CONTRATO No. 040-2020**




SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE 20 DE ENERO, CASERIO EL BOQUERON, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“RAMCO, SOCIEDAD ANONIMA”**
- Durante el mes se finalizaron los trabajos de bordillos laterales. Se solicitaron los estudios de laboratorio al contratista.
- Fecha de inicio: 01-02-2022 Fecha de Finalización: 01-08-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 37.00 % CONTRATO No. 007-2022**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. CALLE ZONA 5 ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“G & G”**
- Durante el mes se finalizaron los trabajos de construcción de pozos de visita, instalación de tubería y relleno + compactación de zanja, empedrado + estucado, levantar y colocar adoquín, reposición de llaves transversales y limpieza final. Se realizan correcciones al proyecto.
- Fecha de inicio: 16-11-2021 Fecha de Finalización: 16-04-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 99.70 % CONTRATO No. 031-2021**

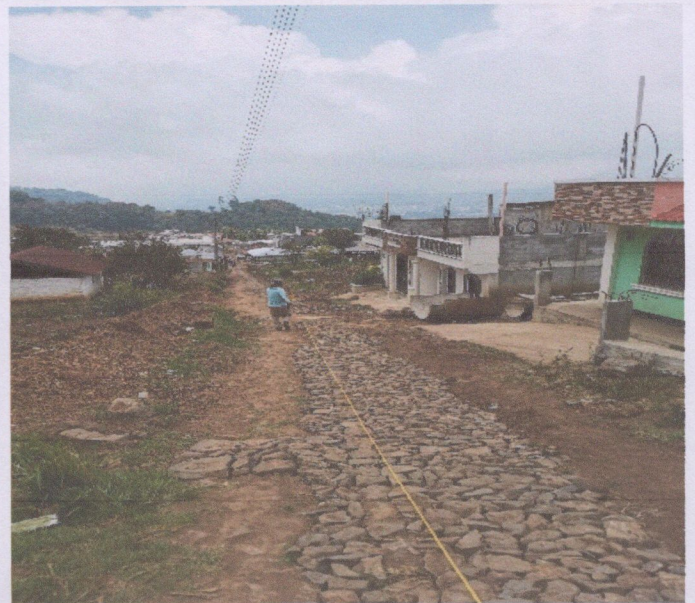

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1 CANTON VISTA HERMOSA ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCCIONES PROGRESO"**
- Durante el mes se continúa trabajando con los renglones de cama de arena de asiento, adoquín de tráfico pesado y llaves de confinamiento. Se solicitaron los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 16-12-2021 Fecha de Finalización: 16-05-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 80.00 % CONTRATO No. 041-2021**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO ENTRADA CASERIO SANTA TERESA ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCCIONES PROGRESO"**
- Durante el mes se trabajó los bordillos laterales, fundición de carrileras de concreto, empedrado + estucado, loseta de remate y rotulo de identificación del proyecto.
- Fecha de inicio: 02-12-2021 Fecha de Finalización: 02-05-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 99.00 % CONTRATO No. 038-2021**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA APARICIO MERIDA MORALES CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“MEGA-CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE”**
- Durante el mes se realizan correcciones al proyecto y limpieza general.
- Fecha de inicio: 26-11-2021 Fecha de Finalización: 26-03-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 99.80 % CONTRATO No. 040-2021**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1 DE 2A. AVENIDA A ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCTORA INGENIERIA PARA PROYECTOS CIVILES"**
- Durante el mes se finalizaron los renglones de cama de arena de asiento, adoquín tráfico pesado, llaves de confinamiento, llaves de remate y se instaló el rotulo de identificación.
- Fecha de inicio: 07-02-2022 Fecha de Finalización: 07-05-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 92.00 % CONTRATO No. 060-2021**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“C Y R INGENIERIA”**
- Durante el mes se trabajó con los renglones de levantado de paredes de block sisadas, solera intermedia, solera corona, viga V-1, viga V-2 y solera final.
- Fecha de inicio: 26-11-2021 Fecha de Finalización: 26-08-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 24.50 % CONTRATO No. 045-2021**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CALLEJON 1 DE 2A. AVENIDA ZONA 4, CANTON TONALA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR"**
- Durante el mes se trabajó con los renglones de trazo y replanteo topográfico y nivelación y compactación de sub-rasante (cajuela).
- Fecha de inicio: 14-12-2021 Fecha de Finalización: 14-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 9.00 % CONTRATO No. 044-2021**



PROYECTO SUSPENDIDO

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 6 ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCTORA EL PROGRESO"**
- Durante el mes se trabajó con los renglones de trazo y replanteo, corte de cajuela ($e=0.33m$) y la conformación de Sub-rasante.
- Fecha de inicio: 08-11-2021 Fecha de Finalización: 08-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 14.10 % CONTRATO No. 044-2020**



PROYECTO SUSPENDIDO

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PALENCIA ALDEA SACUCHUM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CONSTRUCTORA EL PROGRESO”**
- Durante el mes se realizan correcciones al proyecto y limpieza final.
- Fecha de inicio: 15-04-2021 Fecha de Finalización: 12-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 99.54 % CONTRATO No. 026-2020**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO 2A. CALLE ALDEA EL TABLERO SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CONSTRUCTORA GONZALEZ”**
- Durante el mes se trabajó con los renglones de corte de cajuela, conformación de Sub-rasante, base de material granular, carrileras de concreto, bordillos laterales y empedrado.
- Fecha de inicio: 20-09-2021 Fecha de Finalización: 20-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 91.00 % CONTRATO No. 022-2021**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO ORATORIO ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCTORA EARVECO"**
- Durante el mes se continúa trabajando la columna C-2, C-3, C-4, C-5, levantado sobre cimiento, solera hidrófuga y levantado de block.
- Fecha de inicio: 20-12-2021 Fecha de Finalización: 20-06-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 20.40 % CONTRATO No. 050-2021**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ENTRADA ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCTORA DETALLES, ARTE EN ARQUITECTURA"**
- Durante el mes se trabajó la construcción del transversal y la carpeta de rodadura de pavimento rígido. Se solicitó al contratista el diseño de mezcla y los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 01-03-2022 Fecha de Finalización: 01-09-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 65.00 % CONTRATO No. 061-2021**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL 1A. CALLE A ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CONSTRUCTORA COINPRO”**
- Durante el mes se trabajó los renglones remoción de adoquín existente, demolición de banqueta existente, conformación de sub-rasante y la construcción del canal pluvial.
- Fecha de inicio: 14-02-2022 Fecha de Finalización: 14-08-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 11.00 % CONTRATO No. 065-2021**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL Y CANALETA TRAMO FINAL ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CONSTRUCTORA Y COMERCIAL AG”**
- Durante el mes se trabajó los renglones de trabajos preliminares (limpia y chapeo), trazo y replanteo, Excavación, Muro de contención 1, Muro de contención 2, muro de contención 3, Zapata Z-1, Zapata Z-2 y Columna C-1, Se le solicitaron los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 10-03-2022 Fecha de Finalización: 10-07-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 30.00 % CONTRATO No. 006-2022**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 3 SOBRE 3A. CALLE ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCTORA Y COMERCIAL SEDIPRO"**
- Durante el mes se iniciaron los renglones, trabajos preliminares, remoción de adoquín existente, demolición de banqueta existente y conformación de sub-rasante.
- Fecha de inicio: 07-12-2020 Fecha de Finalización: 15-04-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 85.00 % CONTRATO No. 017-2020**

OBSERVACIONES: Según acta Numero: 028-2021; ACUERDA aprobar la suspensión del proyecto a partir del 23 de febrero del año 2,021. Hasta que se rezlice los trabajos de cambio de tubería del servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, por parte del Departamento Municipal de Agua y Drenaje. y Según Acta Numero: 039-2022; ACUERDA Levantar la suspensión del proyecto a partir del cuatro de abril del año 2,022.



Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1C DE CALZADA EL MOSQUITO ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto de compra directa de la Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos. Según NOG: 15284603
- Constructora: **"CONSTRUCTORA CODIPA"**
- Se trabajó con los renglones de trazo y replanteo, corte de cajuela, conformación de subrasante, preparación de la base, bordillos laterales, cama de arena de asiento, adoquinado de tráfico pesado, llaves de confinamiento, loseta de remate, rotulo de identificación del proyecto y limpieza general.
- Fecha de inicio: 08-12-2021 Fecha de Finalización: 08-03-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % ACUERDO MUNICIPAL No. 065-2021**



Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186
