



San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, 30 de junio 2,022

Ingeniero:

Erickson Euler Fuentes Miranda

Director Municipal de Planificación
Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez,
Departamento de San Marcos.

Un gusto saludarlo, deseándole lo mejor al frente de tan digno cargo.

Adjunto en la presente encontrara el informe Físico- Financiero, Informe Ejecutivo y estatus de proyectos asignados a mi persona durante el mes de junio del año 2022.

Sin Otro Particular

Atentamente:


UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605

Arq. Uwe Antonio Miranda Vásquez
Supervisor de Obras Municipales
Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.

15:26
Recibido
9/10/2022




**SUPERVISION DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ**

JUNIO 2022



**UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
COLEGIADO No. 2,605**




JWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605

**Proyecto CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI)
CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**

- Constructora: **CONSTRUCTORA JC 3**
- Fecha de inicio: 16-09-2021 Fecha de Finalización: 16-10-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 42.00% CONTRATO No. 026-2021**
- Se verifico que los trabajos de levantado de muros en el nivel 1 y 2 están ejecutados en 90% ya se encuentran realizado instalaciones hidráulicas, eléctricas y especiales en muros, se le está aplicando repello a muros en donde no llevaran instalaciones, en el nivel 3 se superviso montaje de formaleta, entubado de instalaciones eléctricas que quedaran empotradas en losa, en fecha 09 de junio se realizo supervisión en fundición de losa final, actualmente en fecha 28 de junio se procede a el desmontaje de formaleta y limpieza de áreas.
- Fecha de inicio: 16-09-2021 Fecha de Finalización: 16-10-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 50.60 % CONTRATO No. 026-2021**

LUWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605

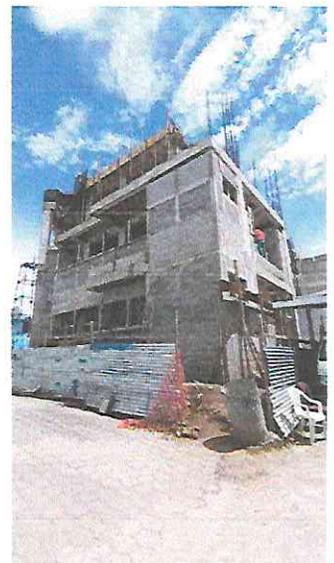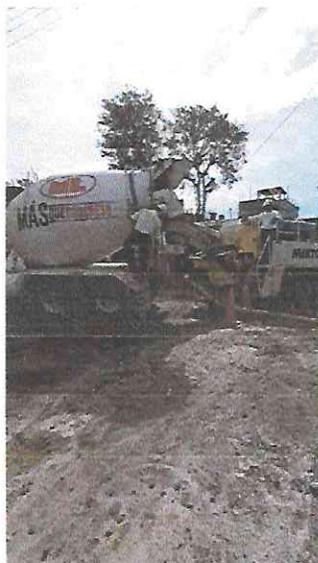

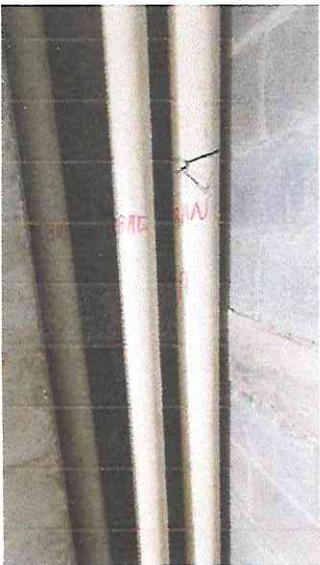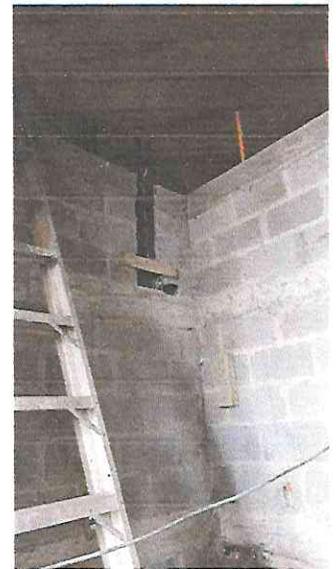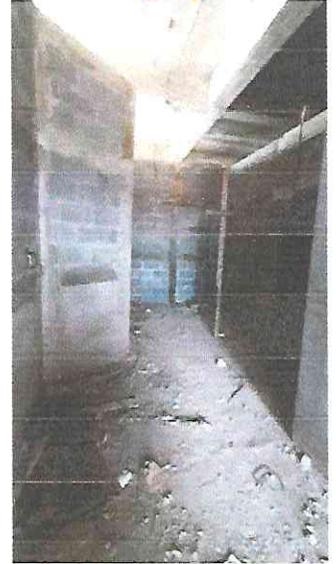


Proyecto:

**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 4A. AVENIDA A ZONA 1
CANTON SAN AGUSTIN TONALA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**

- Constructora: CONSTRUCTORA GONZALEZ
- En supervisión realizada en fecha 08 de junio se verifico que ya en el modulo de vestidores está concluido, queda pendiente la instalación de artefactos sanitarios y accesorios eléctricos, se está trabajando en la instalación de malla en perímetro de cancha, se están trabajando muros pineados de área de parqueo.
- Fecha de inicio: 13/04/2021 Fecha de Finalización: 13/10/2021
Se solicito ampliación por 6 meses Tiempo contractual modificado 13/04/2022
El proyecto estuvo suspendido por medio de Acta de Concejo Municipal N. 013-2022 a partir del 27 de enero 2022, se levanto suspensión por medio de Acta de Concejo Municipal N. 078-2022 se reinician los trabajos a partir del 23 de mayo 2022 sumando 117 días de suspensión **modificando el tiempo al 17 de septiembre 2022**
- **AVANCE ACUMULADO 75.13% CONTRATO No. 035-2,020**

LUWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605


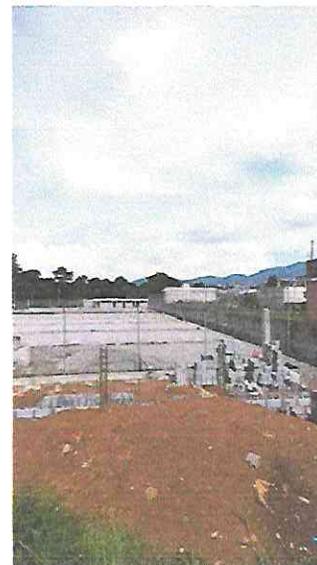


Proyecto:

**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 5A. AVENIDA ENTRE 7A. CALLE A PUENTE
PEATONAL ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**

- Constructora: CONSTRUCTORA EL PROGRESO
- Se concluyeron los trabajos, se había hecho recepción previa pero por temas de lluvia se dañó la base por lo que se le solicitó al contratista que se revisaran varios tramos y se conformara nuevamente la base por lo que se realizó recorrido y verificación final, y el proyecto se encuentra al 100% ejecutado
- Fecha de inicio: 17/01/2022 Fecha de Finalización: 17/04/2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00% CONTRATO No. 056-2021**

UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605

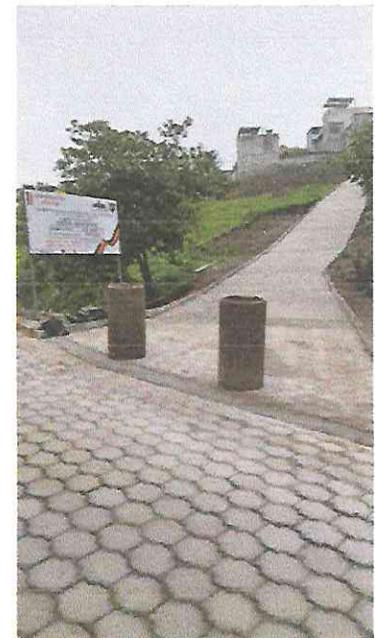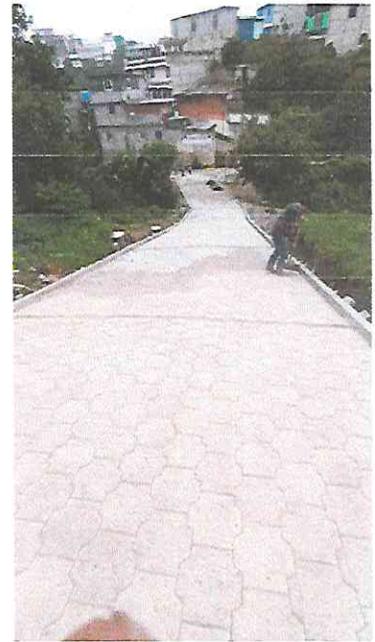


Proyecto:

**MEJORAMIENTO MERCADO PISO DE PLAZA, 5A. CALLE ENTRE 9 Y 10 AVENIDA ZONA 1,
CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.**

- Constructora: **“IC&C INGENIERÍA CIVIL Y CONSTRUCCIÓN”**
- Actualmente se está a la espera de que el proyecto pueda ser entregado al COCODE de la parroquia o a la Asociación de Vendedoras, pero al día de hoy no se tiene respuesta, los módulos siguen resguardados en bodegas de la empresa.
- Fecha de inicio: 07/02/2022 Fecha de Finalización: 07/05/2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00% CONTRATO No. 072-2021**

UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605

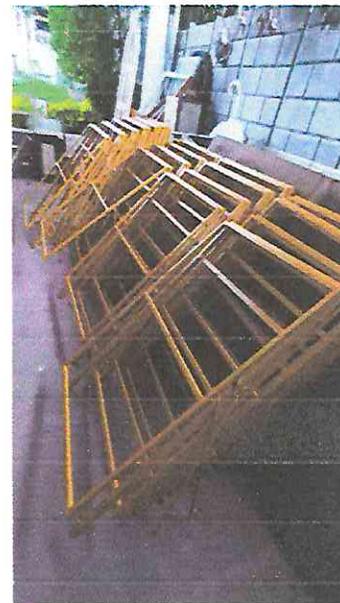

Proyecto:


MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 9A. CALLE B ENTRE 4A. Y 5A. AVENIDA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.

- Constructora: **DETALLES, ARTE EN ARQUITECTURA**
- Actualmente se encuentran concluidos los muros de contención y se está realizando relleno controlado en muros para conformación de sub rasante, aun siguen realizando trabajos de mejoramiento de sistema de agua potable y drenajes, se está por iniciar trabajos de corte de cajuela en el área en donde ya se concluyeron los trabajos de mejoramiento del sistema de agua y drenaje.

- Fecha de inicio: 02-04-2022 Fecha de Finalización: 02-09-2022

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 35.94% CONTRATO No. 059-2,021

LUWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605

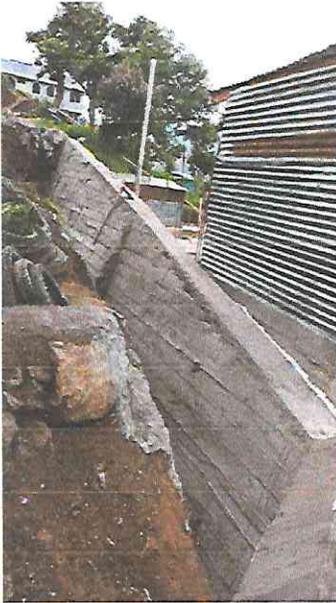



Proyecto:



MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE III) ACCESO 3 DE 2A. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: **CONSTRUCTORA y COMERCIAL SEDIPRO**
- Al día de hoy se encuentra suspendido el proyecto por parte del contratista, argumenta que no puede continuar por no contar con la liquidez y en municipalidad no le han liberado los fondos respectivos, se deja constancia que el proyecto no se ha tramitado ninguna suspensión por parte de Supervisión Municipal. **Este mes se reporta sin avance.**
- Fecha de inicio: **02-05-2022** Fecha de Finalización: **02-08-2022**
AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 72.39 % CONTRATO No. 005-2022

UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605

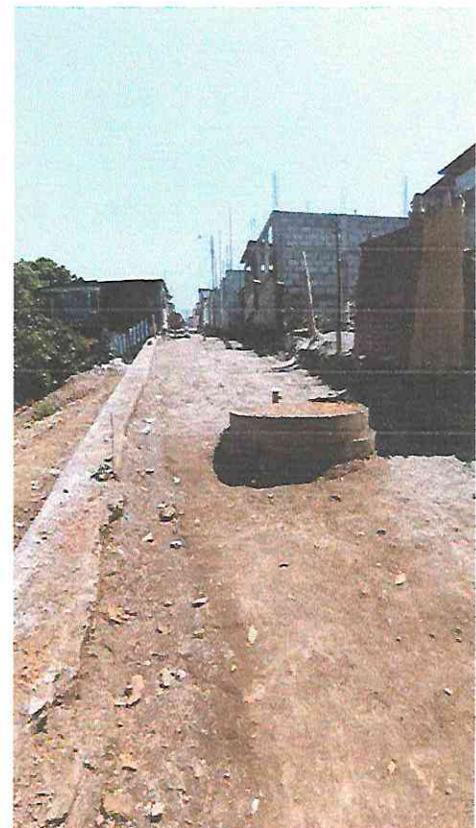
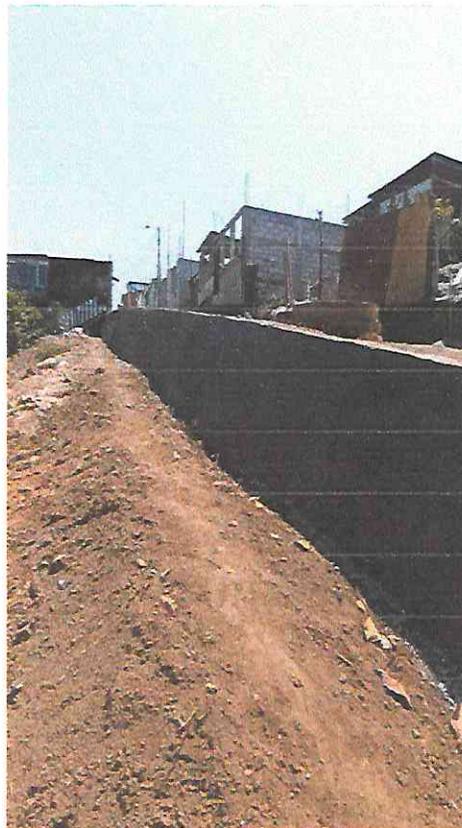


Proyecto:

MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE III) 8A. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: **INGENIERIA Y CONSTRUCTORA EMANUEL**
- A solicitud del contratista indicando que el proyecto se encuentra finalizado, se procedió a realizar supervisión y recorrido final el día viernes 17 de Junio, en el cual se verifico, cuantificación y medición final, haciendo constar que el proyecto se encuentra ejecutado al 100%
- Fecha de inicio: 06-12-2021 Fecha de Finalización: 06-04-2022
(76 días de suspensión) fecha modificada 18-07-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00% CONTRATO No. 037-2021**

LUWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605

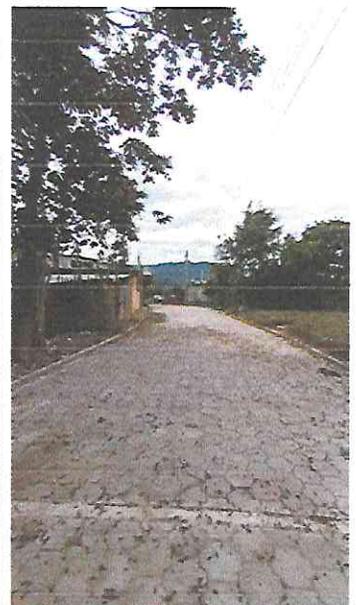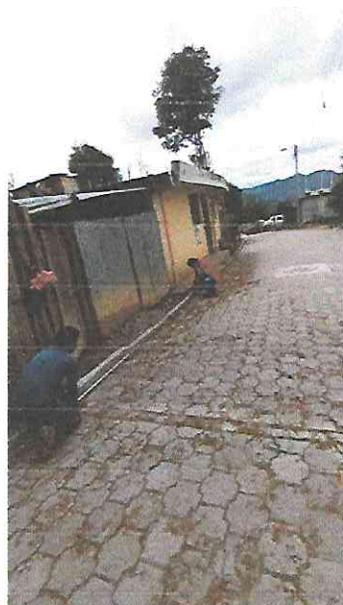

Proyecto:


AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR PIEDRA LISA CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: **DETALLES, ARTE EN ARQUITECTURA**
- Se realizo supervisión en fecha 14-16 de Junio 2022, los trabajos que están ejecución son: Acabado en columnas, vigas y soleras, instalación de estructura metálica y cubierta de lámina de zinc cal 26. Según especificaciones en planos.
- Inicio: 25-02-2022 Fecha de Finalización: 25-07-2022

UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 53.05%

CONTRATO No. 002-2022

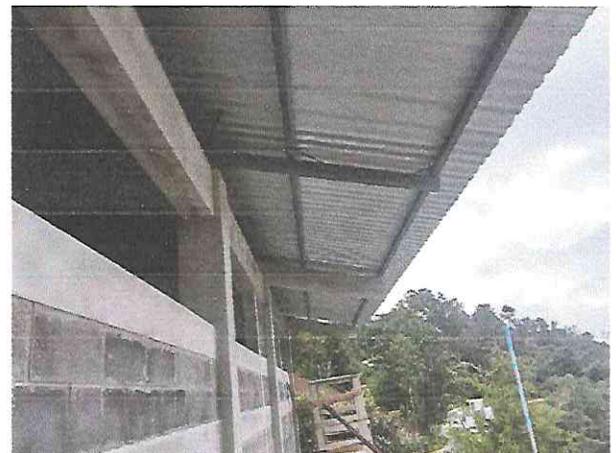

Proyecto:

CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CANTON LOS LOPEZ ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: **CONSTRUCTORA Y COMERCIAL AG**
- Se realizo supervisión con fecha 22 de junio, se verificaron los trabajos en acabado en muros, losas, instalación de pisos, instalación de puertas ventanas, instalación de artefactos sanitarios, instalación eléctrica (Iluminación-fuerza) el proyecto se encuentra en fase final de trabajos.
- Fecha de inicio: 28-12-2021 Fecha de Finalización: 28-04-2022



Tiempo contractual modificado: 30-06-2022

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 95.39 %

CONTRATO No. 057-2,021

LWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ

ARQUITECTO
Colegado N. 2605

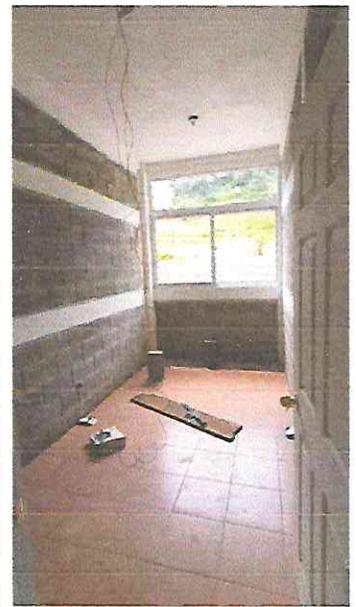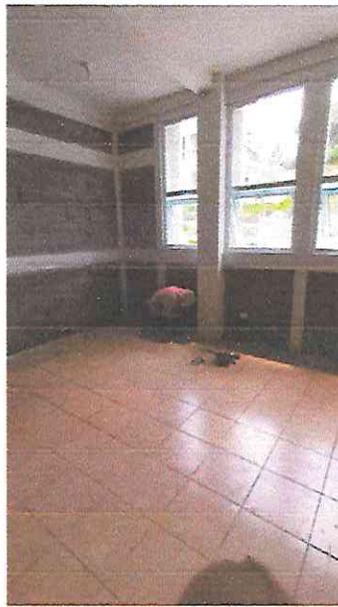


Proyecto:

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DISTRIBUCION) CASERIO LA CUCHILLA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: **CONSTRUCTORA CODIPA**
- Se realizo Supervisión en fecha 17 de junio, a solicitud del propietario de la empresa indicando que los trabajos contratados están concluidos, se realizo recorrido final, cuantificación, medición y se realizo prueba de agua en la tubería instalada en los puntos más críticos del sistema, el recorrido se realizo con el acompañamiento de miembros del COCODE, Auxiliatura y vecinos beneficiados con el proyecto, indicando que están satisfechos con el trabajo realizado por lo que se estima que el proyecto está concluido en su totalidad.

UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605

- Fecha de inicio: 07-03-2022 Fecha de Finalización: 07-07-2022
AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00% CONTRATO No. 042-2,021




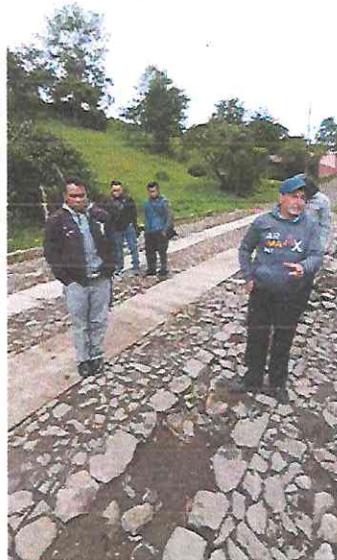


Proyecto:

**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS PIEDRECITAS,
ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE
SAN MARCOS**

- Constructora: **CONSTRUCTORA G&G**
- Se realizo visita técnica en fecha 16 de junio 2022, para verificar el avance físico, actualmente se están realizando trabajos de nivelación de columnas de muro para instalar estructura metálica de cubierta, aun se encuentra paraleada y con formaleta la losa, se está trabajando el área exterior del edificio.
- Fecha de inicio: 28-12-2021 Fecha de Finalización: 28-04-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 71.39% CONTRATO No. 053-2,021**

UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605

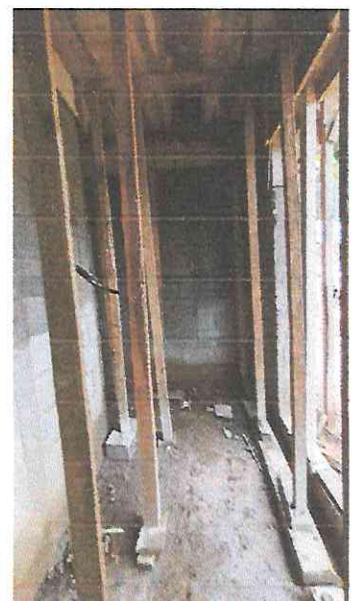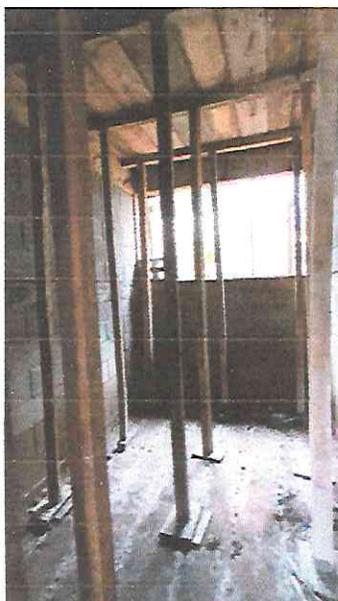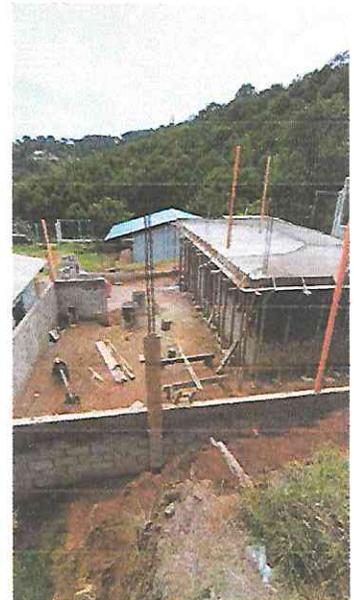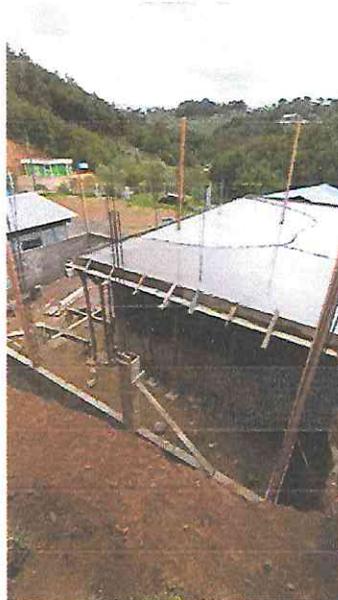

Proyecto:

MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO ENTRE CENTRO Y CASERIO SAN RAFAEL, ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: IC&C INGENIERÍA CIVIL Y CONSTRUCCIÓN
- Se realizo supervisión 07 de junio para verificar que los trabajos se hayan retomado, se realizo medición de avance con el acompañamiento de miembros del COCODE y representantes de la constructora, se tienen construidas en total las carrileras, se está construyendo transversal y queda pendiente empedrado.

• Fecha de inicio: 21-02-2022 Fecha de Finalización: 21-06-2022
AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 85.93% CONTRATO No. 051-2,021

LUWE ANTONIO MIRANDA VÁSQUEZ




ARQUITECTO
Colegiado N. 2605



Proyecto:

**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ENTRADA SECTOR LOS RAMOS SANTA RITA II
ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.**

- Constructora: **CONSTRUCTORA JC 3**
- Se realizo supervisión en fecha 15 de junio, para verificar el avance físico se continua con la construcción de bordillo se verificaron medidas de 0.40 x 0.10m. en el lugar ya se cuenta con parte del adoquín, se realizaran trabajos de reparación de conformación de base.
- Fecha de inicio: 15-02-2022 Fecha de Finalización: 15-06-2022
Se aprobó tiempo contractual de 30 días calendario por medio de Acuerdo de Alcaldía Municipal N. 046-2022 con fecha 30-05-2022 modificando fecha de finalización al 15-07-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 41.46% CONTRATO No. 019-2021**

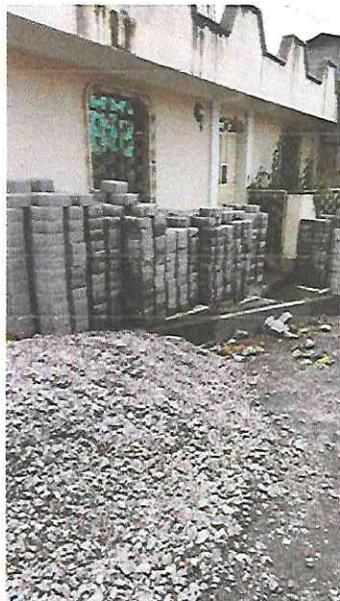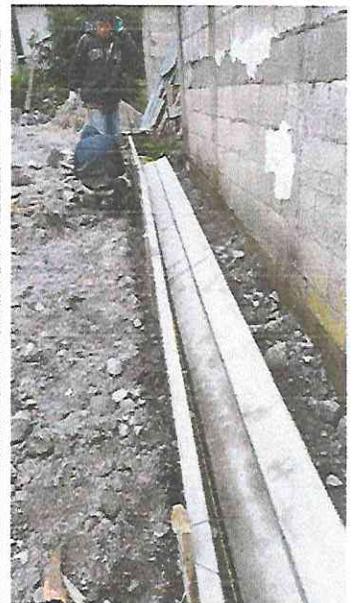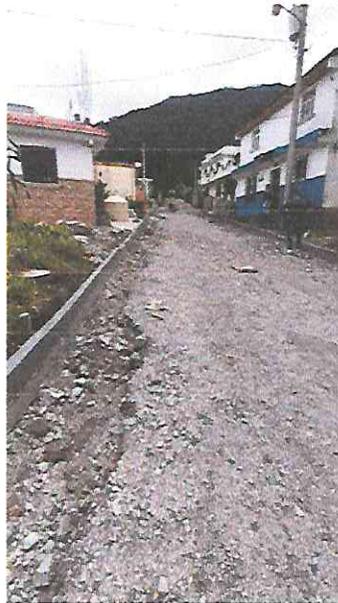

LWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605

Proyecto:

**MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
SAN MARCOS**




- Constructora: **CONSTRUCTORA EARVECO**
- En fecha 11 de junio se realizo supervisión, atendiendo solicitud del contratista con fecha 20 de mayo 2022 en donde manifiesta que el proyecto está concluido, haciendo el respectivo recorrido, cuantificación y medición verificando que los renglones contratados están concluidos en su totalidad, pero no se tienen contemplados trabajos de tratamiento exterior en fachada frontal por lo que la empresa constructora se comprometió a realizar las mejoras respectivas, para el mejoramiento del edificio, se le dieron 10 días para realizar los trabajos solicitados, en fecha 23 de junio se realizo nuevamente recorrido se superviso y verifiko que se había realizado lo solicitado, este recorrido de realizo con el acompañamiento de miembros de COCODE y Auxiliatura recibiendo satisfactoriamente los trabajos realizados.


UWE ANTONIO VASQUEZ

ARQUITECTO
Colegiado N. 2605

- Fecha de inicio: 22/11/2021 Fecha de Finalización: 22/05/2022

- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00% CONTRATO No. 032-2,021**

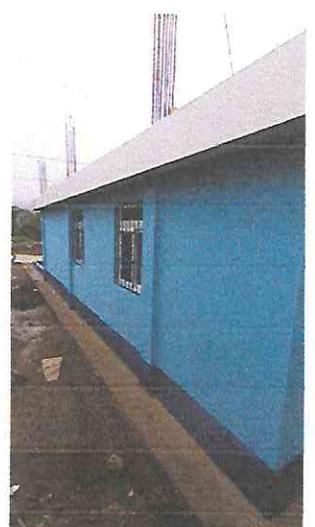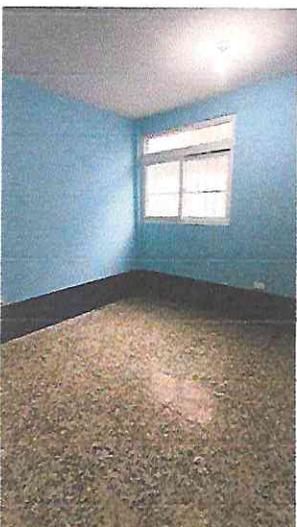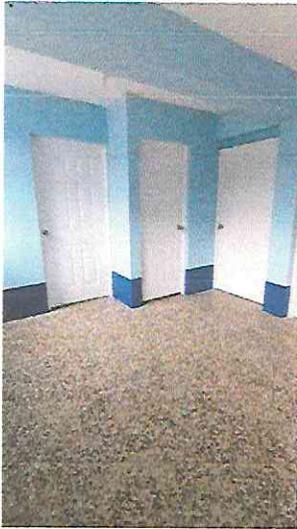


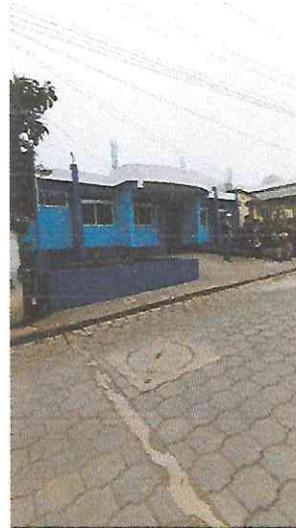

UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS



A LAS: 16:42 FIRMA:

SUPERVISION DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
MAYO 2022
INGENIERO CIVIL GUSTAVO ADOLFO VELÁSQUEZ JUÁREZ
COLEGIADO No. 18,186



San Pedro Sacatepéquez, 01 de julio de 2022

Doctor:

Juan Eliézer González González

Alcalde Municipal

Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

Departamento de San Marcos

Un gusto saludarlo, deseándole lo mejor al frente de tan digno cargo.

Adjunto en la presente encontrara el informe ejecutivo de los trabajos ejecutados durante el mes de junio del año 2022, supervisiones a los Proyectos en ejecución, una breve descripción y su Avance Físico, de los proyectos por cotización y licitación.

Sin otro particular

Atentamente


Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186
Ing. Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
Supervisor de Obras
Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN DE CANTON SAN LORENZO A CANTON OJO DE AGUA ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: “GONZALEZ”
- Durante el mes se continua trabajando el renglón de bordillos de concreto, cama de arena de asiento, adoquinado de tráfico pesado, llaves de confinamiento, rejilla y trabajos de protección del puente. Se le solicitaron los estudios de laboratorio al contratista.
- Fecha de inicio: 21-12-2021 Fecha de Finalización: 20-08-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 86.00 %** **CONTRATO No. 048-2021**


Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NAVIDAD CASERIO IXCA ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"EL PROGRESO"**
- Durante el mes se finalizaron las correcciones de instalación de tubería PVC Ø 8", relleno + compactación de zanja y limpieza final del proyecto.
- Fecha de inicio: 17-02-2022 Fecha de Finalización: 17-05-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % CONTRATO No. 003-2022**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18.186

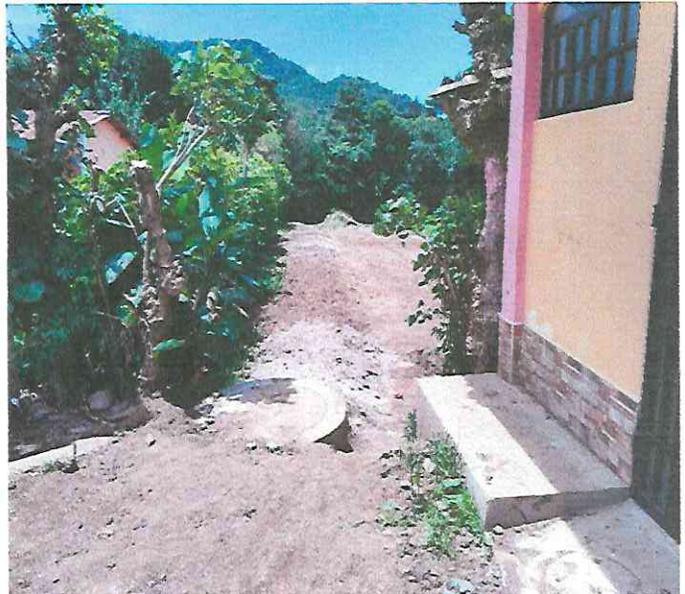

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA URBANA MIXTA CANTON EL MOSQUITO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CIFUENTES VELASQUEZ”**
- Durante el mes se finalizaron las correcciones al proyecto y limpieza final.
- Fecha de inicio: 12-04-2021 Fecha de Finalización: 18-03-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % CONTRATO No. 037-2020**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18.186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE (CONDUCCION) CASERIO CIPRES GRANDE ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCOM"**
- Durante el mes se continua trabajando la línea de conducción de tubo hg y pvc Ø 2" y se continua con los trabajos de la construcción del tanque de 60.00 m3. Se solicitaron los estudios de laboratorio al contratista.
- Fecha de inicio: 06-04-2022 Fecha de Finalización: 03-09-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 63.00 % CONTRATO No. 008-2022**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CIFUENTES VELASQUEZ”**
- Durante el mes se continúa con el armado y la fundición de las cortinas de cámaras de sedimentación y se continúa el armado de la estructura de la cámara de sedimentación 3. Se solicitaron los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 12-04-2021 Fecha de Finalización: 12-10-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 78.00 % CONTRATO No. 033-2020**



Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18.18



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL (MODULOS 2 Y 3) MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: "ARCHILA"
- Durante el mes se trabajó con el levantado de muros de block, solera intermedia, columnas tipo C-1, C-2, C-3 y con su respectiva fundición. También se iniciaron los trabajos de armado de vigas. Se solicitaron los estudios de laboratorio al contratista.
- Fecha de inicio: 01-03-2021 Fecha de Finalización: 01-09-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 60.50 % CONTRATO No. 040-2020**




Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

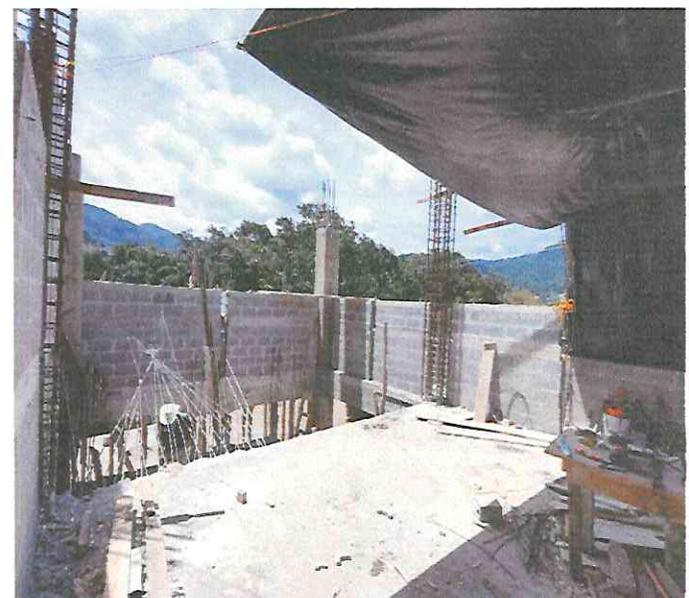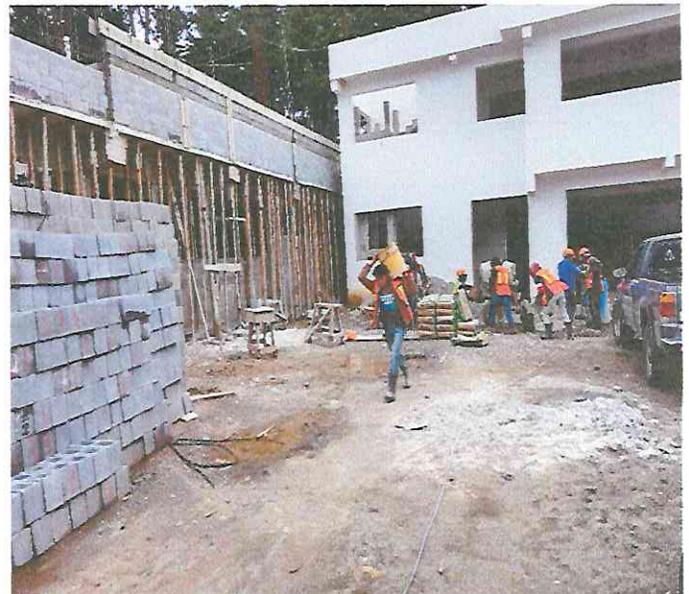

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE 20 DE ENERO, CASERIO EL BOQUERON, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: “RAMCO, SOCIEDAD ANONIMA”
- Durante el mes se realizaron correcciones al proyecto, debido al clima, hizo estragos al proyecto, por la cual se cambió nuevamente la base de material granular y limpieza a la rejilla.
- Fecha de inicio: 01-02-2022 Fecha de Finalización: 01-08-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 41.65 % CONTRATO No. 007-2022**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18.186

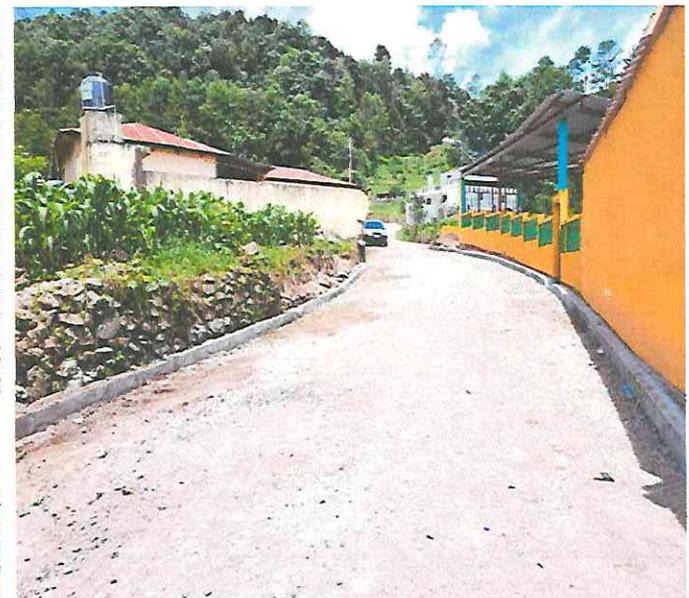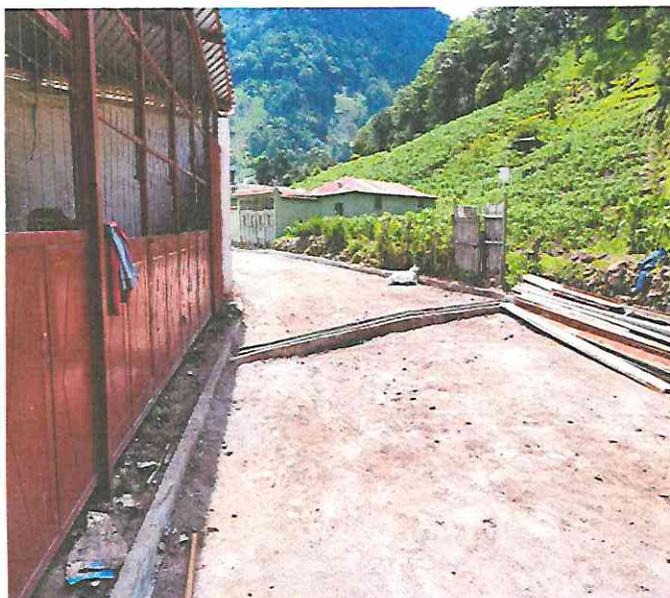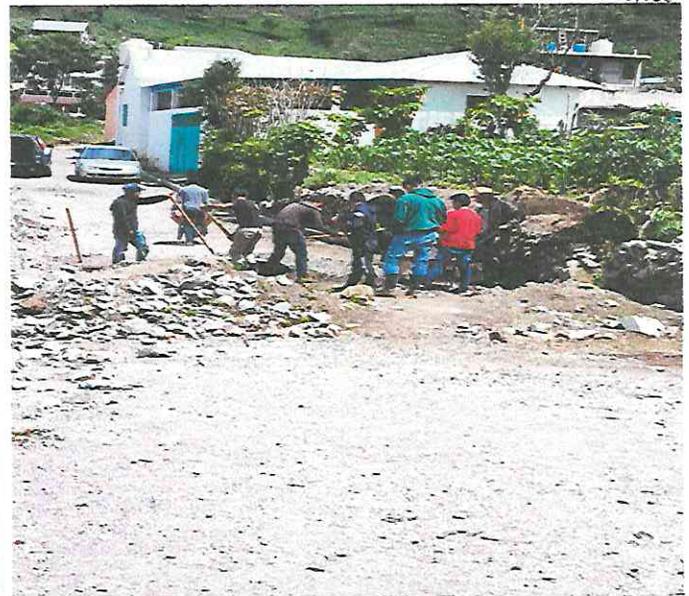

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. CALLE ZONA 5 ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: "G & G"
- Durante el mes se finalizaron las correcciones al proyecto y limpieza final.
- Fecha de inicio: 16-11-2021 Fecha de Finalización: 16-04-2022
- AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % CONTRATO No. 031-2021

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez.
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1 CANTON VISTA HERMOSA ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CONSTRUCCIONES PROGRESO”**
- Durante el mes se finalizaron las correcciones al proyecto y limpieza final.
- Fecha de inicio: 16-12-2021 Fecha de Finalización: 16-05-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % CONTRATO No. 041-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"C Y R INGENIERIA"**
- Durante el mes se trabajó con los renglones de levantado de paredes de block sisadas, solera intermedia, armado de columnas y fundición, también se inició el trabajo de armado de viga.
- Fecha de inicio: 26-11-2021 Fecha de Finalización: 26-08-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 47.50 % CONTRATO No. 045-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18.186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 6 ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: “CONSTRUCTORA EL PROGRESO”
- Durante el mes se trabajó con los renglones de trazo y replanteo, corte de cajuela (e=0.33m) y la conformación de Sub-rasante.
- Fecha de inicio: 08-11-2021 Fecha de Finalización: 08-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 14.10 % CONTRATO No. 044-2020**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18.186



PROYECTO SUSPENDIDO

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PALENCIA ALDEA SACUCHUM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCTORA EL PROGRESO"**
- Durante el mes se finalizaron las correcciones al proyecto y limpieza final.
- Fecha de inicio: 15-04-2021 Fecha de Finalización: 12-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % CONTRATO No. 026-2020**


Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No 18.188



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO CARRILAS DE CONCRETO 2A. CALLE ALDEA EL TABLERO SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: “**CONSTRUCTORA GONZALEZ**”
- Durante el mes se finalizaron los renglones de corte de cajuela, conformación de Sub-rasante, base de material granular, carrileras de concreto, bordillos laterales y empedrado.
- Fecha de inicio: 20-09-2021 Fecha de Finalización: 20-07-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 98.00 % CONTRATO No. 022-2021**


Guillermo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,188

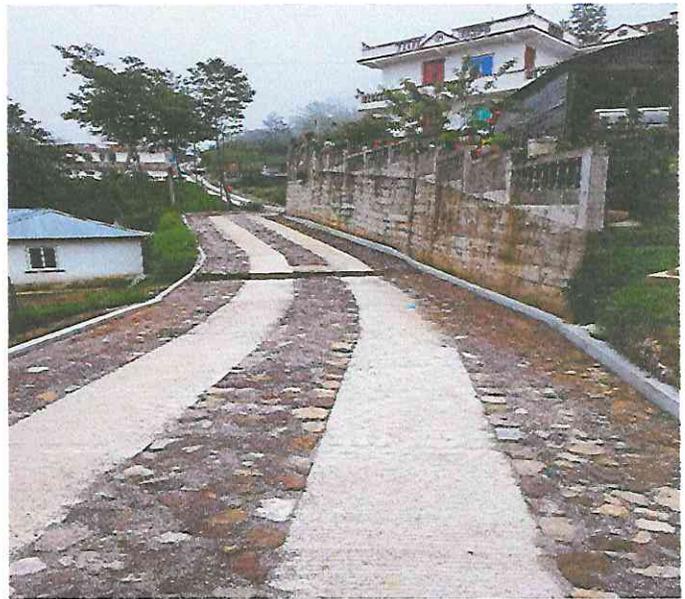

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO ORATORIO ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCTORA EARVECO"**
- Durante el mes se continúa trabajando el renglón de levantado de block, solera intermedia y su fundición. Se solicitaron los estudios de laboratorio al contratista.
- Fecha de inicio: 20-12-2021 Fecha de Finalización: 20-06-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 32.10 % CONTRATO No. 050-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

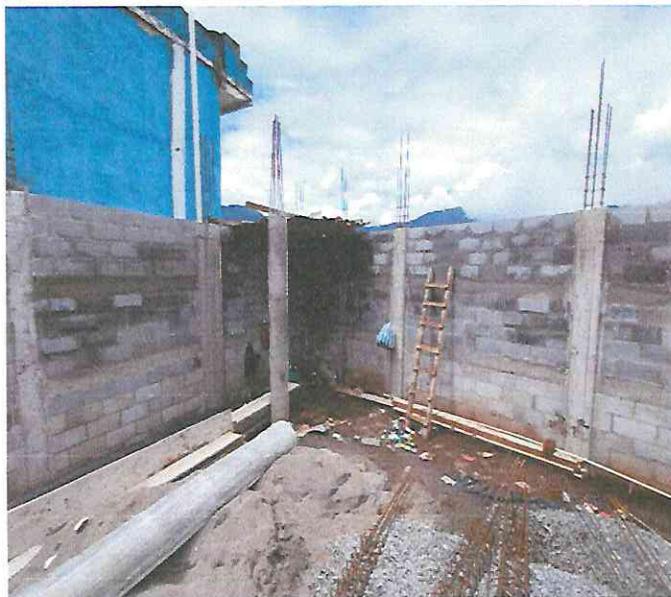

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ENTRADA ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CONSTRUCTORA DETALLES, ARTE EN ARQUITECTURA”**
- Durante el mes se finalizó los renglones llaves de remate, pintura para señalización, rotulo de identificación del proyecto y limpieza general.
- Fecha de inicio: 01-03-2022 Fecha de Finalización: 01-09-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 119.98 % CONTRATO No. 061-2021**


Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL 1A. CALLE A ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: “CONSTRUCTORA COINPRO”
- Durante el mes se finaliza la construcción del canal pluvial y el armado de la loseta de concreto para canal pluvial. también se iniciaron los trabajos de base de material granular y la construcción de caja con desarenador.
- Fecha de inicio: 14-02-2022 Fecha de Finalización: 14-08-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 33.00 %** **CONTRATO No. 065-2021**


Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

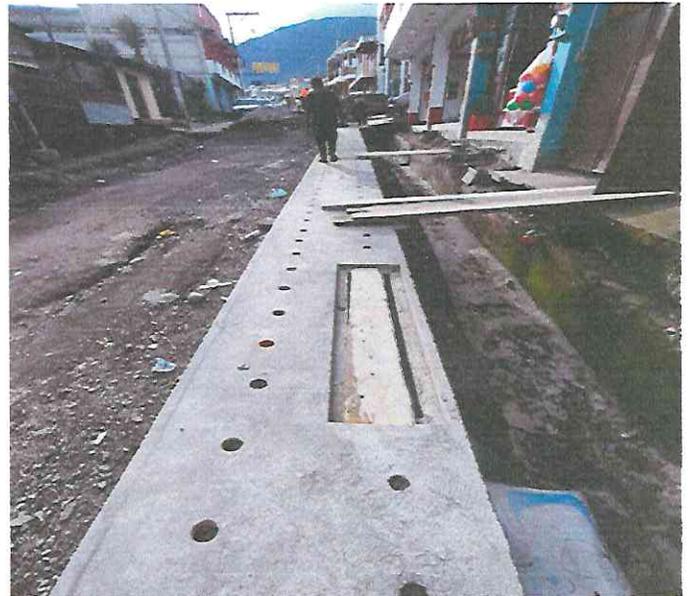

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL Y CANALETA TRAMO FINAL ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CONSTRUCTORA Y COMERCIAL AG”**
- Durante el mes se trabajó los renglones de módulo de gradas, masetones de concreto y fundición de losa, también en los acabados de la losa.
- Fecha de inicio: 10-03-2022 Fecha de Finalización: 08-07-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 90.00 % CONTRATO No. 006-2022**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

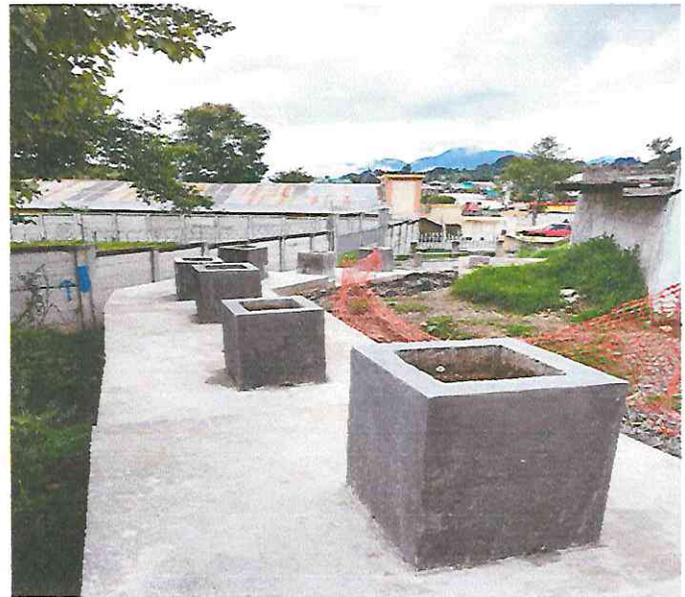

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 4 DE 3A. CALLE A ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: "IC&C INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION"
- Durante el mes se trabajó los renglones de preparación de la base, bordillos laterales, cama de arena de asiento, adoquinado tráfico pesado y llaves de confinamiento, también se hacer correcciones al proyecto.
- Fecha de inicio: 11-03-2022 Fecha de Finalización: 10-06-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 60.00 % CONTRATO No. 069-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

