



DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

RECIBIDO
31 MAY 2022

A LAS: 16:52 FIRMA: 

**SUPERVISION DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
MAYO 2022**

**UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
COLEGIADO No. 2,605**


UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605


SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto **CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI)**
CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: **CONSTRUCTORA JC 3**
- Fecha de inicio: 16-09-2021 Fecha de Finalización: 16-10-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 42.00% CONTRATO No. 026-2021**
- Se supervisó el armado de columnas C-Están colocando el refuerzo de las columnas C-1 en el tercer nivel, fundición de columnas C-2, se verifico levantado de block en el primer nivel, el block que están empleando es marca FACSA de sello rojo, También están armando soleras intermedias en los muros de block del primer nivel. Se supervisó armado de viga V-3 del tercer nivel, Se supervisó el muro de concreto armado donde se anclará la máquina de rayos X en el primer nivel, este muro cuenta con refuerzo de acero No 3 a cada 20 cm en ambos sentidos y es de 12 cm de espesor, se fundió la losa del módulo pequeño al lado norte de la construcción.
- Fecha de inicio: 16-09-2021 Fecha de Finalización: 16-10-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 35.09 % CONTRATO No. 026-2021**

UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605

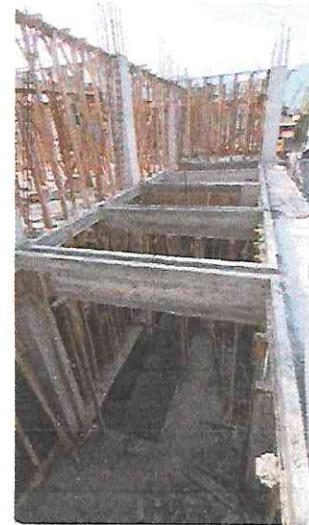

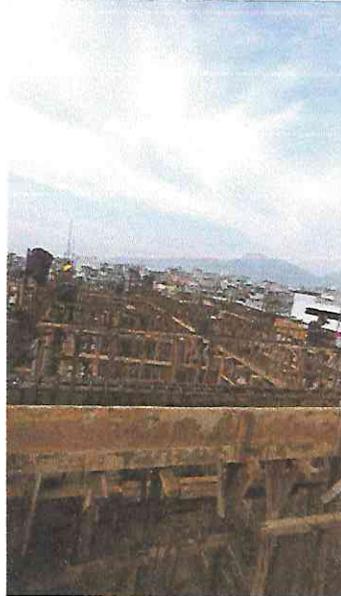

Proyecto:

**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 4A. AVENIDA A ZONA 1
CANTON SAN AGUSTIN TONALA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**


- Constructora: CONSTRUCTORA GONZALEZ
- En supervisión realizada en fecha 06 de mayo se realizaron pruebas de densidad en la compactación de la base de material selecto en área de cancha las densidades están en los rangos óptimos mismos que se compartirán en reporte, se están realizando trabajos en muro de contención pineado en área de parqueo se está realizando zanjeo para cimentación y se continua instalando tubos y malla en áreas perimetrales y área de cancha.

(El proyecto actualmente se encuentra suspendido desde el 27-01-2022)

- Fecha de inicio: 13/04/2021 Fecha de Finalización: 13/10/2021
Se solicito ampliación por 6 meses Tiempo contractual modificado 13/04/2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA 60.00% CONTRATO No. 035-2,020**

UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ

ARQUITECTO
Colegado N. 2605


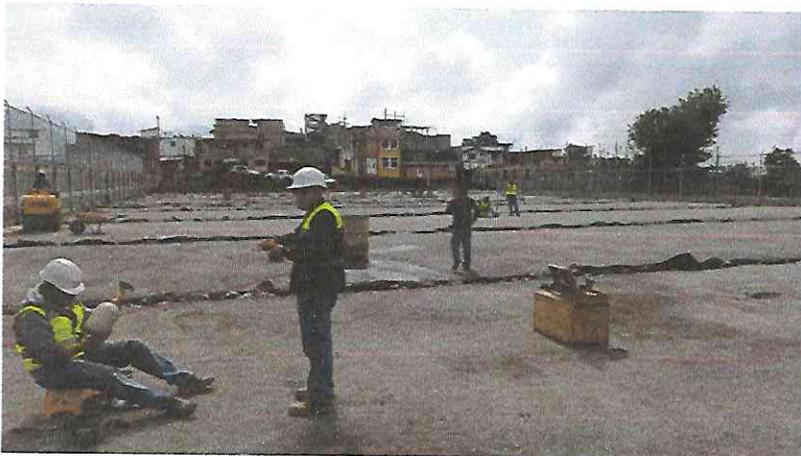


Proyecto:

**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 5A. AVENIDA ENTRE 7A. CALLE A PUENTE
PEATONAL ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**

- Constructora: CONSTRUCTORA EL PROGRESO
- En visita realizada en fechas 05, 09, 17, 23 de mayo se superviso construcción de bordillos, preparación de la base, instalación de adoquines y fundición de llaves de confinamiento.
- Fecha de inicio: 17/01/2022 Fecha de Finalización: 17/04/2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 74.74% CONTRATO No. 056-2021**

LUWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605

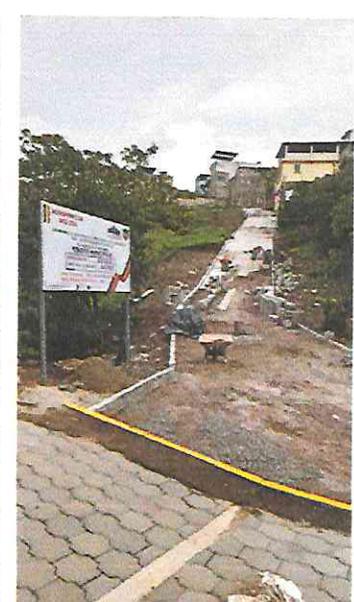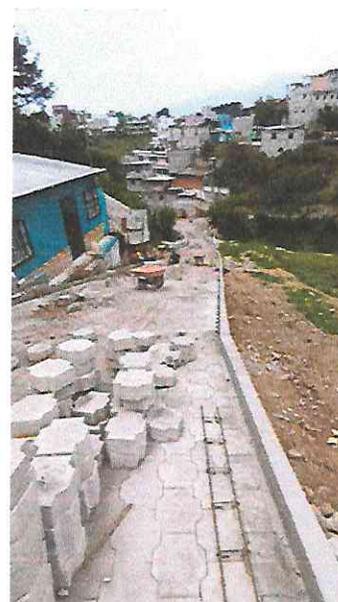

Proyecto:

**MEJORAMIENTO MERCADO PISO DE PLAZA, 5A. CALLE ENTRE 9 Y 10 AVENIDA ZONA 1,
CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.**

- Constructora: **“IC&C INGENIERÍA CIVIL Y CONSTRUCCIÓN”**
- En supervisión realizada en fecha 27 de mayo se visito el taller de estructuras metálicas en el cual se están fabricando los módulos individuales de estructura de plaza con el acompañamiento Arq. Perla Rivera se verifico que se tienen fabricados 100 módulos los cuales se trasladaron a bodega de la empresa constructora para su almacenamientos previo a entrega final
- Fecha de inicio: 07/02/2022 Fecha de Finalización: 07/05/2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00% CONTRATO No. 072-2021**

LWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605



Proyecto:

MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 9A. CALLE B ENTRE 4A. Y 5A. AVENIDA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.

- Constructora: **DETALLES, ARTE EN ARQUITECTURA**
- Se realizo supervisión en fecha 13 de mayo, se están realizando trabajos de fundición de muro de contención ciclópeo la primera fase se lleva avance significativo ya que toda la excavación se realizo a mano y ha dificultado la construcción del mismo por su complejidad, aun se encuentran los vecinos y COCODE realizando trabajos de mejoramiento del sistema de agua potable y drenaje, se continuaran trabajos de construcción de muro 1 en fase 2

• Fecha de inicio: 02-03-2022 Fecha de Finalización: 02-09-2022

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 20.27% CONTRATO No. 059-2,021

LUWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605




ADMINISTRACION 2020-2024

MUNI SAN PEDRO
INSPIRANDO NUEVOS CAMINOS

MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 9A. CALLE B ENTRE 4A. Y 5A. AVENIDA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.
Procedencia Del Financiamiento
FONDOS MUNICIPALES

APORTE MUNICIPAL:	Q363, 700.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO:	Q363, 700.00

EMPRESA EJECUTORA: **DETALLES** CONSTRUCCION Y OBRAS DE INGENIERIA

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: **6 MESES CALENDARIO**

PRINCIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS (022) 77601215 (022) 77604030 www.munispedro.gob.gt




Proyecto:

MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1B DE 2A. CALLE ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.

- Constructora: **CONSTRUCTORA CODIPA**
- Se realizo supervisión en fecha 03 Y 18 de mayo el proyecto ya se concluyeron trabajos en construcción de bordillos, se verifico conformación de base, base de arena, colocación de adoquín, fundición de llaves de confinamiento, losa de remate y reacondicionamiento de brocal, se realizo recorrido final, medición, cuantificación según renglones contratados.
- Fecha de inicio: 03-03-2022 Fecha de Finalización: 03-06-2022

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % CONTRATO No. 071-2,021



UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605

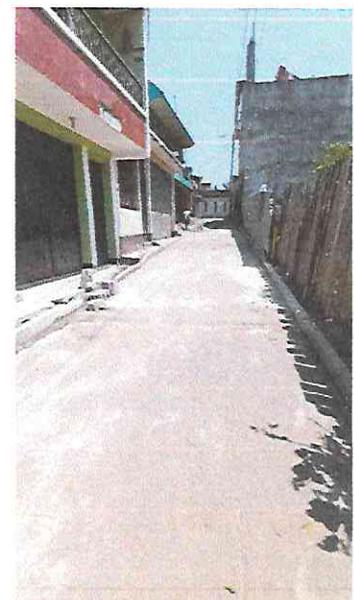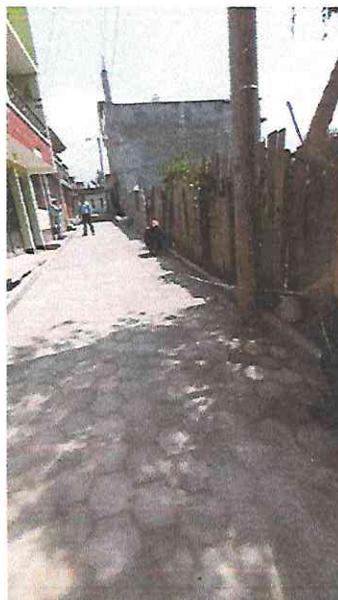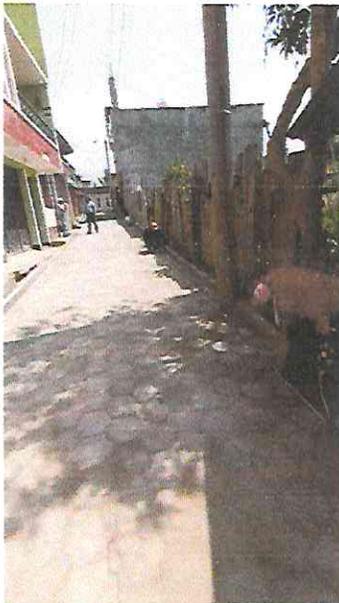

Proyecto:

MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE III) ACCESO 3 DE 2A. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: **CONSTRUCTORA y COMERCIAL SEDIPRO**
- Se realizo supervisión en fecha 03 Y 16 de mayo se verifico que el muro de contención se encuentra construido en su totalidad, se han realizado trabajos de corte de cajuela y preparación de la base.
- Fecha de inicio: **02-03-2022** Fecha de Finalización: **02-06-2022**
AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 72.39 % CONTRATO No. 005-2022

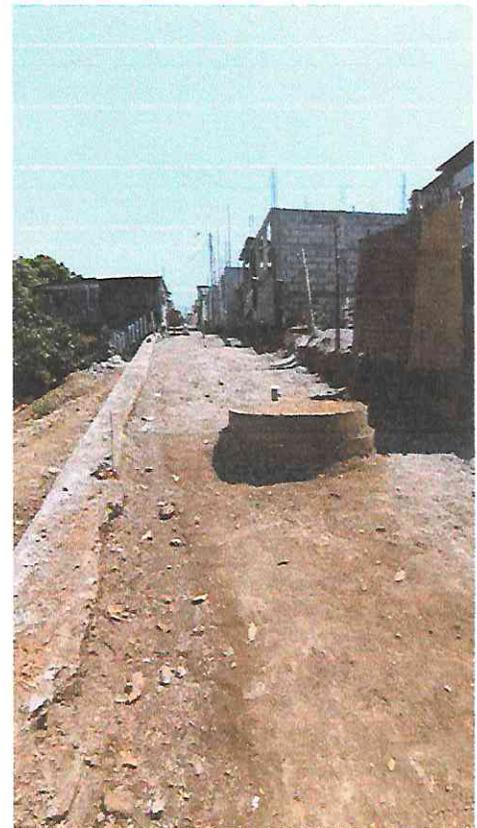
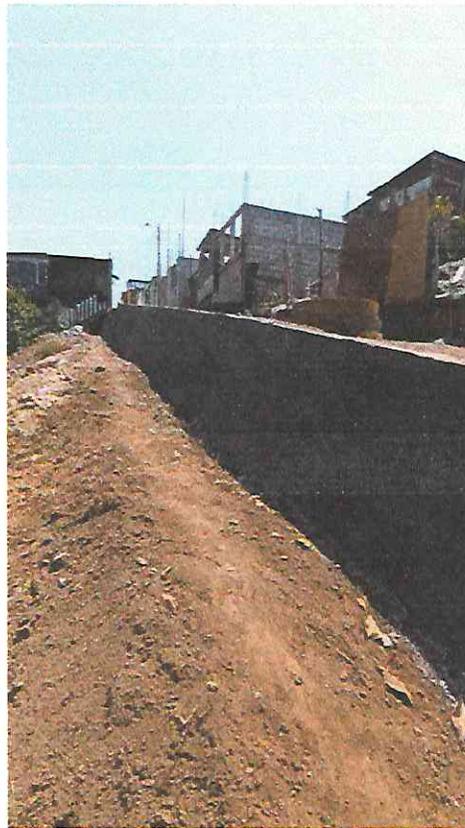


LUWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605

Proyecto:

**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE III) 8A. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**

- Constructora: **INGENIERIA Y CONSTRUCTORA EMANUEL**
- El proyecto se suspendió según Acuerdo de la Alcaldía Municipal No. 015-2,022 en fecha 01 de marzo, la suspensión inicio a partir del 17 de febrero 2022 y se levanto suspensión según Acuerdo de la Alcaldía Municipal No. 037-2022 en fecha 06 de mayo 2022 y el tiempo transcurre a partir del 04 de mayo. Por lo que se realizo supervisión en fecha 10 de mayo y se cuenta con trabajos de construcción de bordillo, preparación de la base y colocación de adoquín. (76 días de suspensión)
- Fecha de inicio: 06-12-2021 Fecha de Finalización: 06-04-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 60.02% CONTRATO No. 037-2021**

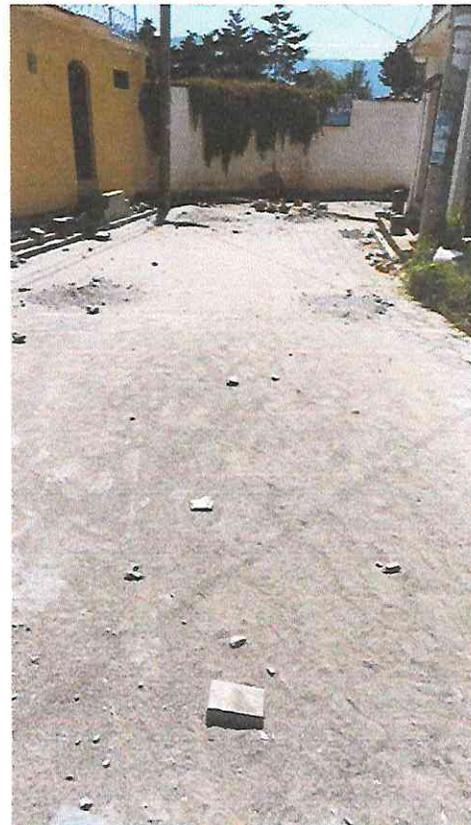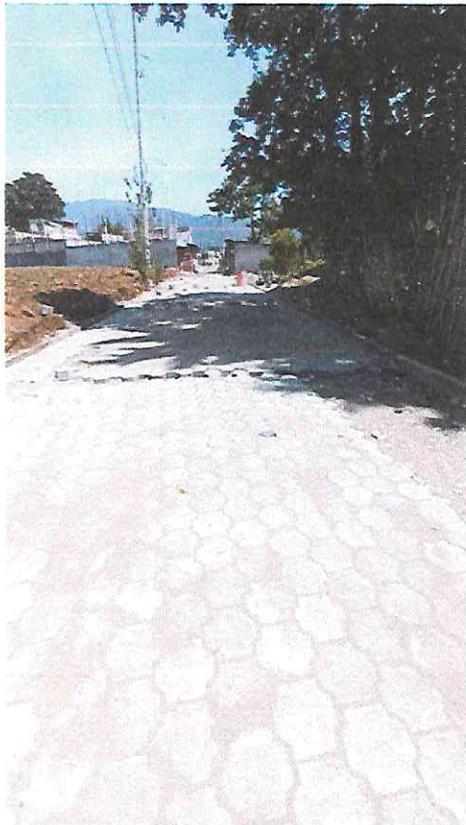

LWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605





Proyecto:

**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE QUE CONDUCE A CEMENTERIO CASERIO
LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**

- Constructora: **FERRCONS BALCARCEL**
- Se realizo supervisión en fecha 11 de mayo atendiendo la solicitud del propietario de la empresa en donde indica que fueron realizadas las reparaciones indicadas en última visita y complemento de áreas faltantes se verifico con el presidente de COCODE y se realizo satisfactoriamente la recepción de los trabajos.
- Fecha de inicio: 08-11-2021 Fecha de Finalización: 23-02-2022

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % CONTRATO No. 036-2,021

JWE ANTONIO MIRANDA VASQUI
ARQUITECTO
Colegado N. 2605

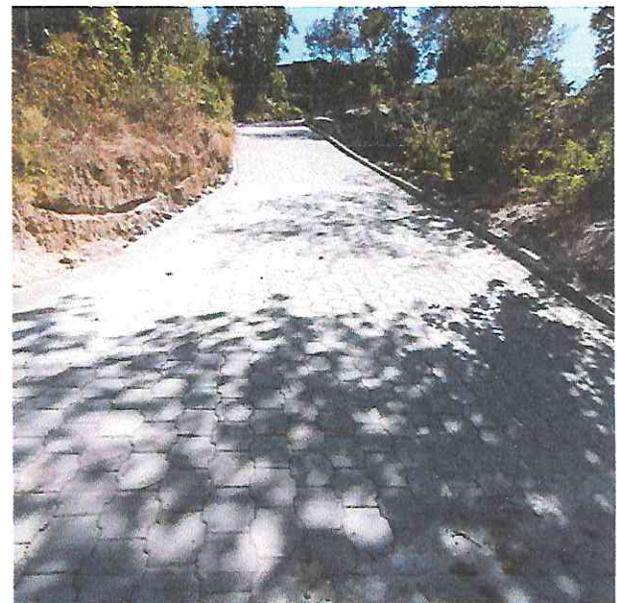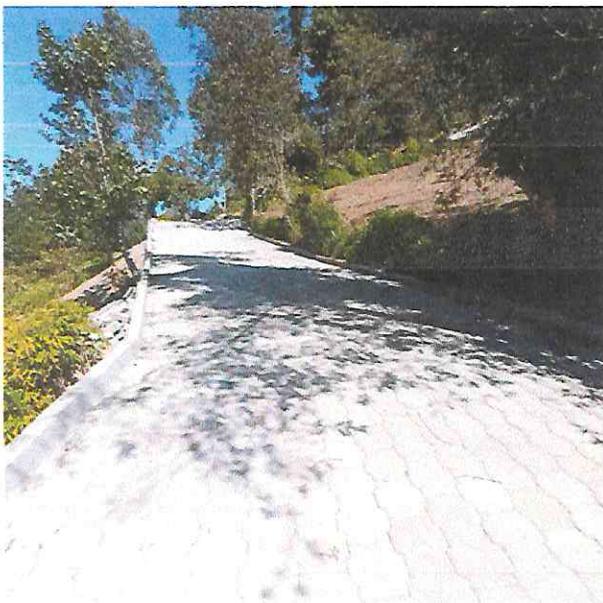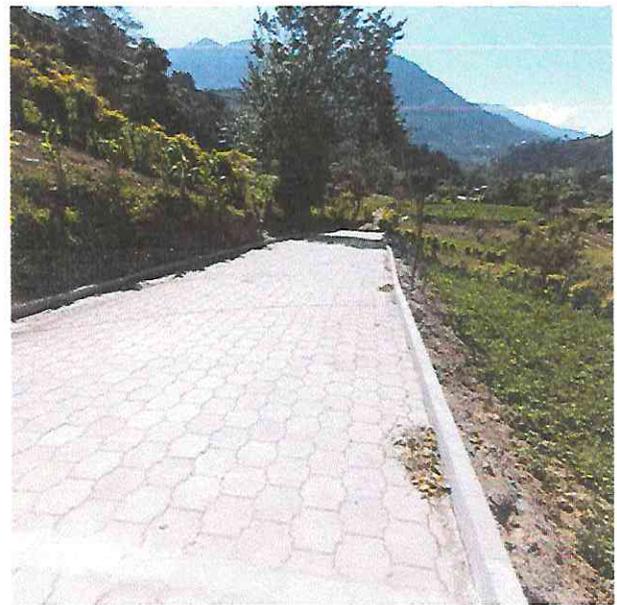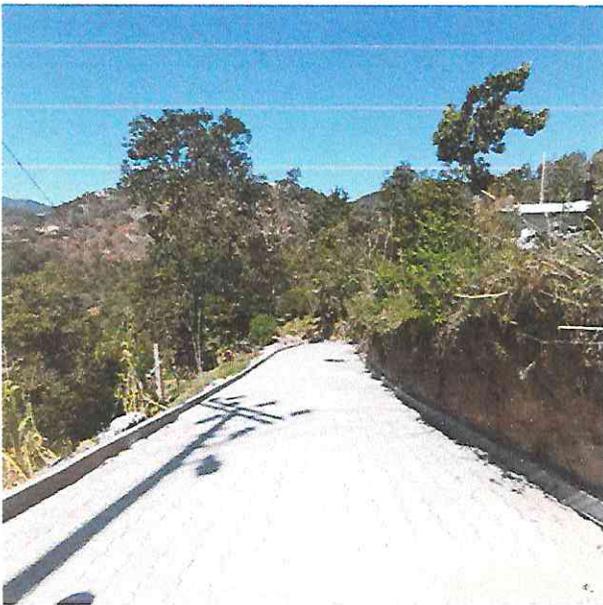

Proyecto:


AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR PIEDRA LISA CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: **DETALLES, ARTE EN ARQUITECTURA**
- Se realizo supervisión en fecha 13 de mayo 2022, los trabajos que se están efectuando son: Se termino de hacer levantado de muro y actualmente se está armando estructura para conformar mojinete, ya se tiene embutidas instalaciones eléctricas en muros, se realizo medida de áreas con superintendente para verificar cantidades por renglones según lo contratado.
- Inicio: 25-02-2022 Fecha de Finalización: 25-07-2022

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 37.63 %

CONTRATO No. 002-2022

LUWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605

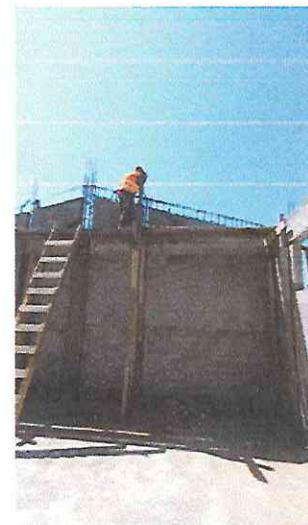




Proyecto:

CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CANTON LOS LOPEZ ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: **CONSTRUCTORA Y COMERCIAL AG**
- Se realizo supervisión con fecha 12 de mayo se están realizando trabajos de acabados (Repello+Cernido en losas) acabado en muros de block sisado se aplica cernido en columnas, vigas y soleras esto se realiza con la utilización de monocapa color blanco, se cuenta ya con la instalación de biodigestor
- Fecha de inicio: 28-12-2021 Fecha de Finalización: 28-04-2022
Tiempo contractual modificado: 30-06-2022
AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 73.97 %

UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605

CONTRATO No. 057-2,021

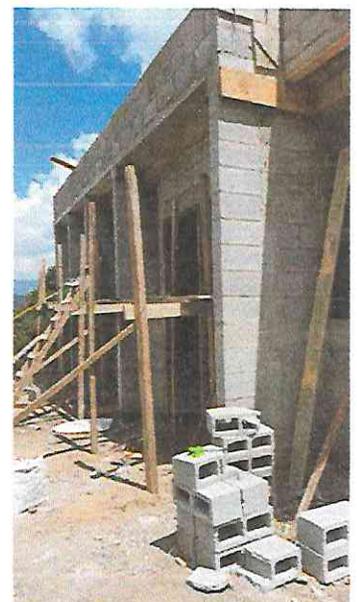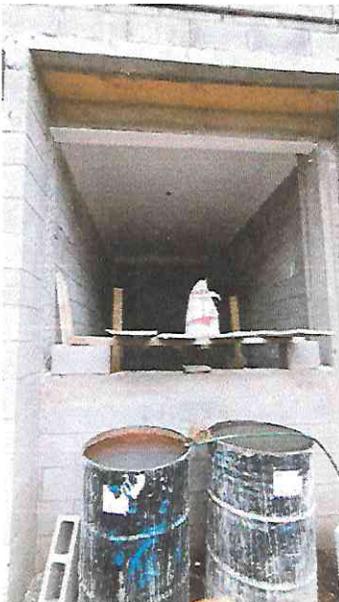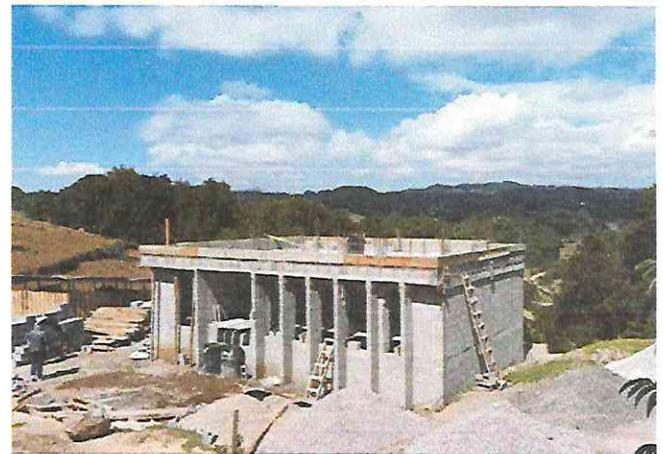

Proyecto:

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DISTRIBUCION) CASERIO LA CUCHILLA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS



- Constructora: **CONSTRUCTORA CODIPA**
- Se realizó Supervisión en fecha 10 de mayo, se hizo recorrido con superintendente de proyecto por las áreas en las que pasará la línea de conducción actualmente se están realizando trabajos de zanqueo, colocación de tubería de varios diámetros.

- Fecha de inicio: 07-03-2022 Fecha de Finalización: 07-06-2022

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 90.13% CONTRATO No. 042-2,021

LUWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ


ARQUITECTO
Colegado N. 2605

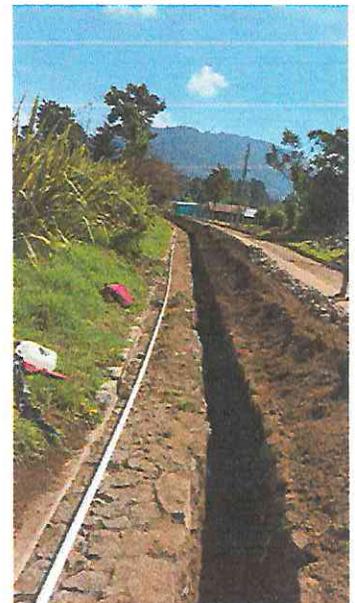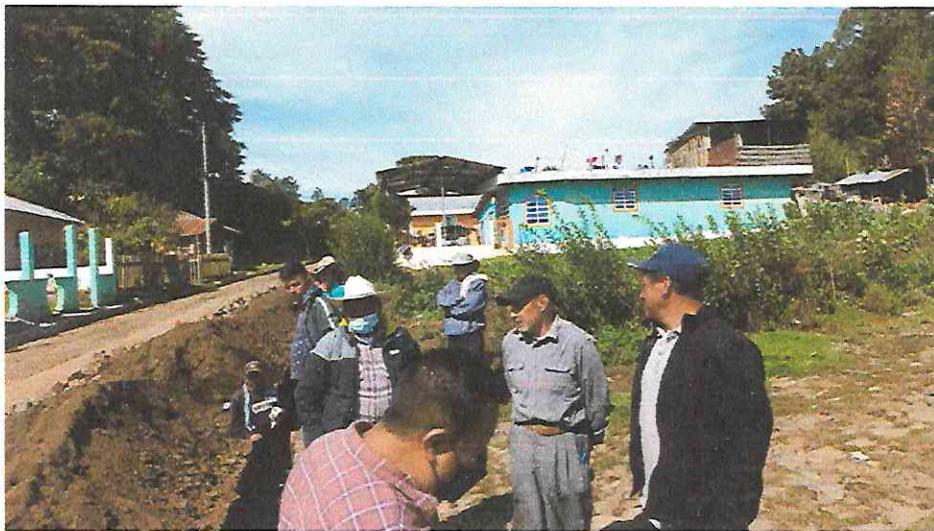

Proyecto:

**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS PIEDRECITAS,
ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE
SAN MARCOS**

- Constructora: **CONSTRUCTORA G&G**
- Se realizo visita técnica en fecha 27 de mayo 2022, para verificar el avance físico, actualmente se están realizando trabajos de montaje de formaleta, Se verificaron niveles y superficie de formaleta, armado de estructura de losa.
- Fecha de inicio: 28-12-2021 Fecha de Finalización: 28-04-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 70.00 % CONTRATO No. 053-2,021**

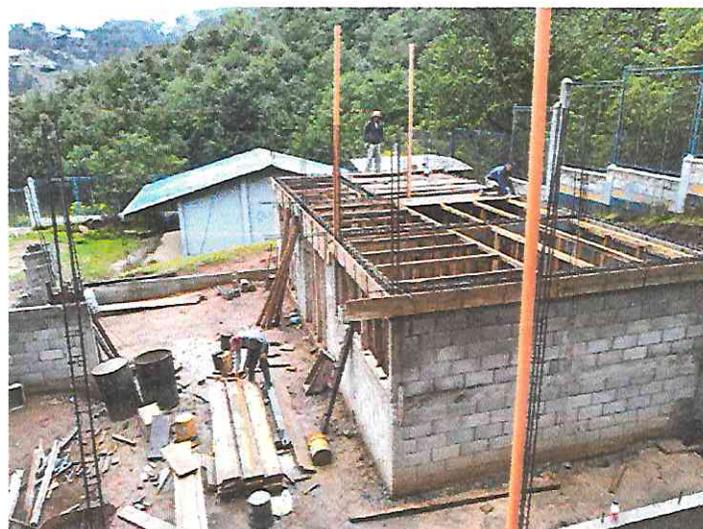

UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605




Proyecto:

MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO ENTRE CENTRO Y CASERIO SAN RAFAEL, ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: IC&C INGENIERÍA CIVIL Y CONSTRUCCIÓN
- Se realizo Supervisión en fechas 04 y 27 de mayo, se observo que se continúo con la fundición de carrileras, bordillos laterales y se continúo con el empedrado en las áreas que ya cuentan con carrileras.

• Fecha de inicio: 21-02-2022 Fecha de Finalización: 21-06-2022
AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 80.00% CONTRATO No. 051-2,021



UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605

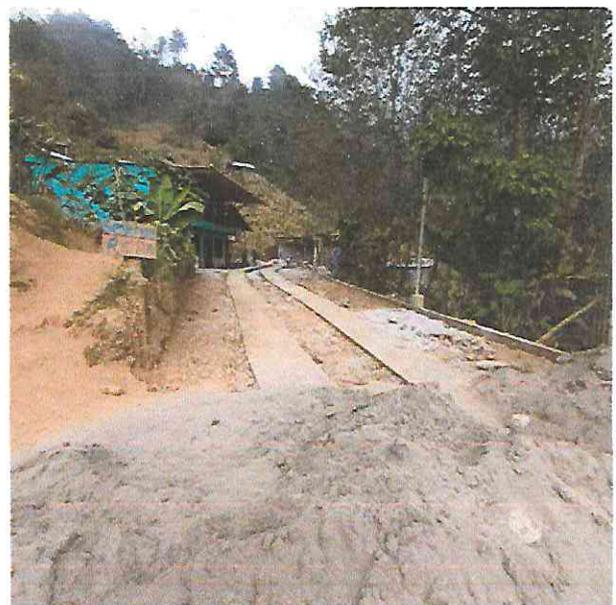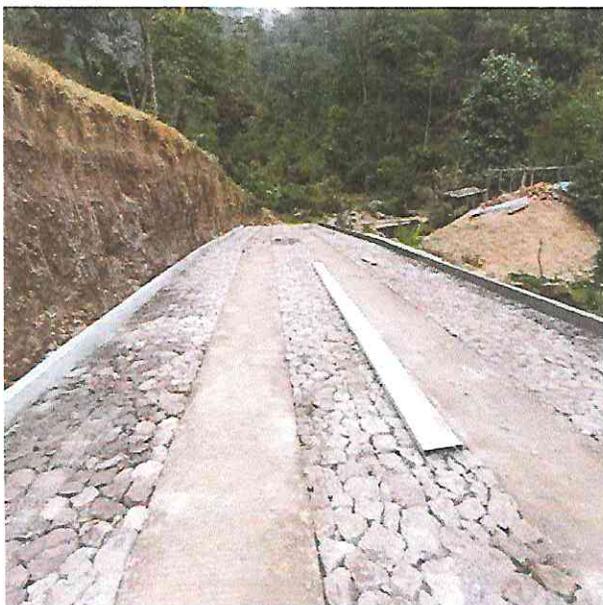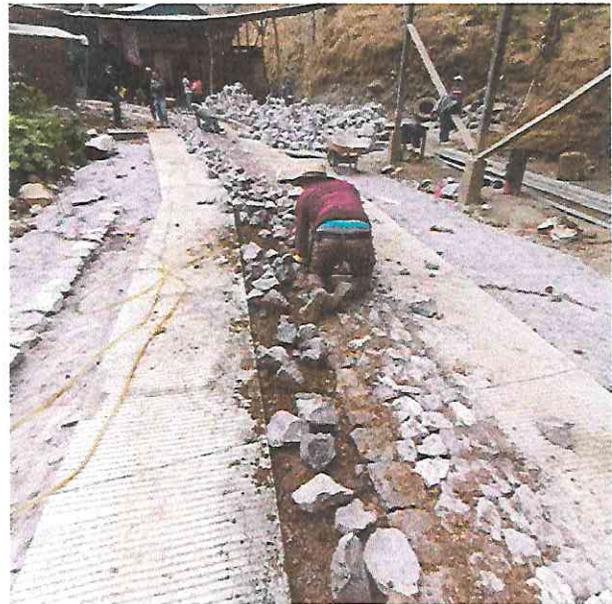

Proyecto:

MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR NUEVA JERUSALEN ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: “CONSTRUCTORA AMERICANA, KRCC”
- En fecha viernes 30 de abril se realizo recorrido final y verificación, cuantificación y medición de áreas según renglones contratados, se conto con acompañamiento de miembros de COCODE, Comité pro mejoramiento de calle, vecinos y personal de la empresa constructora. En fecha 17 de mayo se entrego expediente completo y revisado para solicitar Junta receptora.
- Fecha de inicio: 22-12-2021 Fecha de Finalización: 22-04-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00% CONTRATO No. 054-2,021**

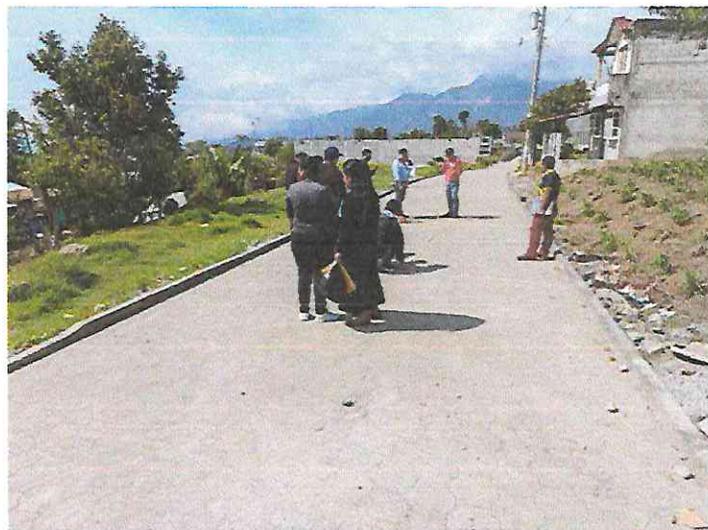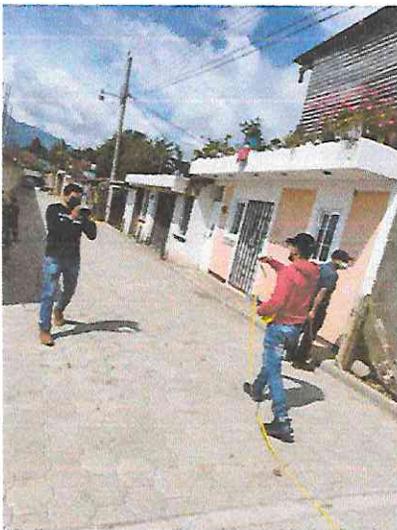

UWE ANTONIO MIRANDA VÁSQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605

Proyecto:

**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ENTRADA SECTOR LOS RAMOS SANTA RITA II
ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.**

- Constructora: **CONSTRUCTORA JC 3**
- Se realizo primera Supervisión en fecha 25 de mayo, para verificar el avance físico se tienen realizados trabajos de conformación de base, actualmente se están realizando trabajos de construcción de bordillo se verificaron medidas de 0.40 x 0.10m.
- Fecha de inicio: 15-02-2022 Fecha de Finalización: 15-06-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 38.34% CONTRATO No. 019-2021**

UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605




Proyecto:

MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: **CONSTRUCTORA EARVECO**
- Se realizo supervisión en fecha 13 de mayo 2022, se verifico que los trabajos que se están realizando estén conforme a lo contratado y planos, se observa que los acabados en muros están terminados, actualmente se encuentran realizando instalación de azulejos y piso de granito color gris.
- Fecha de inicio: 22/11/2021 Fecha de Finalización: 22/05/2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 84.22% CONTRATO No. 032-2,021**

LUIS ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605


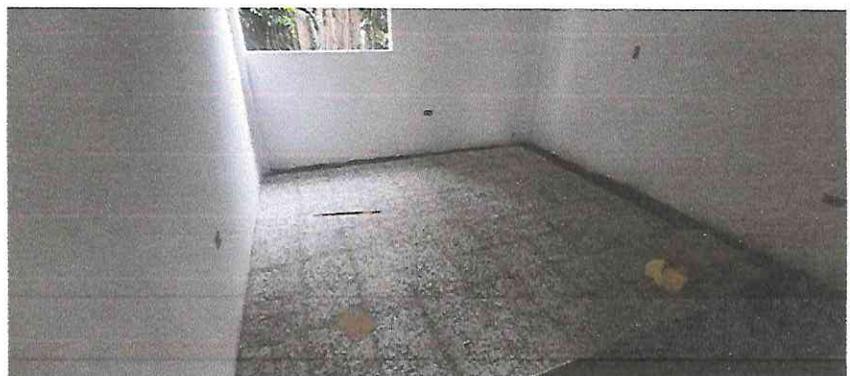



Proyecto:

MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO AGUA TIBIA AREA ECOLOGICA ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: **CONSTRUCTORA EARVECO**
- Se realizo supervisión en fecha 12 de mayo 2022, a solicitud del contratista se realizo el respectivo recorrido para realizar la recepción final previo a solicitar comisión receptora, se verifico que las observaciones realizadas se hayan realizado por lo que el proyecto esta concluido satisfactoriamente.
- Fecha de inicio: 10/09/2021 Fecha de Finalización: 10/02/2022
- Tiempo contractual modificado 10/03/2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00% CONTRATO No. 011-2021**

LUWE ANTONIO MIRANDA VÁSQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605

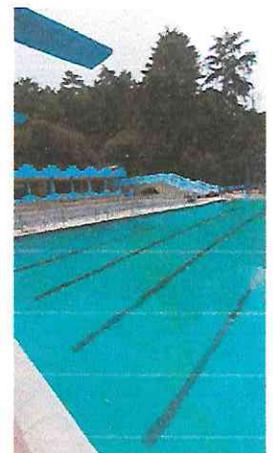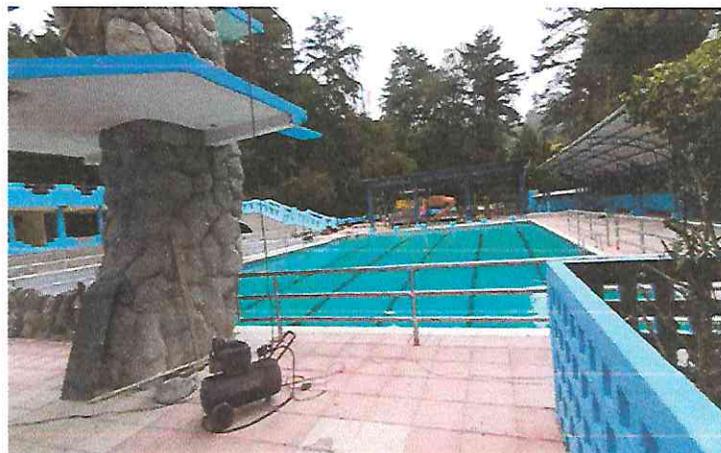

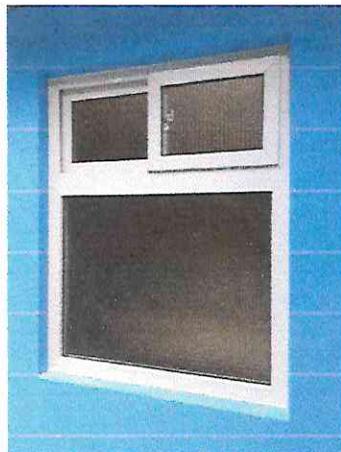



SUPERVISION DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
MAYO 2022
INGENIERO CIVIL GUSTAVO ADOLFO VELÁSQUEZ JUÁREZ
COLEGIADO No. 18,186





San Pedro Sacatepéquez, 01 de junio de 2022

Doctor:

Juan Eliézer González González

Alcalde Municipal

Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

Departamento de San Marcos

Un gusto saludarlo, deseándole lo mejor al frente de tan digno cargo.

Adjunto en la presente encontrara el informe ejecutivo de los trabajos ejecutados durante el mes de mayo del año 2022, supervisiones a los Proyectos en ejecución, una breve descripción y su Avance Físico, de los proyectos por cotización y licitación.

Sin otro particular

Atentamente

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

Ing. Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
Supervisor de Obras
Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN DE CANTON SAN LORENZO A CANTON OJO DE AGUA ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: “GONZALEZ”
- Durante el mes se trabajó los renglones de bordillos de concreto, cama de arena de asiento, adoquinado de tráfico pesado, llaves de confinamiento, rejilla, losa de concreto, columnas de pasamanos y trabajos de protección. Se le solicitaron los estudios de laboratorio al contratista.
- Fecha de inicio: 21-12-2021 Fecha de Finalización: 20-08-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 75.00 %** **CONTRATO No. 048-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: “AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NAVIDAD CASERIO IXCA ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: “EL PROGRESO”
- Durante el mes se continua con la instalación de tubería PVC Ø 6” e instalación de tubería PVC Ø 8”, el relleno + compactación de zanja, la construcción de pozos de visita y cajas muertas.
- Fecha de inicio: 17-02-2022 Fecha de Finalización: 17-05-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 86.00 % CONTRATO No. 003-2022**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18.186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA URBANA MIXTA CANTON EL MOSQUITO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: "CIFUENTES VELASQUEZ"
- Durante el mes se realizan correcciones al proyecto y limpieza final.
- Fecha de inicio: 12-04-2021 Fecha de Finalización: 18-03-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 99.71 % CONTRATO No. 037-2020**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE (CONDUCCION) CASERIO CIPRES GRANDE ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: "CONSTRUCOM"
- Durante el mes se trabajó la captación típica, solera final, losa, repello + cernido en paredes de la caseta, línea de conducción tubo hg y pvc Ø 2" y la se iniciaron los trabajos de la construcción del tanque de 60.00 m3. Se solicitaron los estudios de laboratorio al contratista.
- Fecha de inicio: 06-04-2022 Fecha de Finalización: 03-09-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 20.10 % CONTRATO No. 008-2022**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: "CIFUENTES VELASQUEZ"
- Durante el mes se continúa con el armado de las vigas tipo 1 de cámaras de sedimentación, también se fundió la losa de una cámara de sedimentación y se continúa el armado de la estructura de la cámara de sedimentación 3. Se solicitaron los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 12-04-2021 Fecha de Finalización: 12-10-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 77.00 % CONTRATO No. 033-2020**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez,
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL (MODULOS 2 Y 3) MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“ARCHILA”**
- Durante el mes se finalizaron los trabajos de armado de vigas, solera corona y el armado de losa y se fundió la losa de concreto. Se solicitaron los estudios de laboratorio al contratista.
- Fecha de inicio: 01-03-2021 Fecha de Finalización: 01-09-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 52.00 % CONTRATO No. 040-2020**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18.186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE 20 DE ENERO, CASERIO EL BOQUERON, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: “RAMCO, SOCIEDAD ANONIMA”
- Durante el mes se finalizaron los trabajos de bordillos laterales y también se trabajó con el renglón de rejilla. Se solicitaron los estudios de laboratorio al contratista.
- Fecha de inicio: 01-02-2022 Fecha de Finalización: 01-08-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 41.50 % CONTRATO No. 007-2022**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. CALLE ZONA 5 ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: "G & G"
- Durante el mes se realizan correcciones al proyecto y limpieza final.
- Fecha de inicio: 16-11-2021 Fecha de Finalización: 16-04-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 99.80 %** **CONTRATO No. 031-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juar.
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18.188



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1 CANTON VISTA HERMOSA ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: "CONSTRUCCIONES PROGRESO"
- Durante el mes se continúa trabajando con los renglones de cama de arena de asiento, adoquín de tráfico pesado y llaves de confinamiento y se hacen correcciones al proyecto.
- Fecha de inicio: 16-12-2021 Fecha de Finalización: 16-05-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 87.50 %** **CONTRATO No. 041-2021**



Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO ENTRADA CASERIO SANTA TERESA ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: “CONSTRUCCIONES PROGRESO”
- Durante el mes se finalizaron los trabajos de empedrado + estucado, loseta de remate y limpieza general.
- Fecha de inicio: 02-12-2021 Fecha de Finalización: 02-05-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % CONTRATO No. 038-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

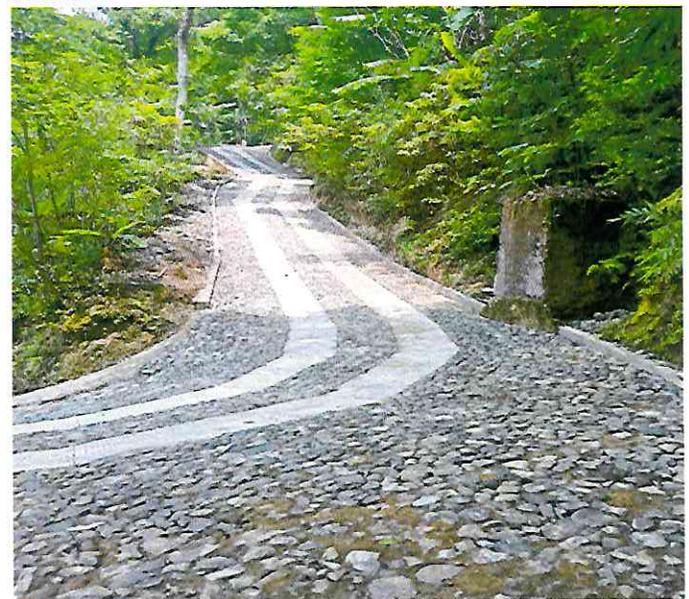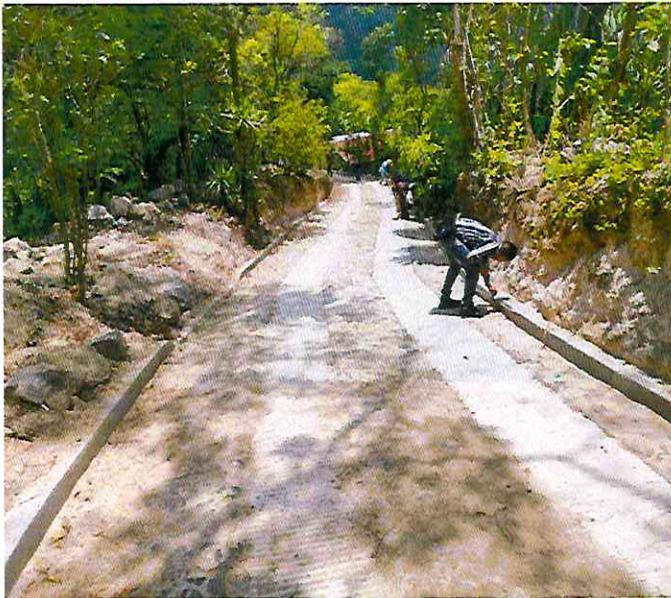

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: “MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA APARICIO MERIDA MORALES CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: “MEGA-CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE”
- Durante el mes se finalizaron las correcciones al proyecto y limpieza general.
- Fecha de inicio: 26-11-2021 Fecha de Finalización: 26-03-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % CONTRATO No. 040-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1 DE 2A. AVENIDA A ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCTORA INGENIERIA PARA PROYECTOS CIVILES"**
- Durante el mes se finalizaron los renglones de pintura amarilla en bordillos, pintura blanca paso de cebra en ingreso de callejón, rejilla metálica para caja de agua pluvial y limpieza final.
- Fecha de inicio: 07-02-2022 Fecha de Finalización: 07-05-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % CONTRATO No. 060-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“C Y R INGENIERIA”**
- Durante el mes se trabajó con los renglones de levantado de paredes de block sisadas, solera intermedia, armado de losa y la fundición de losa. Se solicitaron los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 26-11-2021 Fecha de Finalización: 26-08-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 38.50 % CONTRATO No. 045-2021**


Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18.186





SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CALLEJON 1 DE 2A. AVENIDA ZONA 4, CANTON TONALA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR”**
- Durante el mes se trabajó los renglones de base de material granular, bordillo, capa de asiento, carpeta de adoquín, llaves de confinamiento, loseta de remate, rotulo de identificación y limpieza final.
- Fecha de inicio: 14-12-2021 Fecha de Finalización: 04-06-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % CONTRATO No. 044-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

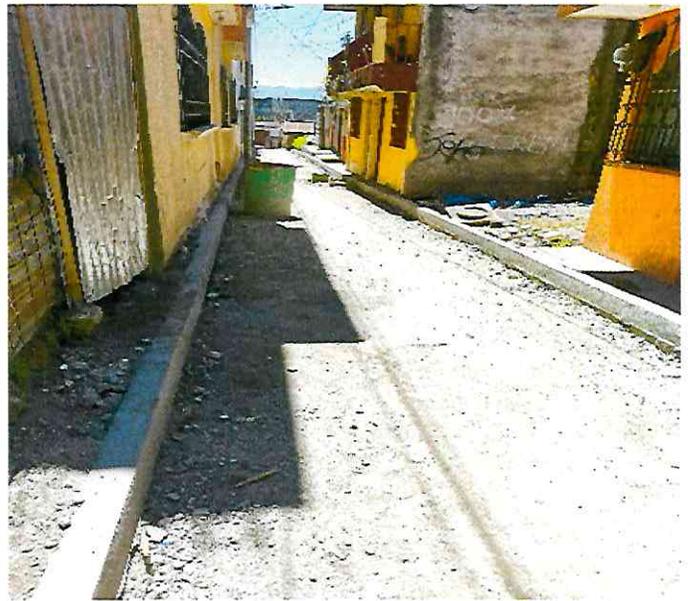

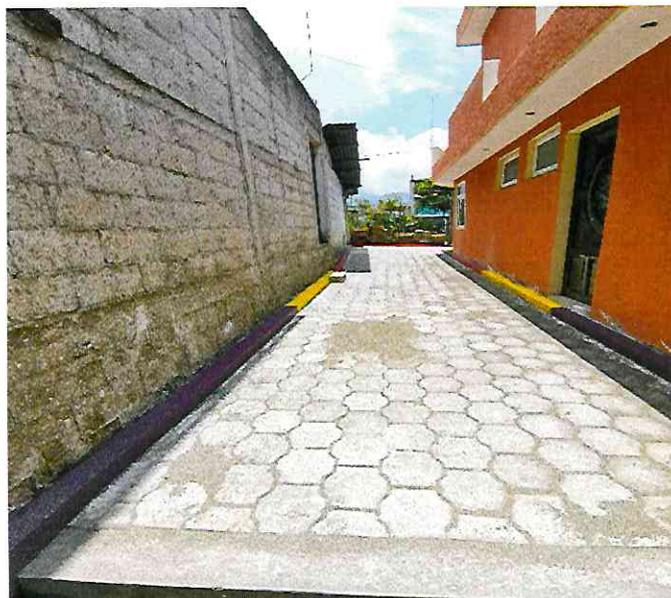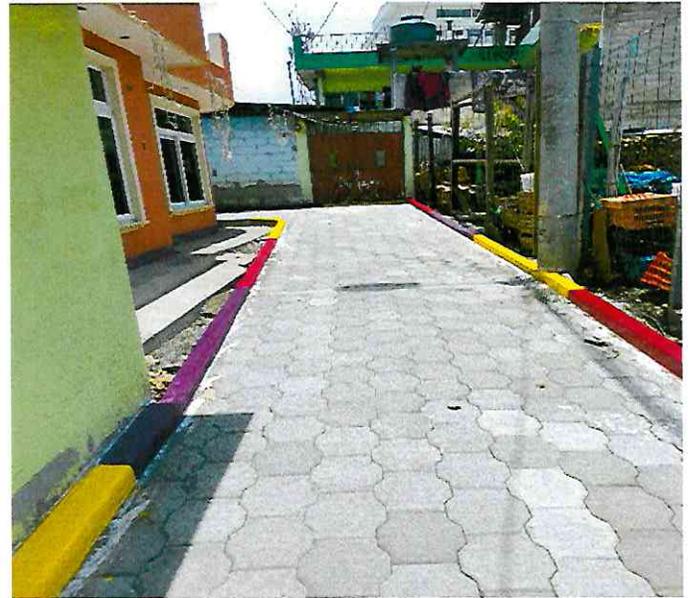

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 6 ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: "CONSTRUCTORA EL PROGRESO"
- Durante el mes se trabajó con los renglones de trazo y replanteo, corte de cajuela (e=0.33m) y la conformación de Sub-rasante.
- Fecha de inicio: 08-11-2021 Fecha de Finalización: 08-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 14.10 % CONTRATO No. 044-2020**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



PROYECTO SUSPENDIDO

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PALENCIA ALDEA SACUCHUM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCTORA EL PROGRESO"**
- Durante el mes se realizan correcciones al proyecto y limpieza final.
- Fecha de inicio: 15-04-2021 Fecha de Finalización: 12-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 99.54 % CONTRATO No. 026-2020**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO 2A. CALLE ALDEA EL TABLERO SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCTORA GONZALEZ"**
- Durante el mes se trabajó con los renglones de corte de cajuela, conformación de Sub-rasante, base de material granular, carrileras de concreto, bordillos laterales y empedrado.
- Fecha de inicio: 20-09-2021 Fecha de Finalización: 20-07-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 91.00 % CONTRATO No. 022-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18 186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO ORATORIO ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCTORA EARVECO"**
- Durante el mes se continúa trabajando la columna C-2, C-3, C-4, C-5, levantado de block y solera intermedia.
- Fecha de inicio: 20-12-2021 Fecha de Finalización: 20-06-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 28.10 % CONTRATO No. 050-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ENTRADA ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCTORA DETALLES, ARTE EN ARQUITECTURA"**
- Durante el mes se finalizó la construcción de la carpeta de rodadura de pavimento rígido y se trabajó con los bordillos. Se solicitó al contratista los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 01-03-2022 Fecha de Finalización: 01-09-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 88.00 % CONTRATO No. 061-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez,
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL 1A. CALLE A ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: “CONSTRUCTORA COINPRO”
- Durante el mes se continúa trabajando la construcción del canal pluvial y el armado de la loseta de concreto. Se solicitó el diseño de mezcla y los estudios de laboratorio al contratista.
- Fecha de inicio: 14-02-2022 Fecha de Finalización: 14-08-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 16.20 %** **CONTRATO No. 065-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 8.186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: “MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL Y CANALETA TRAMO FINAL ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: “**CONSTRUCTORA Y COMERCIAL AG**”
- Durante el mes se trabajó los renglones de solera corona, viga 2, losa de concreto armado y piso fundido de concreto, Se le solicitaron los estudios de laboratorio al contratista.
- Fecha de inicio: 10-03-2022 Fecha de Finalización: 08-07-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 60.00 %** **CONTRATO No. 006-2022**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez.
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18.186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 3 SOBRE 3A. CALLE ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCTORA Y COMERCIAL SEDIPRO"**
- Durante el mes se finalizaron los trabajos de bordillos laterales, cama de arena de asiento, adoquinado, llaves de confinamiento, loseta de remate, rotulo de identificación y limpieza final.
- Fecha de inicio: 07-12-2020 Fecha de Finalización: 15-04-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % CONTRATO No. 017-2020**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

OBSERVACIONES: Se hicieron correcciones al proyecto y limpieza final.



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 4 DE 3A. CALLE A ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: “IC&C INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION”
- Durante el mes se trabajó los renglones de trazo y replanteo, corte de cajuela y conformación de sub-rasante.
- Fecha de inicio: 11-03-2022 Fecha de Finalización: 10-06-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 13.30 % CONTRATO No. 069-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18.186

