

San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, 04 de febrero 2, 022

Ingeniero:

Erickson Euler Fuentes Miranda

Director Municipal de Planificación

Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez,

Departamento de San Marcos.


Un gusto saludarlo, deseándole lo mejor al frente de tan digno cargo.

Adjunto en la presente encontrara el informe ejecutivo de supervisión a los trabajos ejecutados en los proyectos por cotización y licitación durante el mes de enero del año 2022, una breve descripción y avance físico.

Sin Otro Particular


Atentamente:

UNIDAD DE INFORMACIÓN MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS



A LAS: 16:30 FIRMA: _____


UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ

ARQUITECTO

Colegiado N. 2605

Arq. Uwe Antonio Miranda Vásquez
Supervisor de Obras Municipales

Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.



SUPERVISION DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
Enero 2022



UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
COLEGIADO No. 2,605

Proyecto **CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL
(CAIMI) CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**

- Constructora: **CONSTRUCTORA JC 3**
- La visita inicial se realizo en fecha 19 de enero, se verifico el armado de vigas que estuvieran según especificaciones en planos, se corrigieron dos puntos de fachada que no coincide con plano de losas, Lunes 24, se verificaron planos de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, para dejar los ductos y mangas de instalaciones. Miércoles 02 de febrero, se superviso formaleta y se verifico el inicio de los trabajos de armado de losa.
- Fecha de inicio: 16-09-2021 Fecha de Finalización: 16-10-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 35.00 %** **CONTRATO No. 026-2021**

LUWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605






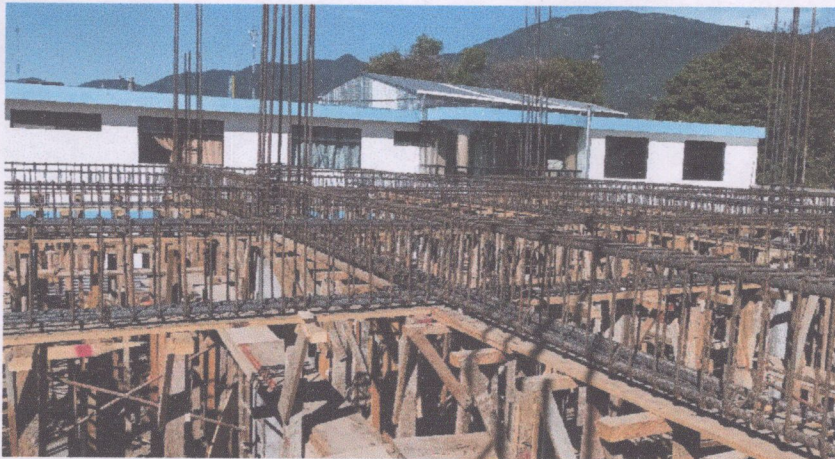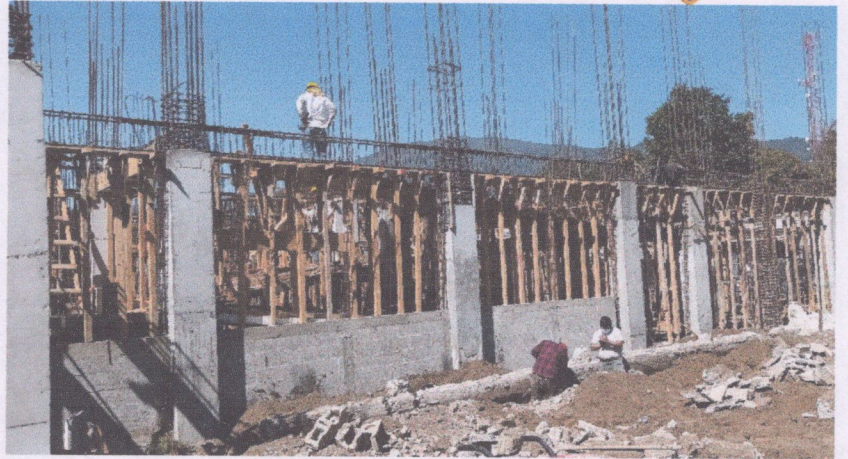

LWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL 10A. AVENDA ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**
- Constructora: **CONSTRU-IR**
- El día de visita se realizo recorrido, verificando que los trabajos están realizados en un 99% únicamente queda pendiente la limpieza general del área, el ing. Supervisor anterior realizo recepción al 95% queda pendiente la medición y recepción final.
- Fecha de inicio: 18-10-2021 Fecha de Finalización: 18-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100 % CONTRATO No. 030-2021**




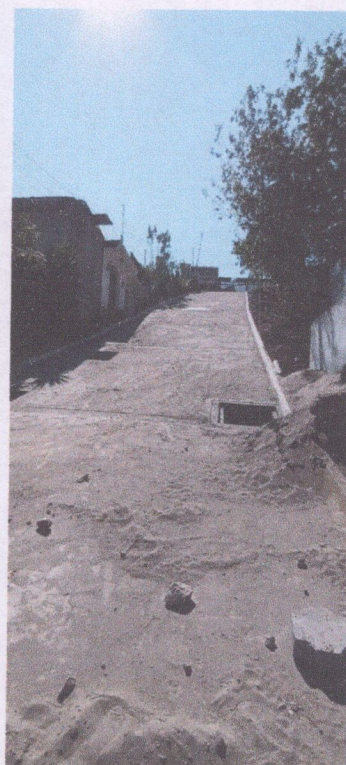
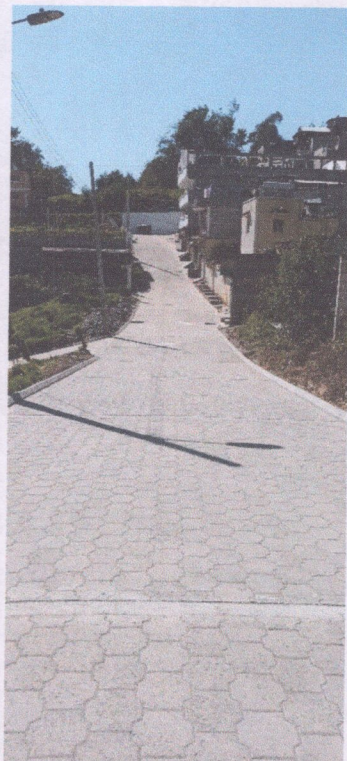
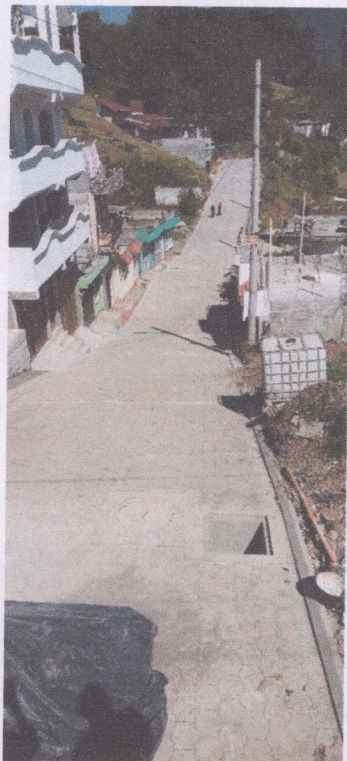


LWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ

ARQUITECTO
Colegado N. 2605

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 3 SOBRE 2ª. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**
- Constructora: **ZION Arquitectura y construcción**
- Durante la supervisión se verifico que se ha realizado trabajos corte de cajuela, conformación de sub-rasante y preparación de la base.
- Fecha de inicio: 15-11-2021 Fecha de Finalización: 15-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 45.00 % CONTRATO No. 033-2021**

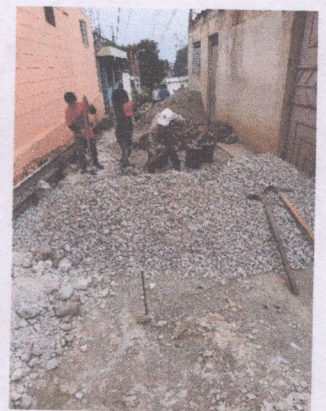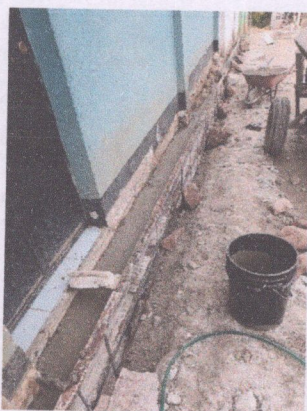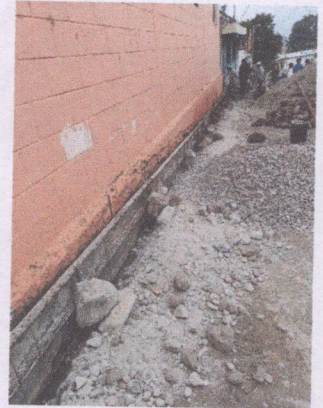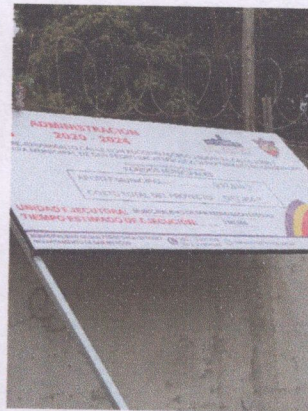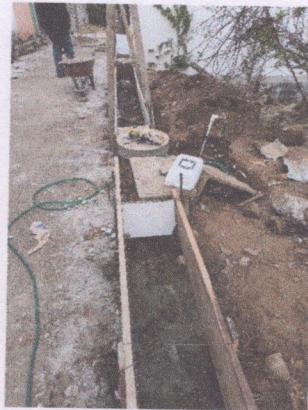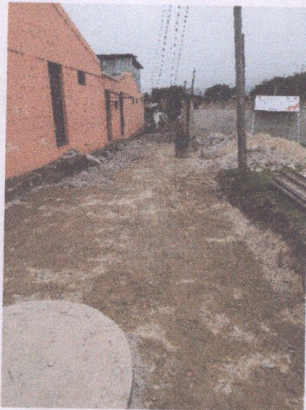

UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605



SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE III) 8A. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**

1. Constructora: **INGENIERIA Y CONSTRUCTORA EMANUEL**

- El proyecto actualmente esta suspendido a solicitud de los vecinos para la introducción de servicios de agua y drenaje, se tenia fecha limite 21 de enero, actualmente solo se han realizado los trabajos de trazo y replanteo y corte de cajuela
- Fecha de inicio: 06-12-2021 Fecha de Finalización: 06-04-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 19.55% CONTRATO No. 037-2021**


UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605

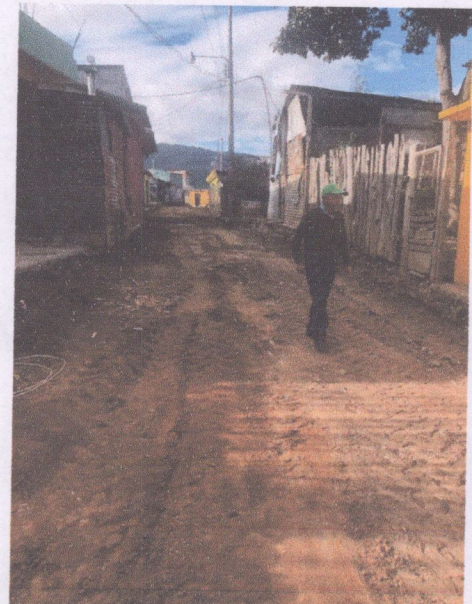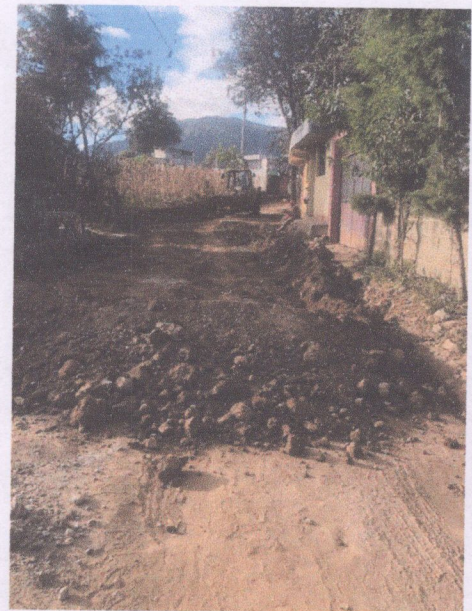

Proyecto:

**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 4A. AVENIDA A ZONA 1
CANTON SAN AGUSTIN TONALA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**

- Constructora: CONSTRUCTORA GONZALEZ
- En supervisión realizada en fecha 17/01/2022 se verifico avance , trazo y conformación de rampa de ingreso al área de cancha, acabado en muro perimetral de soleras y columnas, centrado de columnas y zapatas de bases de postes de muro perimetral de cancha. (ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SUSPENDIDO POR NO PODER INGRESAR MATERIALES AL AREA DE TRABAJO)
- Fecha de inicio: 13/04/2021 Fecha de Finalización: 13/10/2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 60.00 % CONTRATO No. 035-2,020**

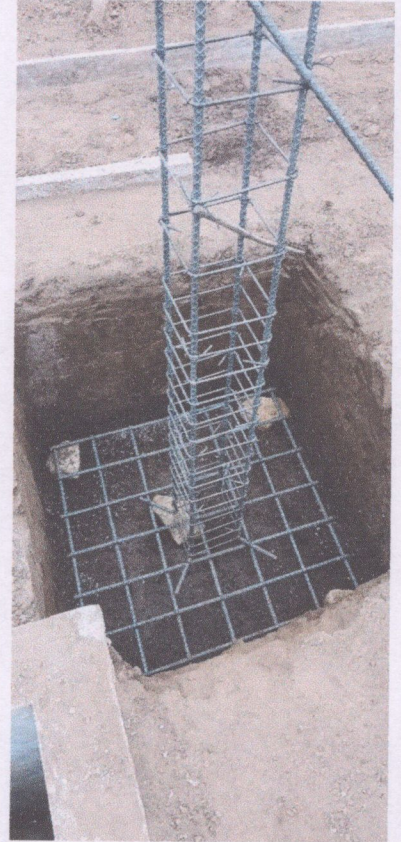


LUIS ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605

Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE QUE CONDUCE A CEMENTERIO CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**

- Constructora: **FERRCONS BALCARCEL**
- Se realizo supervisión en fecha 21/01/2021 se verifico lo siguiente, trabajos de trazo y replanteo y corte de cajuela y reacondicionamiento de sub rasante, conformación de base granular, se ubica material en obra.
- Fecha de inicio: 08-11-2021 Fecha de Finalización: 23-02-2022

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 39.50 % CONTRATO No. 036-2,021

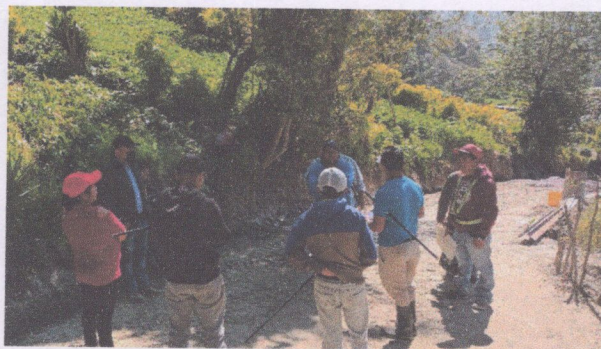

Proyecto: **AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INGRESO PRINCIPAL ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LIBERTAD ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**

- Constructora: **CONSTRUCTORA JC 3**
- Se realizo visita el día 11 de enero, en el cual se observo que el proyecto esta finalizado, el inconveniente es que el ing. Supervisor anterior realizo documentación de recepción con fecha 30/12/2021 y al momento no se ha ingresado el expediente final.
- Fecha de inicio: 17-09-2021 Fecha de Finalización: 17-12-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00% CONTRATO No. 019-2021**

LUWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605



Proyecto:

MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO 5A. AVENIDA FINAL SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: **MEGA-CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE**
- En supervisión realizada con fecha martes 11 de enero, se verifico que ya se había trabajado la conformación de sub rasante, construcción de bordillos e inicio de construcción de carrileras
- Fecha de inicio: 26-11-2021 Fecha de Finalización: 26-03-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 58.00 % CONTRATO No. 043-2021**



**Proyecto: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS
PIEDRECITAS, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**





- Constructora: **G & G**
- Se realizo visita técnica en fecha 20/01/2022 se observo lo siguiente: se verifico el trazo y replanteo del proyecto, se superviso la excavación y zanjeo para zapatas y cimientos, se verifico que la estructura de columnas no corresponde a lo planteado en planificación, se hicieron las respectivas observaciones indicando que se realizara una orden de cambio.

• Fecha de inicio: 28-12-2021 Fecha de Finalización: 28-04-2022

JWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ

• **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 16.64 %** **CONTRATO No. 053-2,021**





ARQUITECTO
Colegiado N. 2605

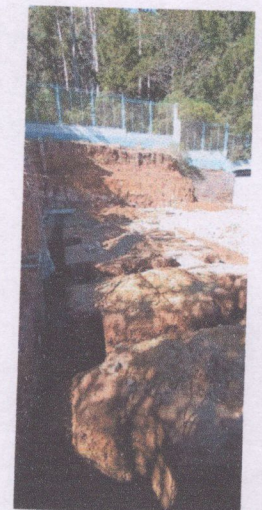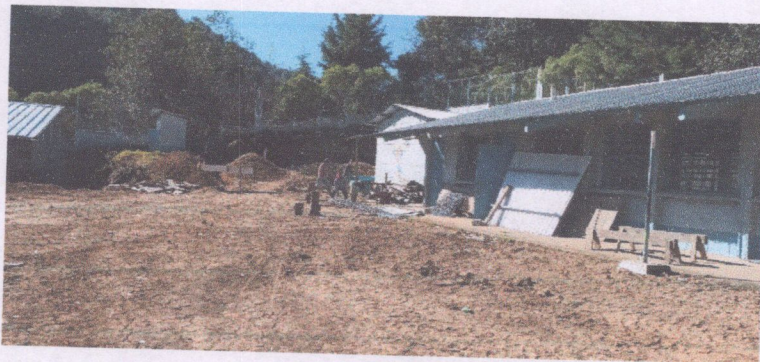

Proyecto: **CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CANTON LOS LOPEZ ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**

- Constructora: **CONSTRUCTORA Y COMERCIAL AG**
- Se realizo supervisión con fecha 12 de enero 2022 se verifico lo siguiente, trazo y replanteo, excavación y zanjeo para estructuras de cimentación, verificación de materiales y armado de estructuras.
- Fecha de inicio: 28-12-2021 Fecha de Finalización: 28-04-2022

VANCE ACUMULADO A LA FECHA 13.00 % CONTRATO No. 057-2,021

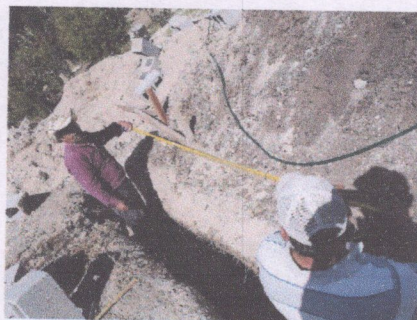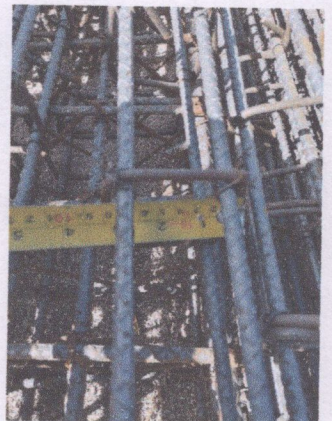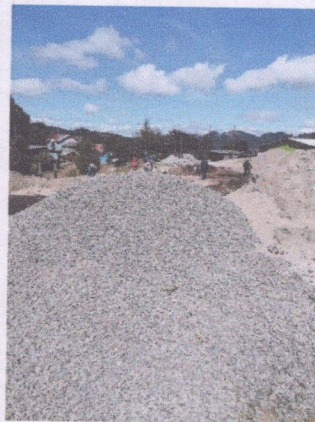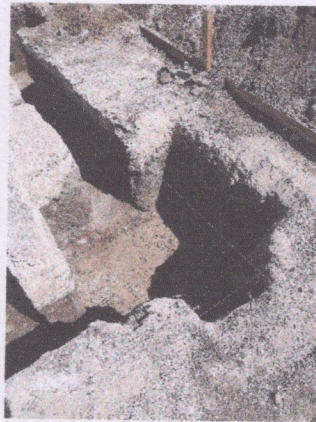

UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605

Proyecto:

**MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO INGRESO CASERIO
SAN MIGUEL LAS FLORES ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**

- Constructora: **CONSTRUCTORA EL PROGRESO**
- Se realizo Supervisión en fecha 14/01/2022, se verifico la compactación, se solicitaron los estudios de CBR, se verifico la construcción de carrileras, construcción de bordillos y se realizo recorrido general, se tuvo reunión con miembros de COCODE.
- Fecha de inicio: 08-12-2021 Fecha de Finalización: 08-03-2022

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 45.00% CONTRATO No. 042-2,021



LWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605



Proyecto:

**MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO TRAMOS
DE CASERIO SAN RAFAEL ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN
MARCOS**

- Constructora: **CONSTRUCTORA G&G**
- Se realizo Supervisión en fecha 14/01/2022, se verifico replanteo y corte y conformación de sub rasante y corte de cajuelas, se solicitaron los estudios de CBR.
- Fecha de inicio: 17-12-2021 Fecha de Finalización: 17-03-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 3.43% CONTRATO No. 047-2,021**






UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605

Proyecto:

MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR NUEVA JERUSALEN ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: **"CONSTRUCTORA AMERICANA, KRCC"**
- Se realizo Supervisión en fecha 13/01/2022, se trazo y replanteo, corte de cajuela conformación de sub rasante, preparación de base y construcción de bordillos. se solicitaron los estudios de CBR.
- Fecha de inicio: 22-12-2021 Fecha de Finalización: 22-04-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 27.00% CONTRATO No. 054-2,021**

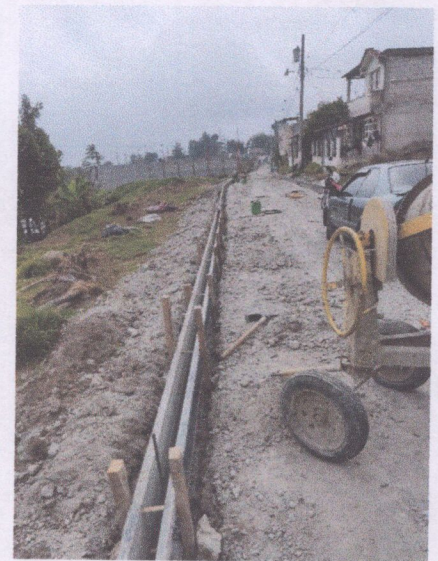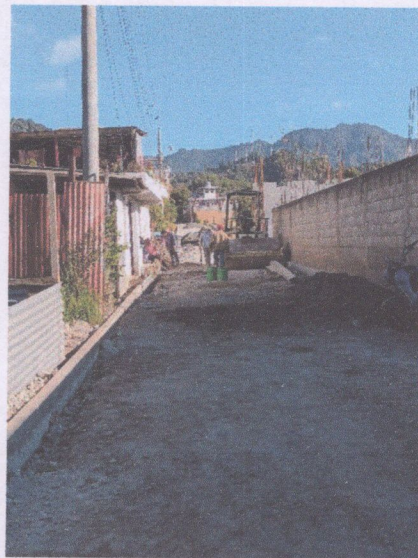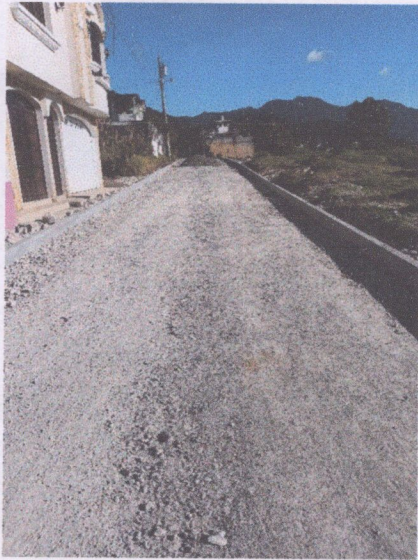

LUWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605

Proyecto:



**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ENTRADA 9A.
AVENIDA ZONA 4 SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN
MARCOS**

- Constructora: **INNOVACIONES EN CONSTRUCCION**
- Se realizo supervisión en fecha 27 de enero 2022, se verifico el avance en trazo y replanteo, corte de cajuela, conformación de sub rasante, bordillos.
- Fecha de inicio: 08-11-2021 Fecha de Finalización: 08-03-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 37.00% CONTRATO No. 035-2,021**

UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605




Proyecto:

**MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
SAN MARCOS**

- Constructora: **CONSTRUCTORA EARVECO**
- Se realizo supervisión en fecha 22 de enero 2022, se verifico el formaleta armado de estructura de losa y fundición.
- Fecha de inicio: 22/11/2021 Fecha de Finalización: 22/05/2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 66.94% CONTRATO No. 032-2,021**




UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605

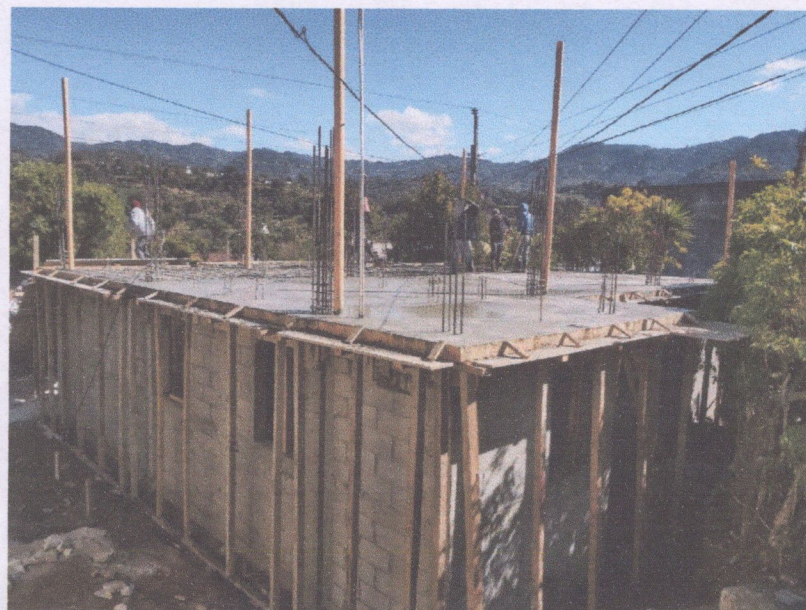

Proyecto:

**MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO AGUA TIBIA AREA ECOLOGICA ALDEA MAVIL,
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**

- Constructora: **CONSTRUCTORA EARVECO**
- Se realizo supervisión en fecha 20 de enero 2022, se verifico los acabados de vestidores de hombres y mujeres, construcción de pasamanos imitación madera, remodelación de sanitarios existentes cercanos a área de piscina, estructura metálica tipo Joist.
- Fecha de inicio: 10/09/2021 Fecha de Finalización: 10/02/2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 64.20% CONTRATO No. 011-2021**

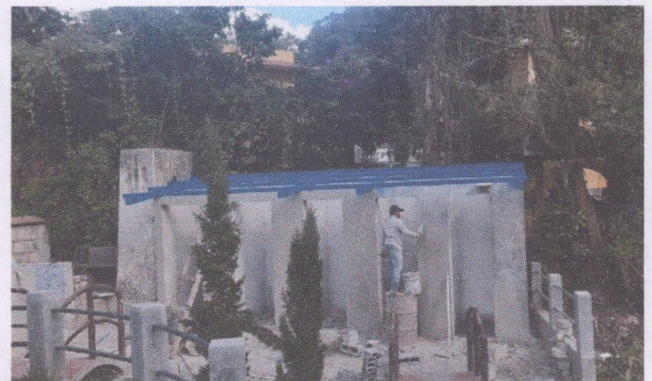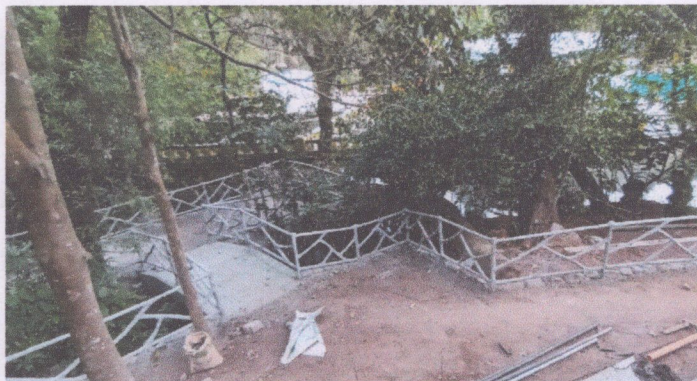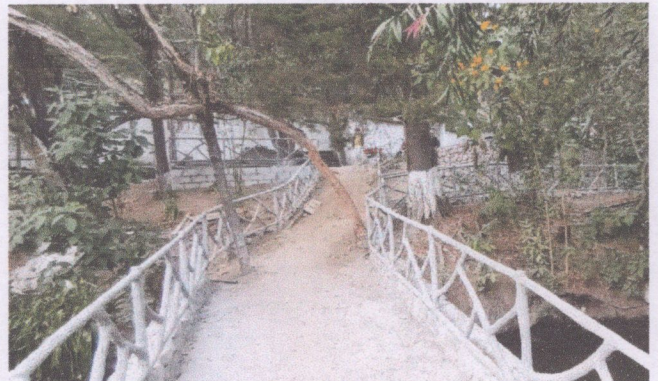

LUWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605



San Pedro Sacatepéquez, 04 de enero de 2022

Doctor:


Juan Eliézer González González
Alcalde Municipal
Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez
Departamento de San Marcos


Un gusto saludarlo, deseándole lo mejor al frente de tan digno cargo.

Adjunto en la presente encontrara el informe ejecutivo de los trabajos ejecutados durante el mes de enero del año 2022, supervisiones a los Proyectos en ejecución, una breve descripción y su Avance Físico, de los proyectos por cotización y licitación.

Sin otro particular

Atentamente




Ing. Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
Supervisor de Obras

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN DE CANTON SAN LORENZO A CANTON OJO DE AGUA ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“GONZALEZ”**
- Durante el mes se iniciaron los trabajos de trazo y replanteo, desempedrado y corte de cajuela.
- Fecha de inicio: 21-12-2021 Fecha de Finalización: 21-04-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 9.00 % CONTRATO No. 048-2021**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN + MURO DE CONTENCIÓN 4A, AVENIDA A ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"G & G"**
- Durante el mes se trabajó los renglones de bordillos laterales, cama de arena de asiento, adoquinado de tráfico pesado, llaves de confinamiento, loseta de remate y reacondicionamiento de brocales.
- Fecha de inicio: 01-10-2021 Fecha de Finalización: 01-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 98.00 % CONTRATO No. 017-2021**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA URBANA MIXTA CANTON EL MOSQUITO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CIFUENTES VELASQUEZ”**
- Durante el mes se trabajó con el repello y cernido, construcción de rampa, relleno área de baño y cocina, y columna C-6.
- Fecha de inicio: 12-04-2021 Fecha de Finalización: 13-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 63.60 % CONTRATO No. 037-2020**




SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS FUENTES CANTON LAS FLORES ALDEA CHAMPOLLAP, DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CONSTRUCCIONES PROGRESO”**
- Durante el mes se trabajó los renglones de cama de arena de asiento, adoquín tráfico pesado y llaves de confinamiento. Se solicitaron los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 16-11-2021 Fecha de Finalización: 16-03-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 78.00 % CONTRATO No. 034-2021**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CANTON CAROLINA HACIA CRUCE CALLE PRINCIPAL ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCTORA Y COMERCIAL AG"**
- Durante el mes se trabajó los renglones de adoquín tráfico pesado, llaves de confinamiento y loseta de remate. Se solicitaron los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 22-11-2021 Fecha de Finalización: 22-03-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 75.00 % CONTRATO No. 039-2021**

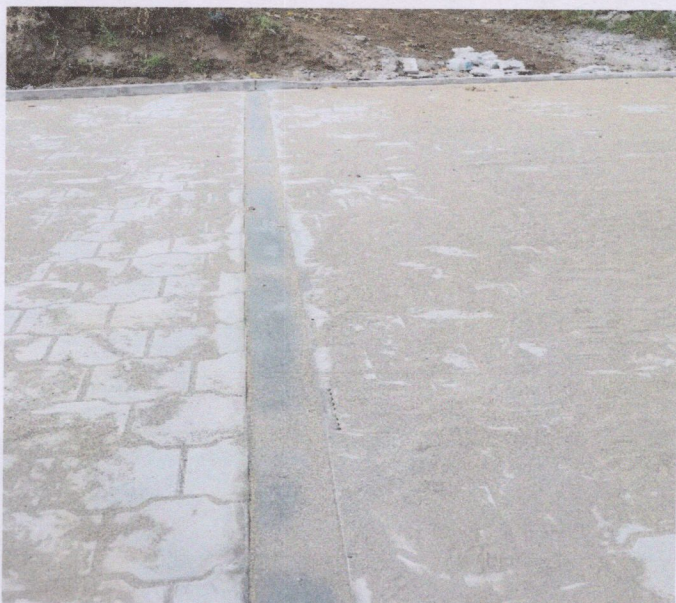

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CIFUENTES VELASQUEZ”**
- Durante el mes se continua trabajando en el armado de las cámaras de sedimentación 1 y 2, también se fundió la base de cámara de sedimentación 1.
- Fecha de inicio: 12-04-2021 Fecha de Finalización: 12-10-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 60.00 % CONTRATO No. 033-2020**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL (MODULOS 2 Y 3) MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“ARCHILA”**
- Durante el mes se continúa con los trabajos de armado y fundición de zapatas, columnas, vigas de amarre, soleras intermedias y se trabaja con el levantado de muros de block, del módulo de administración.
- Fecha de inicio: 01-03-2021 Fecha de Finalización: 01-09-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 39.65 % CONTRATO No. 040-2020**




SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE PRINCIPAL SECTOR BAÑOS CANTON BUENA VISTA ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“G & G”**
- Durante el mes se finalizaron los trabajos de cama de arena de asiento, adoquinado de tráfico pesado, llaves de confinamiento, losetas de remate y limpieza final.
- Fecha de inicio: 22-09-2021 Fecha de Finalización: 22-01-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % CONTRATO No. 021-2021**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“DETALLES ARTE EN ARQUITECTURA”**
- Durante el mes se trabajó el armado de la viga canal 1 y 2, también se trabaja en la viga 1 y solera final.
- Fecha de inicio: 04-10-2021 Fecha de Finalización: 04-03-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 23.00 % CONTRATO No. 016-2021**

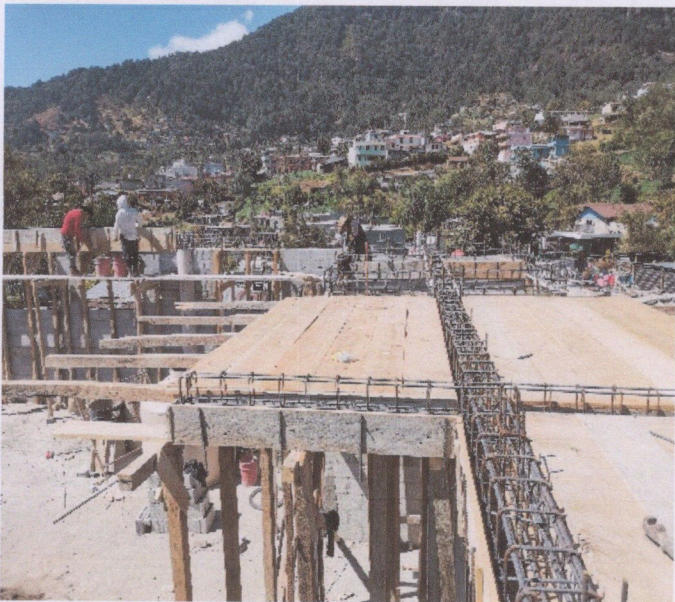

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. CALLE ZONA 5 ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“G & G”**
- Durante el mes se continúa trabajando con la construcción de pozos de visita, instalación de tubería y relleno + compactación de zanja.
- Fecha de inicio: 16-11-2021 Fecha de Finalización: 16-04-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 85.00 % CONTRATO No. 031-2021**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1 CANTON VISTA HERMOSA ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCCIONES PROGRESO"**
- Durante el mes se trabajó con los renglones de conformación de la sub-rasante, preparación de la base y bordillos laterales, se solicitaron los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 16-12-2021 Fecha de Finalización: 16-05-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 27.00 % CONTRATO No. 041-2021**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO ENTRADA CASERIO SANTA TERESA ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CONSTRUCCIONES PROGRESO”**
- Durante el mes se continúa trabajando la conformación de sub-rasante, corte de cajuela, preparación de la base, bordillos laterales y fundición de carrileras de concreto.
- Fecha de inicio: 02-12-2021 Fecha de Finalización: 02-05-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 25.00 % CONTRATO No. 038-2021**




SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA APARICIO MERIDA MORALES CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“MEGA-CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE”**
- Durante el mes se continua trabajando la construcción de techo de estructura, repello + cernido (en paredes y losa) y las vigas costaneras doble.
- Fecha de inicio: 26-11-2021 Fecha de Finalización: 26-03-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 78.30 % CONTRATO No. 040-2021**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA (TECHO PATIO) CANTON EL ZAPOTE, ALDEA CORRAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CONSTRUCTORA EL PROGRESO”**
- Durante el mes se finalizaron los renglones de construcción de techo de estructura, instalación de bajadas de agua pluviales, rotulo de identificación y limpieza general.
- Fecha de inicio: 12-11-2021 Fecha de Finalización: 12-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % CONTRATO No. 012-2021**

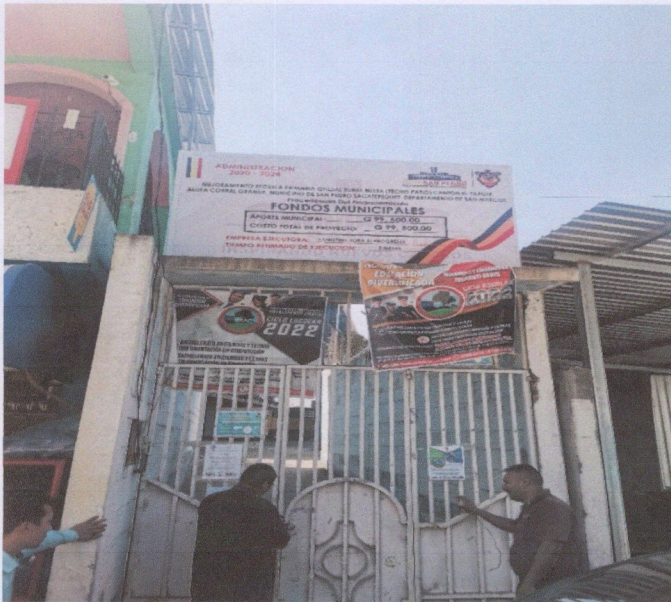

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"C Y R INGENIERIA"**
- Durante el mes se trabajó con los renglones de zapata Z-1, columna C-1, columna C-3, cimiento corrido, levantado sobre cimiento, solera hidrófuga, relleno y levantado de paredes de block.
- Fecha de inicio: 26-11-2021 Fecha de Finalización: 26-08-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 15.00 % CONTRATO No. 045-2021**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CALLEJON 1 DE 2A. AVENIDA ZONA 4, CANTON TONALA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR"**
- Durante el mes se trabajó con los renglones de trazo y replanteo topográfico y nivelación y compactación de sub-rasante (cajuela).
- Fecha de inicio: 14-12-2021 Fecha de Finalización: 14-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 9.00 % CONTRATO No. 044-2021**



PROYECTO SUSPENDIDO

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CASERIO EL BOQUERON HACIA LIMITE CON CENTRO DE COMUNIDAD ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CONSTRUCTORA CODIPA”**
- Durante el mes se trabajó con los renglones de cama de arena de asiento, adoquín tráfico pesado, bordillos laterales y llave de confinamiento. Se solicitaron los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 03-12-2021 Fecha de Finalización: 03-05-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 68.50 % CONTRATO No. 046-2021**



SUPERVISION DE OBRAS


- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 6 ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCTORA EL PROGRESO"**
- Durante el mes se trabajó con los renglones de trazo y replanteo, corte de cajuela ($e=0.33m$) y la conformación de Sub-rasante.
- Fecha de inicio: 08-11-2021 Fecha de Finalización: 08-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 14.10 % CONTRATO No. 044-2020**



PROYECTO SUSPENDIDO

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PALENCIA ALDEA SACUCHUM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCTORA EL PROGRESO"**
- Durante el mes se trabajó con los renglones de trazo y replanteo, corte de cajuela (e=0.33m) y la conformación de Sub-rasante.
- Fecha de inicio: 15-04-2021 Fecha de Finalización: 12-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 98.00 % CONTRATO No. 026-2020**

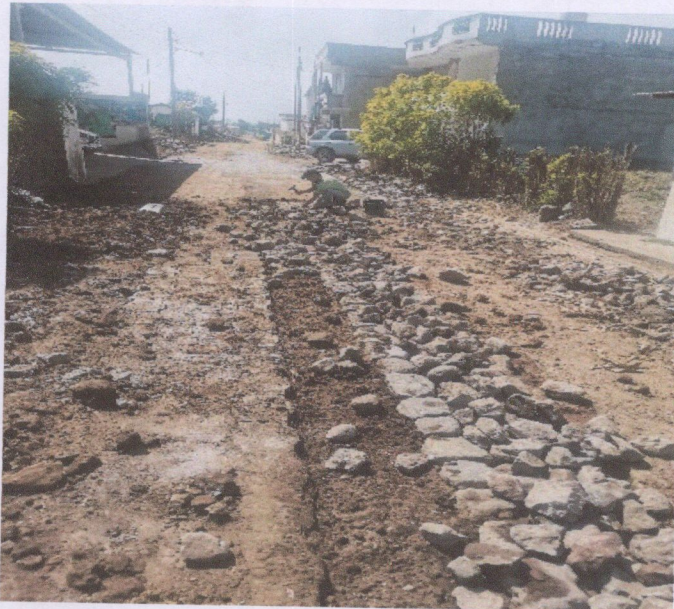

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO 2A. CALLE ALDEA EL TABLERO SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCTORA GONZALEZ"**
- Durante el mes se trabajó con los renglones de corte de cajuela, conformación de Sub-rasante, base de material granular, carrileras de concreto, bordillos laterales, muro de concreto ciclópeo y empedrado.
- Fecha de inicio: 20-09-2021 Fecha de Finalización: 20-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 70.00 % CONTRATO No. 022-2021**

