



SUPERVISION DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ

Febrero 2022

UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ



COLEGIADO No. 2,605






SUPERVISION DE OBRAS

Proyecto **CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI)**
CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: **CONSTRUCTORA JC 3**
- Se realizaron varias supervisiones en el mes la primera se realizo el 02 de febrero las siguientes se realizaron 8 y 9 de febrero y la ultima el 16 de febrero. En estas se verifico el armado de tarima para fundición de losa, el armado de estructura o refuerzo de losa, la fundición de losas y por ultimo levantado de muros en segundo nivel.
- Fecha de inicio: 16-09-2021 Fecha de Finalización: 16-10-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 33.85 %** **CONTRATO No. 026-2021**


DWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605

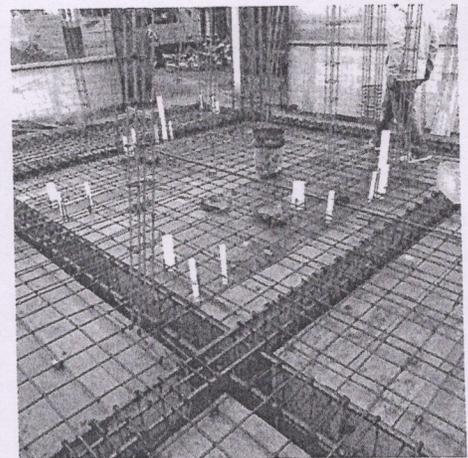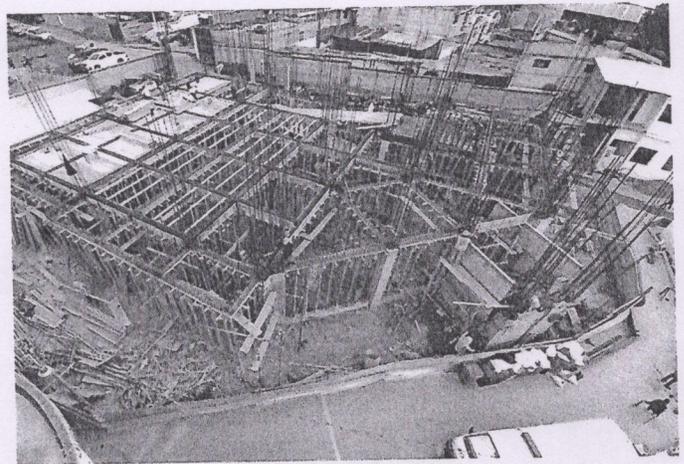

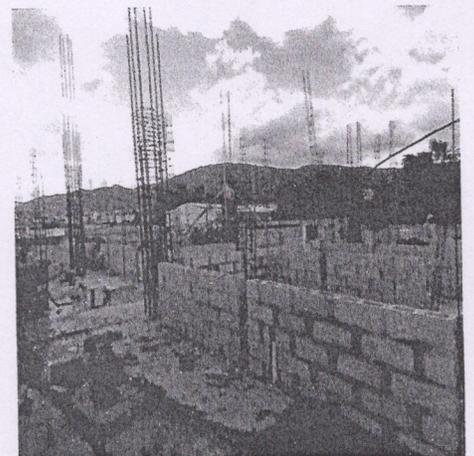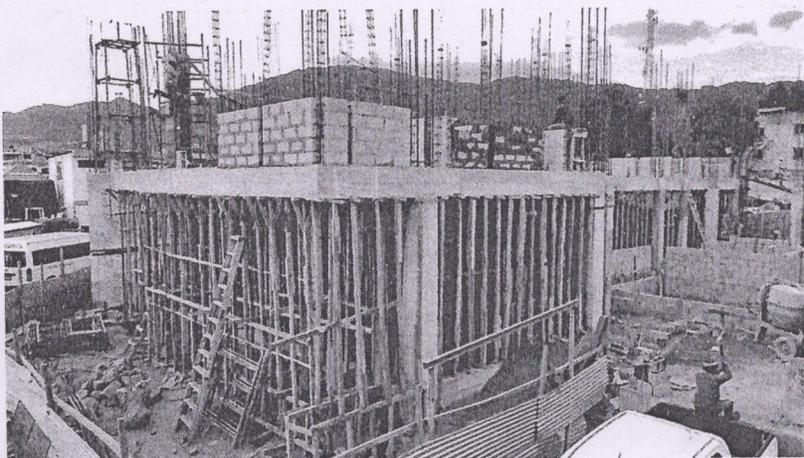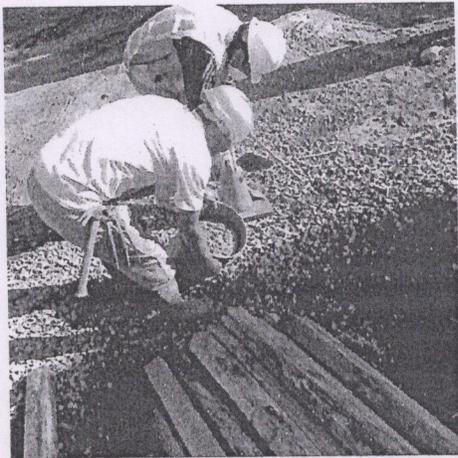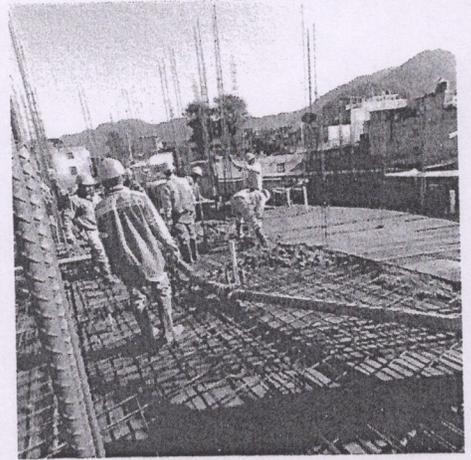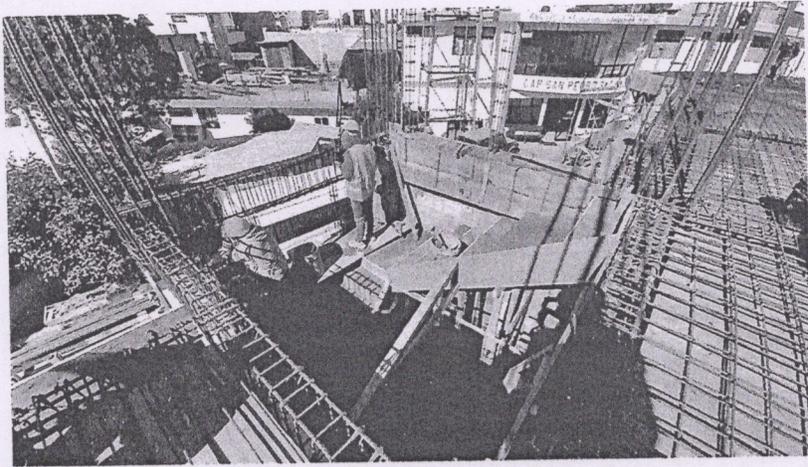

SUPERVISION DE OBRAS




- Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL 10A. AVENDA ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**
- Constructora: **CONSTRU-IR**
- Se realizo supervisión y revisión final en fecha 14 de febrero, se reviso cada uno de los trabajos que fueran realizados según lo contratado, para solicitar comisión receptora.
- Fecha de inicio: 18-10-2021 Fecha de Finalización: 18-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100 % CONTRATO No. 030-2021**

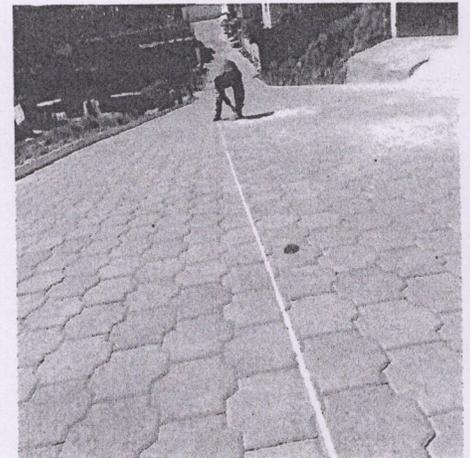

LUWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 3 SOBRE 2ª. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**
- Constructora: **ZION Arquitectura y construcción**
- en fecha 26 de febrero se realizo recorrido de inspección final al proyecto con el acompañamiento del superintendente del proyecto Arq. Elmar Zacarías Fuentes, se verifico que la construcción del proyecto se encuentra totalmente concluido a entera satisfacción, con los renglones y cantidades contratados, lográndose avance físico final del 100%.
- Fecha de inicio: 15-11-2021 Fecha de Finalización: 15-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00% CONTRATO No. 033-2021**



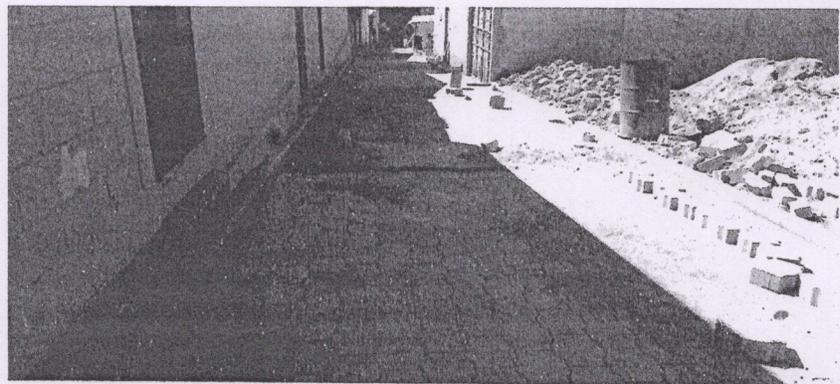
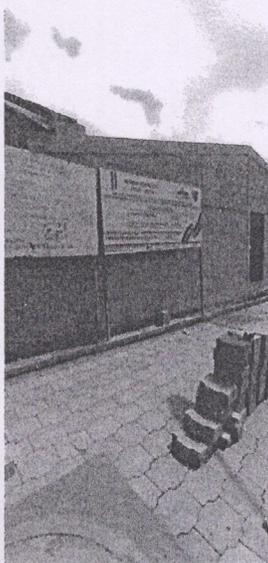
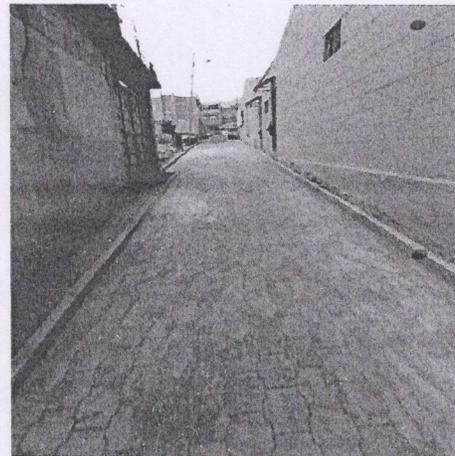


UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605

Proyecto:

**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 4A. AVENIDA A ZONA 1
CANTON SAN AGUSTIN TONALA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**

- Constructora: CONSTRUCTORA GONZALEZ
- En supervisión realizada en fecha 08/02/2022 instalaciones hidrosanitarias en baterías de baños, construcción de bordillo de malla en perímetro de área de cancha, acabados en cielo de baterías de baños.(El proyecto actualmente se encuentra suspendido)
- Fecha de inicio: 13/04/2021 Fecha de Finalización: 13/10/2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 87.43% CONTRATO No. 035-2,020**

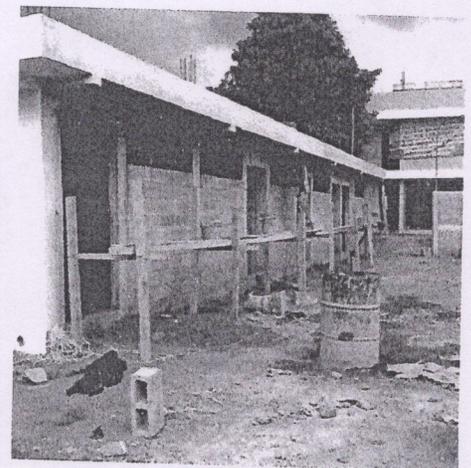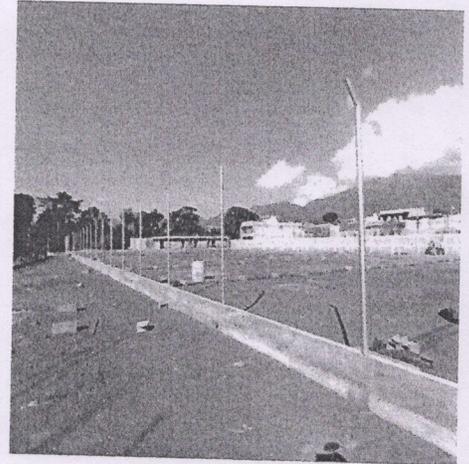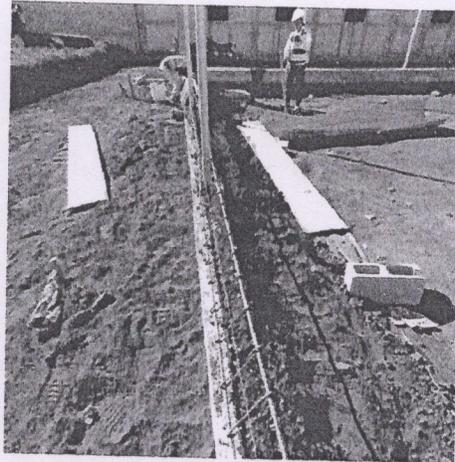
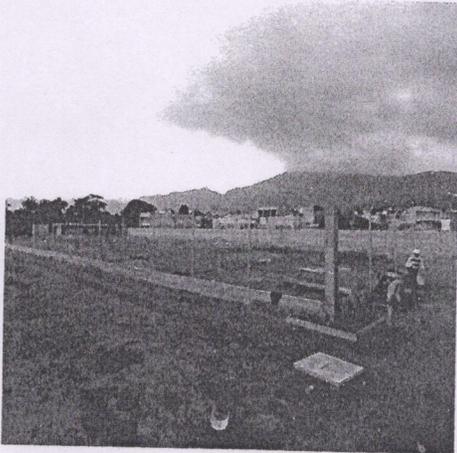


UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605

Proyecto:

MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 5A. AVENIDA ENTRE 7A. CALLE A PUENTE PEATONAL ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: CONSTRUCTORA EL PROGRESO
- En supervisión realizada en fecha 21/02/2022 Se verifico que ya se iniciaron los trabajos, trazo y replanteo, movimiento de tierra, corte de cajuela. (el proyecto se retraso aprox. 30 días debido a que el COCODE solicito materiales para colocar tubos en el puente peatonal)
- Fecha de inicio: 17/01/2022 Fecha de Finalización: 17/04/2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 6.72% CONTRATO No. 056-2021**

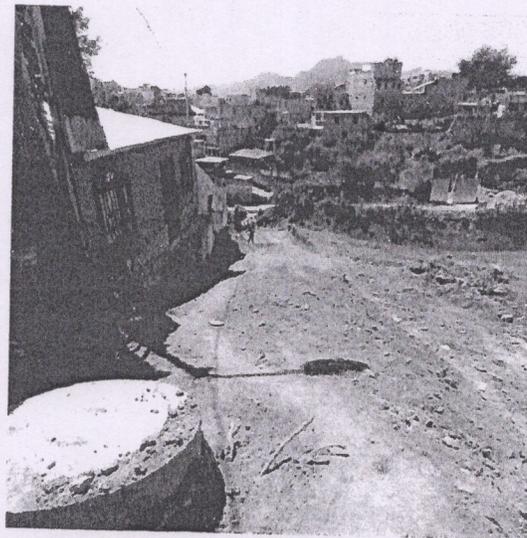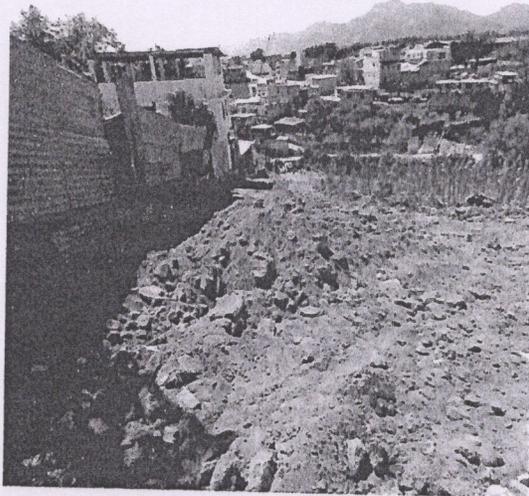

LUWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605





Proyecto:

**MEJORAMIENTO MERCADO PISO DE PLAZA, 5A. CALLE ENTRE 9 Y 10 AVENIDA ZONA 1,
CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.**

- Constructora: CONSTRUCTORA EL PROGRESO
- En supervisión realizada en fecha 17/02/2022 se visito el taller de estructuras metalicas en el cual se están fabricando los módulos individuales de estructura de plaza con el acompañamiento Arq. Perla Rivera se verifico que se tienen fabricados 30 módulos de la parte inferior, únicamente aplicada pintura anticorrosiva se verificaron medidas y se le hicieron las recomendaciones respecto a los acabados y puntos de soldadura.
- Fecha de inicio: 17/01/2022 Fecha de Finalización: 17/04/2022

• **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 15.00%** **CONTRATO No. 072-2021** UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ

ARQUITECTO
Colegado N. 2605

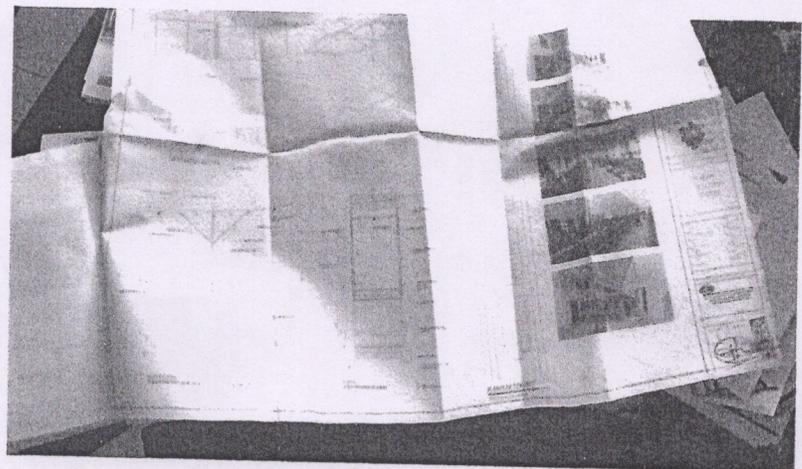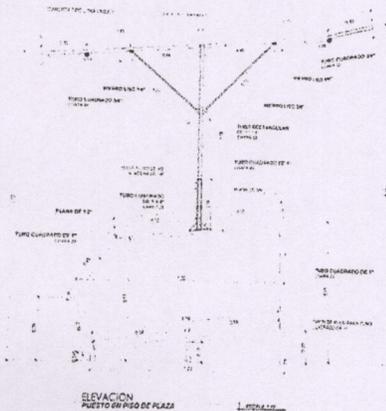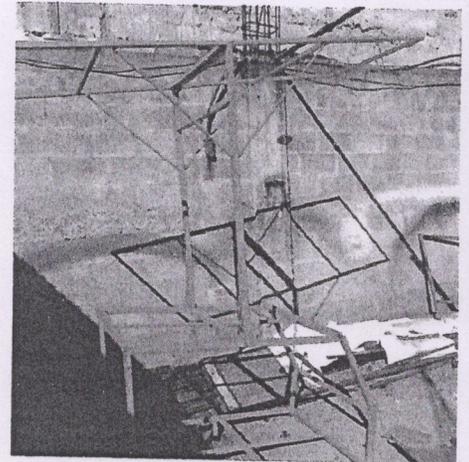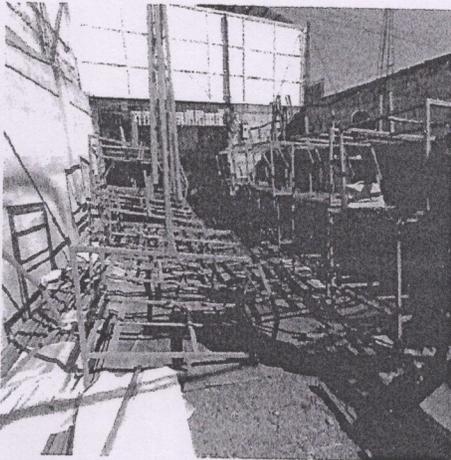


Proyecto:

**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE QUE CONDUCE A CEMENTERIO CASERIO
LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**

- Constructora: **FERRCONS BALCARCEL**
- Se realizo supervisión en fecha 22/02/2022 se constato que el proyecto va avanzado ya se cuenta con bordillos, ya se instalo adoquín y se fundieron llaves de amarre, así mismo ya cuenta con el sello de arena e instalación de rotulo, solo se le dio indicacione^s y recomendaciones al contratista de algunos trabajos pendientes o que tienen que reparar.
- Fecha de inicio: 08-11-2021 Fecha de Finalización: 23-02-2022

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 99.34 % CONTRATO No. 036-2,021




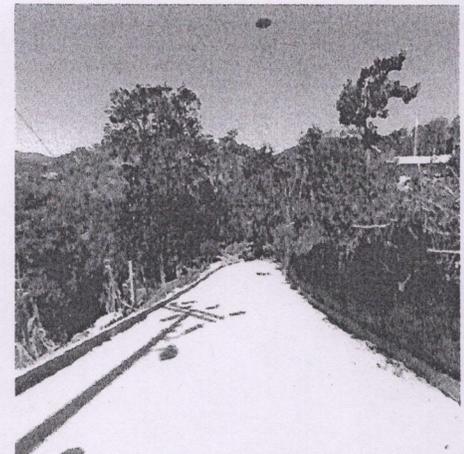


LUWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605

Proyecto:

**MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO 5A. AVENIDA FINAL
SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**

- Constructora: **MEGA-CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE**
- En supervisión realizada por mi persona en fecha 18 de febrero se realizo recorrido de inspección final al proyecto con el acompañamiento del responsable del proyecto Sr. Diego Antonio Cifuentes Mazariegos Verificando que el proyecto se encuentra totalmente concluido a entera satisfacción, con los renglones y cantidades contratados, logrando avance físico final del 100%.
- Fecha de inicio: 26-11-2021 Fecha de Finalización: 26-03-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % CONTRATO No. 043-2021**

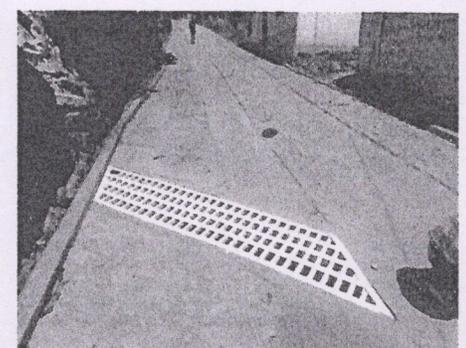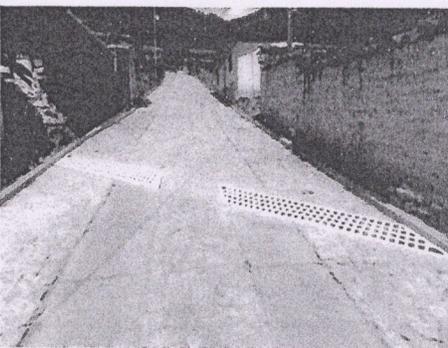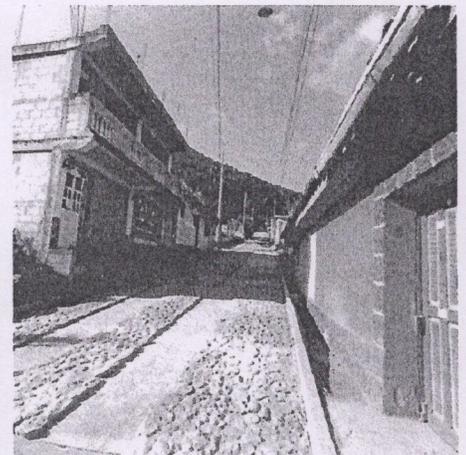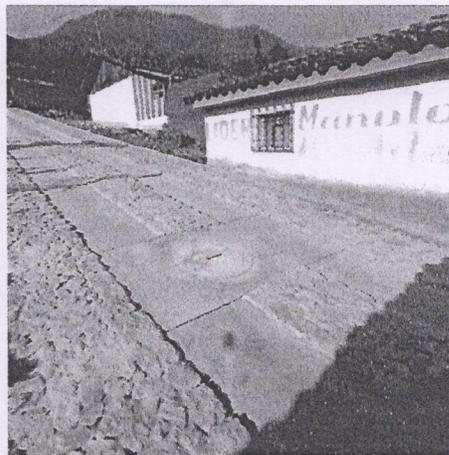


UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605

Proyecto:



CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CANTON LOS LOPEZ ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: **CONSTRUCTORA Y COMERCIAL AG**
- Se realizo supervisión con fecha 11 de febrero 2022 se verifico lo siguiente, levantado de muros, soleras, columnas, también se platico con los comunitarios respecto a la orden de cambio que solicitan no construir el modulo de gradas y a cambio utilizar el área para crear oficina de alcalde auxiliar de la cual se ingresara orden de cambio.
- Fecha de inicio: 28-12-2021 Fecha de Finalización: 28-04-2022

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 44.61 % CONTRATO No. 057-2,021

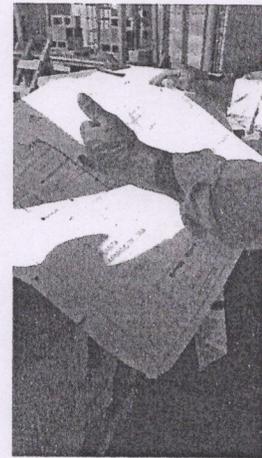

LUWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605




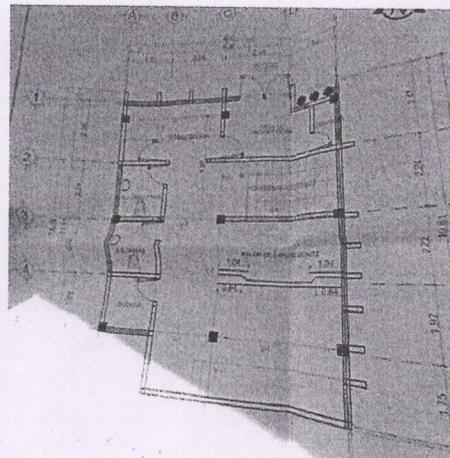
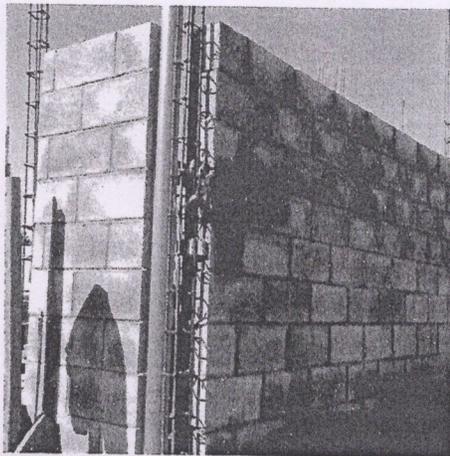


Proyecto:

**MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO INGRESO CASERIO
SAN MIGUEL LAS FLORES ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS**

- Constructora: **CONSTRUCTORA EL PROGRESO**
- Se realizo Supervisión en fecha 15/02/2022, se superviso el empedrado, se verifico que la base estuviera debidamente preparada, y se verifico área en donde se hizo la muestra para el estucado de arena y cemento que se aplicara por orden de cambio.
- Fecha de inicio: 08-12-2021 Fecha de Finalización: 08-03-2022

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 92.71% CONTRATO No. 042-2,021

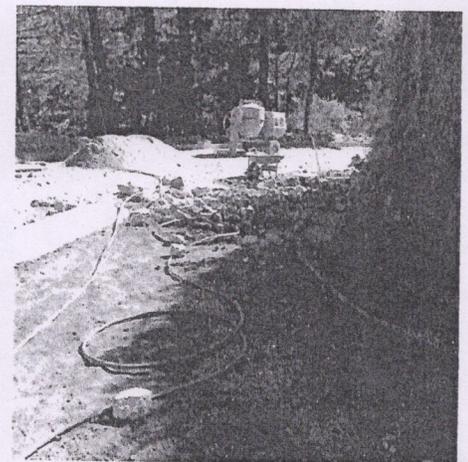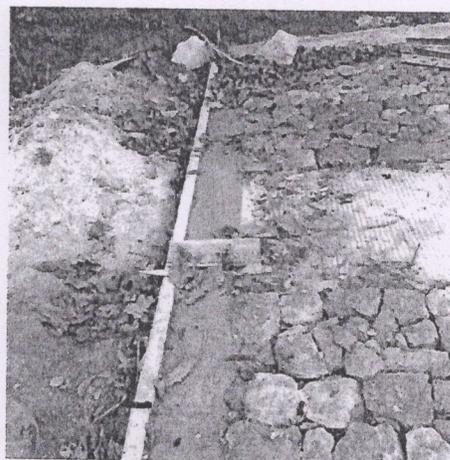
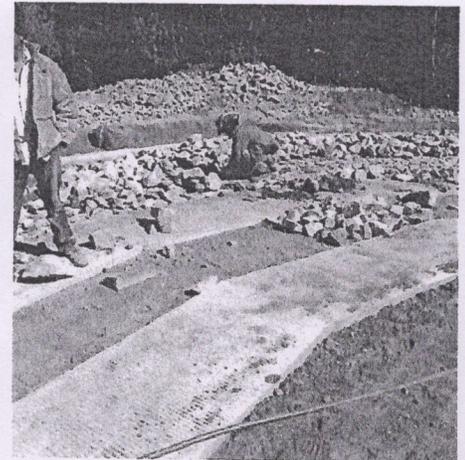
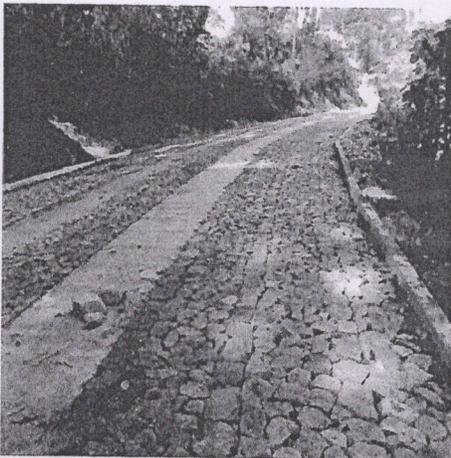


UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegiado N. 2605

Proyecto:

MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO TRAMOS DE CASERIO SAN RAFAEL ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: **CONSTRUCTORA G&G**
- Se realizo Supervisión en fecha 15/02/2022, se superviso la construcción de carrileras, bordillos y preparación de base de empedrado, en el tramo II se esta preparando la base para la construcción de carrileras.
- Fecha de inicio: 17-12-2021 Fecha de Finalización: 17-03-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 3.43% CONTRATO No. 047-2,021**


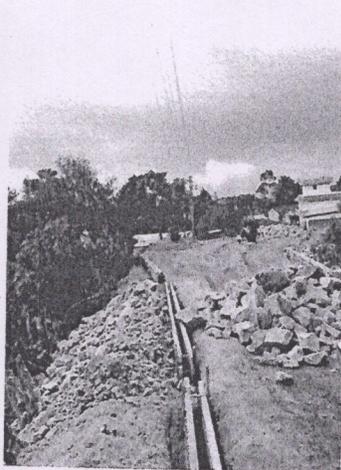
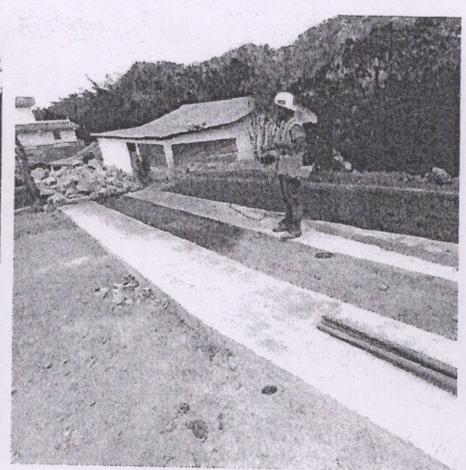
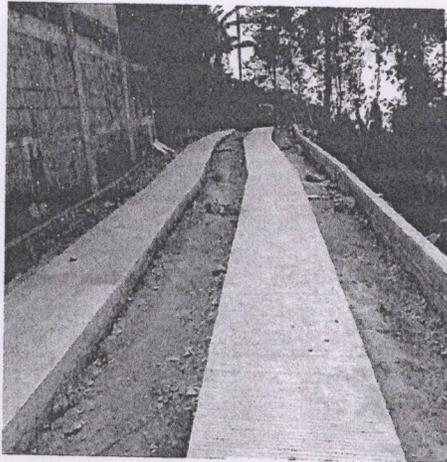


LWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605

Proyecto:

MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR NUEVA JERUSALEN ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: **"CONSTRUCTORA AMERICANA, KRCC"**
- Se realizo Supervisión en fecha 14/02/2022, se verifico la base de arena previo a la instalación de adoquín, se esta utilizado es de la empresa PRECSA y se les dio al contratista las recomendaciones sobre el material utilizado, se verifico también que ya se tiene concluidos los trabajos en bordillos y se están iniciando los primeros tramos con adoquín y fundición de llaves.
- Fecha de inicio: 22-12-2021 Fecha de Finalización: 22-04-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 55.44% CONTRATO No. 054-2,021**

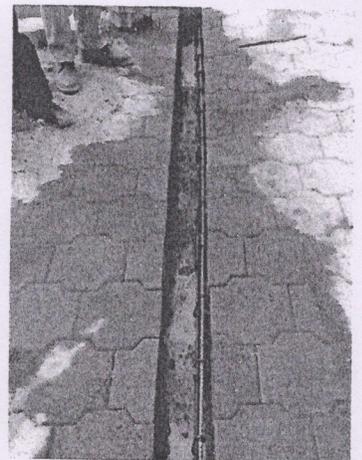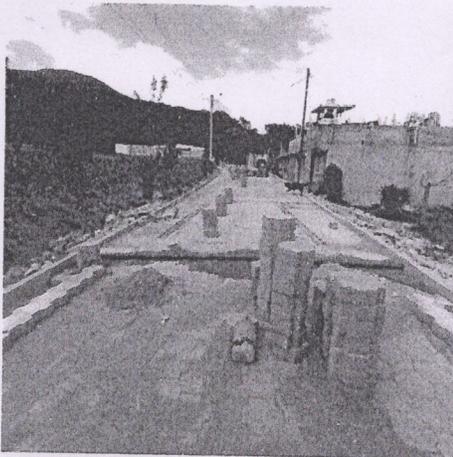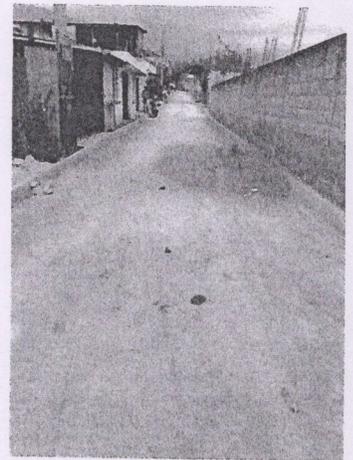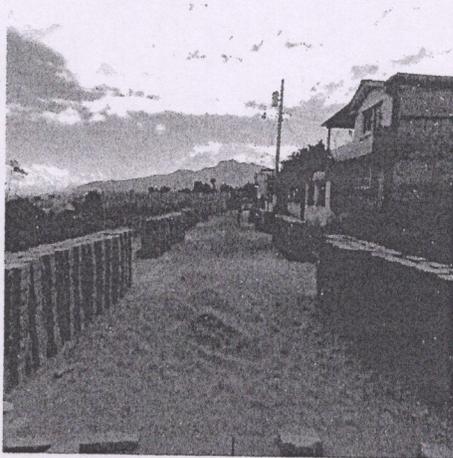


UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ.
ARQUITECTO
Colegado N. 2605

Proyecto:

MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ENTRADA 9A. AVENIDA ZONA 4 SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: **INNOVACIONES EN CONSTRUCCION**
- Se realizo supervisión en fecha 17 de febrero 2022, se verifico la instalación de adoquín, se verifico el espesor de la base o cama de arena y la fundición de llaves de confinamiento, el adoquín utilizado es de la marca LA ROCA.
- Fecha de inicio: 08-11-2021 Fecha de Finalización: 08-03-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 70.55% CONTRATO No. 035-2,021**




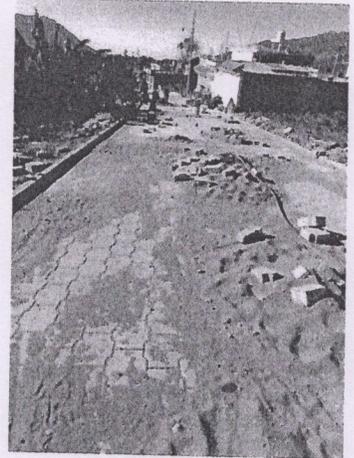


UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ
ARQUITECTO
Colegado N. 2605

Proyecto:

MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO AGUA TIBIA AREA ECOLOGICA ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

- Constructora: **CONSTRUCTORA EARVECO**
- Se realizo supervisión en fecha 28 de febrero 2022, se está trabajando en remodelación de área de baños, se construyo mirador y paso peatonal, se están realizando trabajos para cambio de piso de piscina.
- Fecha de inicio: 10/09/2021 Fecha de Finalización: 10/02/2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 64.20% CONTRATO No. 011-2021**

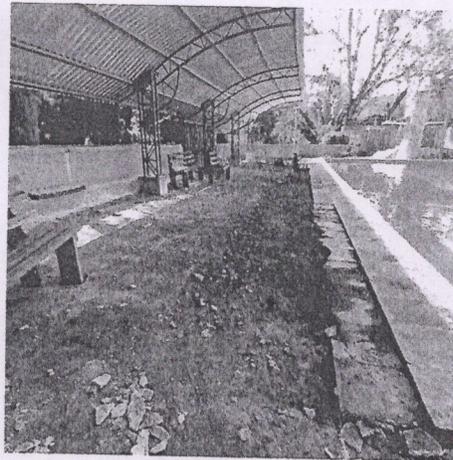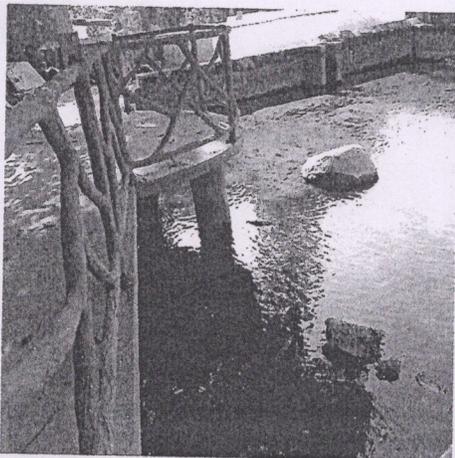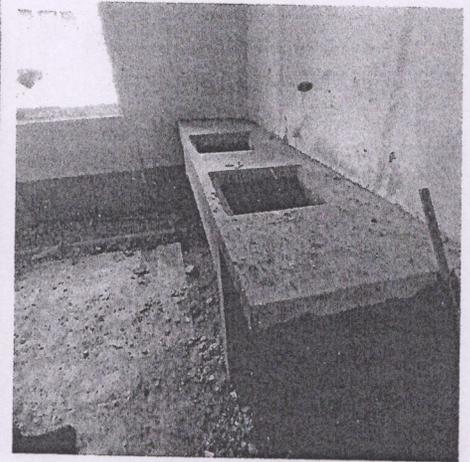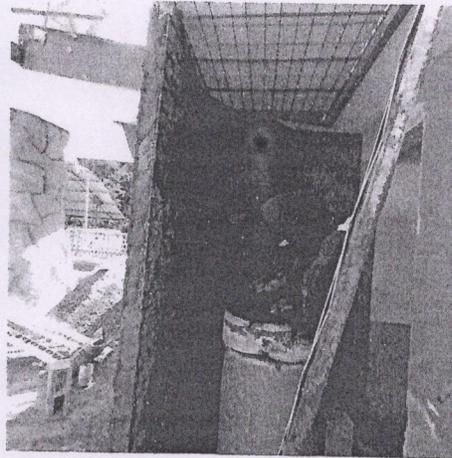




SUPERVISION DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
FEBRERO 2022
INGENIERO CIVIL GUSTAVO ADOLFO VELÁSQUEZ JUÁREZ
COLEGIADO No. 18,186

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN DE CANTON SAN LORENZO A CANTON OJO DE AGUA ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"GONZALEZ"**
- Durante el mes se trabajó en el renglón de muro contención, se le solicitaron los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 21-12-2021 Fecha de Finalización: 21-04-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 14.10 %** **CONTRATO No. 048-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

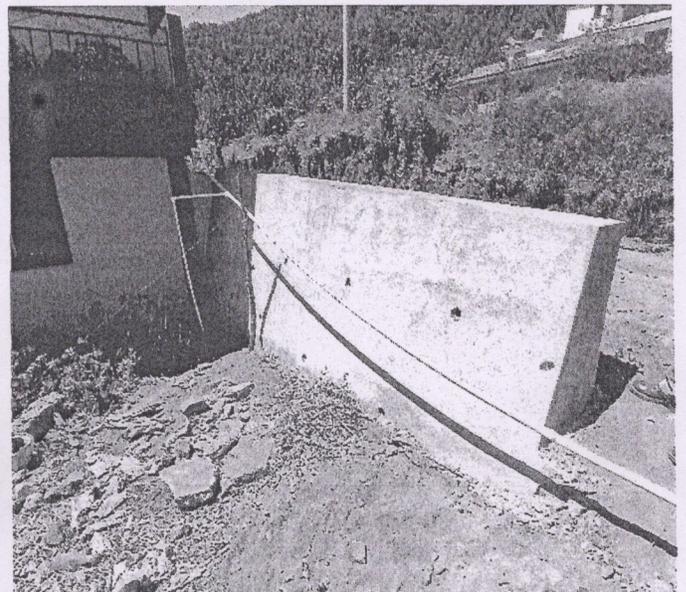

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN + MURO DE CONTENCIÓN 4A, AVENIDA A ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: "G & G"
- Durante el mes se finalizaron los trabajos de adoquinado, llaves de confinamiento, loseta de remate y limpieza final.
- Fecha de inicio: 01-10-2021 Fecha de Finalización: 01-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 100.00 % CONTRATO No. 017-2021**


Gustavo Adolfo Velásquez Juan
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA URBANA MIXTA CANTON EL MOSQUITO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: "CIFUENTES VELASQUEZ"
- Durante el mes se trabajó con el repello y cernido, construcción de rampa, relleno área de baño y cocina, y columna C-4.
- Fecha de inicio: 12-04-2021 Fecha de Finalización: 13-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 65.00 % CONTRATO No. 037-2020**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

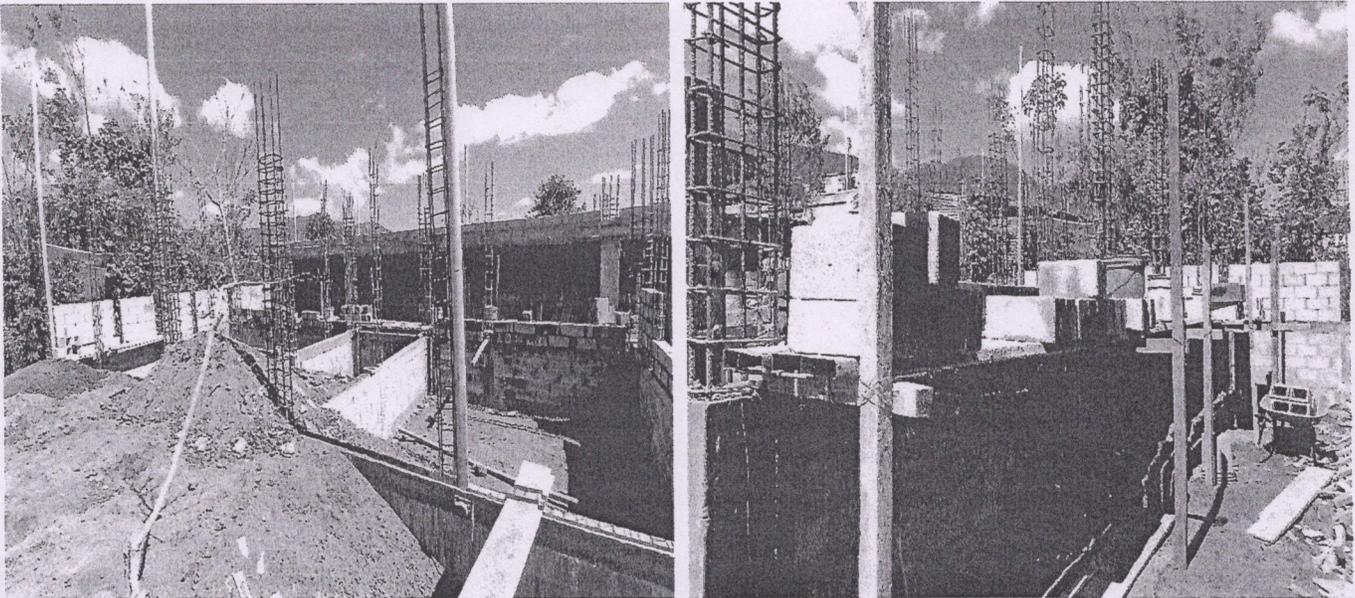

PROYECTO SUSPENDIDO

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS FUENTES CANTON LAS FLORES ALDEA CHAMPOLLAP, DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCCIONES PROGRESO"**
- Durante el mes se trabajó los renglones de cama de arena de asiento, adoquín tráfico pesado, llaves de confinamiento y loseta de remate. Se solicitaron los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 16-11-2021 Fecha de Finalización: 16-03-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 85.70 % CONTRATO No. 034-2021**


Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CANTON CAROLINA HACIA CRUCE CALLE PRINCIPAL ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCTORA Y COMERCIAL AG"**
- Durante el mes se trabajó los renglones de adoquín tráfico pesado, llaves de confinamiento, loseta de remate, Reacondicionamiento de brocal existente y Rejillas.
- Fecha de inicio: 22-11-2021 Fecha de Finalización: 22-03-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 96.00 % CONTRATO No. 039-2021**




Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

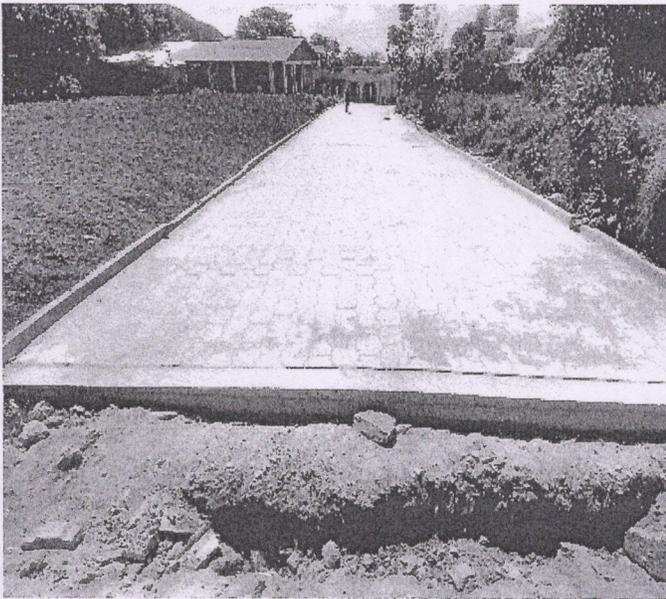

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CIFUENTES VELASQUEZ"**
- Durante el mes se continua trabajando en el armado de las cámaras de sedimentación 1 y 2, también se fundió la base de cámara de sedimentación 2.
- Fecha de inicio: 12-04-2021 Fecha de Finalización: 12-10-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 67.00 % CONTRATO No. 033-2020**





Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

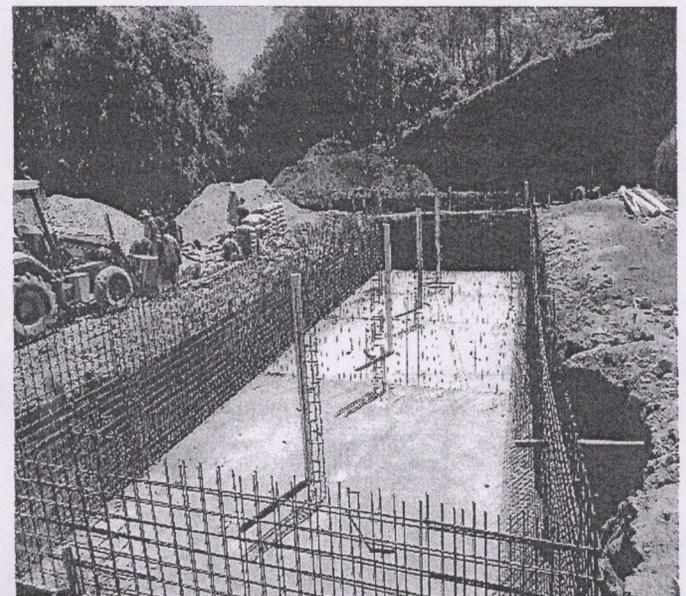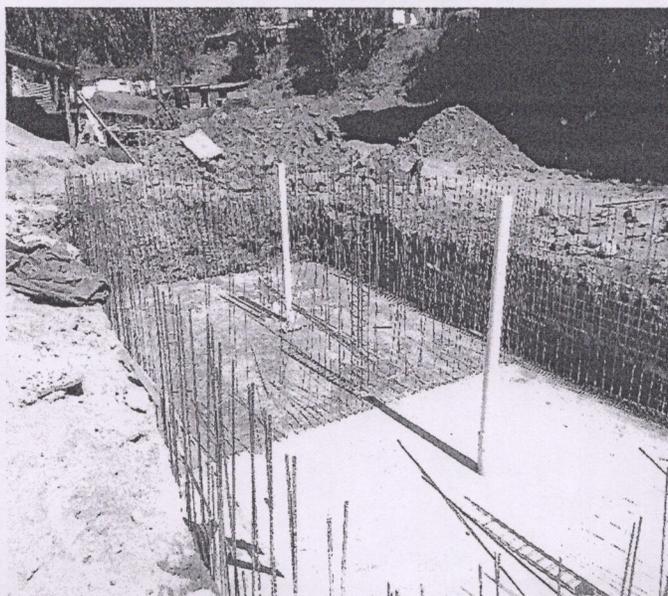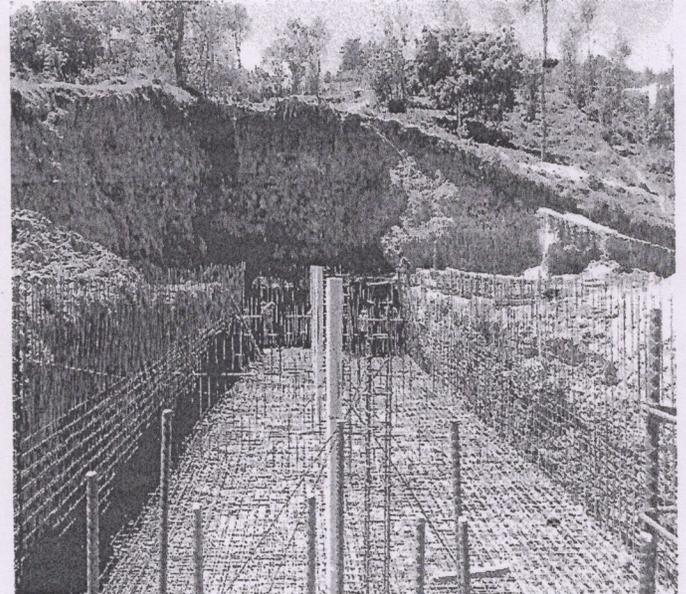

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL (MODULOS 2 Y 3) MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: "ARCHILA"
- Durante el mes se continúa con los trabajos de armado y fundición de columnas, soleras intermedias y se trabaja con el levantado de muros de block, del módulo de administración.
- Fecha de inicio: 01-03-2021 Fecha de Finalización: 01-09-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 41.10 %** **CONTRATO No. 040-2020**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

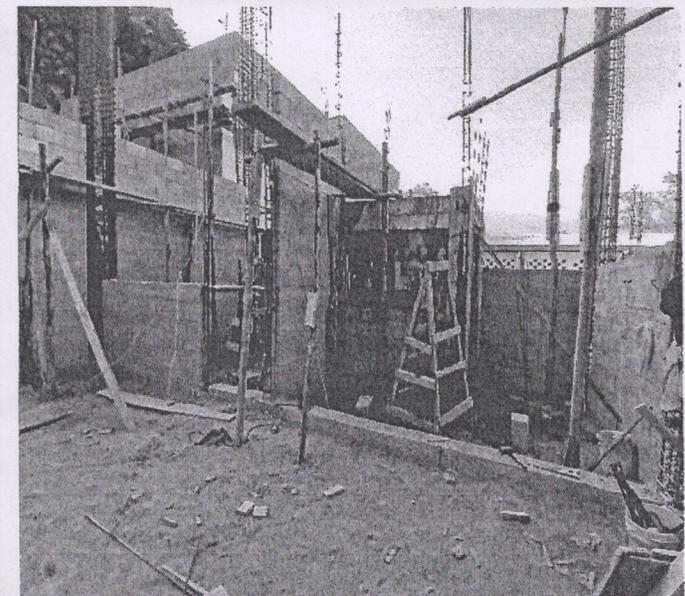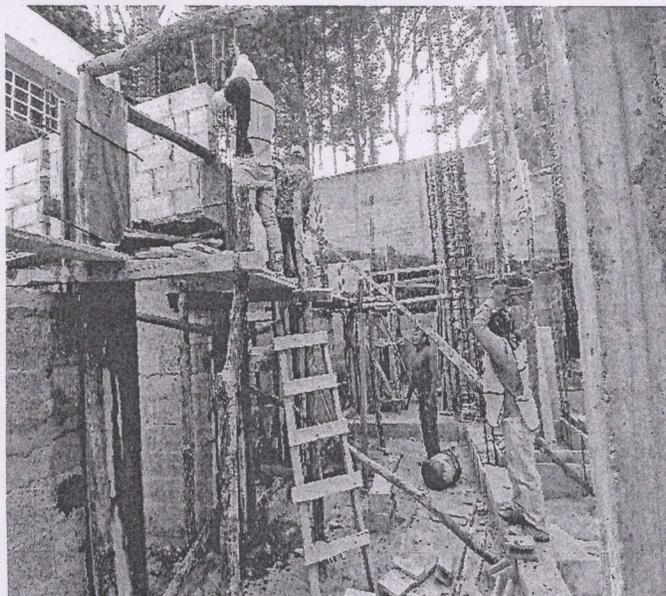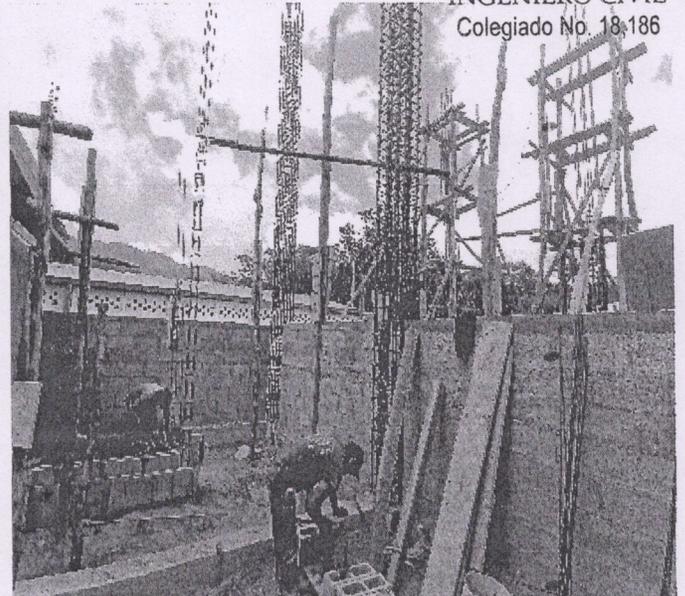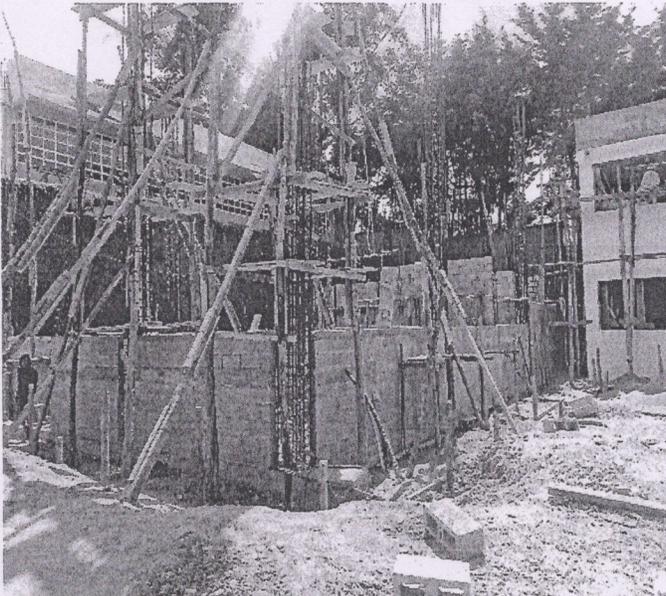

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE 20 DE ENERO, CASERIO EL BOQUERON, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"RAMCO, SOCIEDAD ANONIMA"**
- Durante el mes se iniciaron los trabajos de replanteo, corte de cajuela, conformación de sub-rasante y preparación de la base.
- Fecha de inicio: 01-02-2022 Fecha de Finalización: 01-08-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 17.00 % CONTRATO No. 007-2022**


Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"DETALLES ARTE EN ARQUITECTURA"**
- Durante el mes se trabajó la fundición de la viga canal 1 y 2, la viga 1, solera final y losa, también se trabajó con la instalación del techo curvo, el repello + cernido, la fundición de contrapeso y se inicio la colocación del piso porcelanato.
- Fecha de inicio: 04-10-2021 Fecha de Finalización: 04-03-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 70.00 % CONTRATO No. 016-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juarín
INGENIERO CIVIL
Colegiado No 18,186

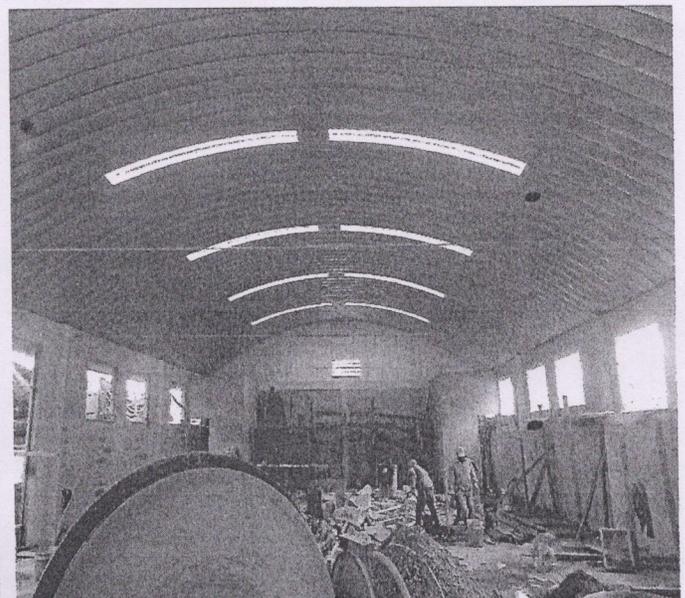

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. CALLE ZONA 5 ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"G & G"**
- Durante el mes se continúa trabajando con la construcción de pozos de visita, instalación de tubería y relleno + compactación de zanja.
- Fecha de inicio: 16-11-2021 Fecha de Finalización: 16-04-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 90.00 %** **CONTRATO No. 031-2021**


Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1 CANTON VISTA HERMOSA ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CONSTRUCCIONES PROGRESO”**
- Durante el mes se trabajó con los renglones de preparación de la base y bordillos laterales, se solicitaron los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 16-12-2021 Fecha de Finalización: 16-05-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 35.00 % CONTRATO No. 041-2021**


Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

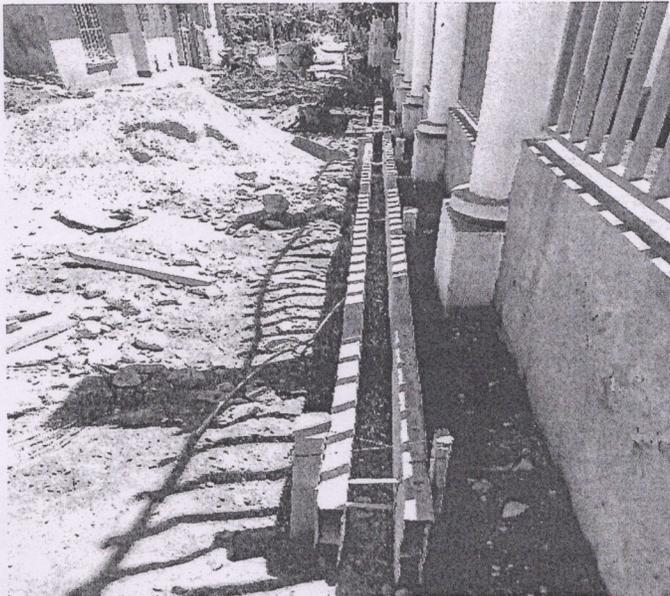

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO ENTRADA CASERIO SANTA TERESA ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCCIONES PROGRESO"**
- Durante el mes se continúa trabajando la conformación de sub-rasante, corte de cajuela, preparación de la base, bordillos laterales, fundición de carrileras de concreto y empedrado.
- Fecha de inicio: 02-12-2021 Fecha de Finalización: 02-05-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 50.00 % CONTRATO No. 038-2021**



Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado N.º 18.186

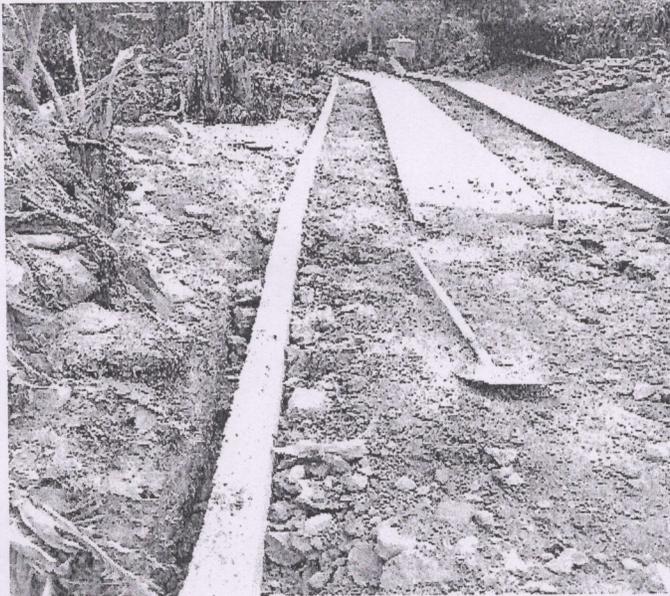

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: “MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA APARICIO MERIDA MORALES CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: “MEGA-CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE”
- Durante el mes se finalizaron los trabajos de construcción de techo de estructura, repello + cernido (en paredes y losa) y piso + contrapiso.
- Fecha de inicio: 26-11-2021 Fecha de Finalización: 26-03-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 92.20 %** **CONTRATO No. 040-2021**




Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

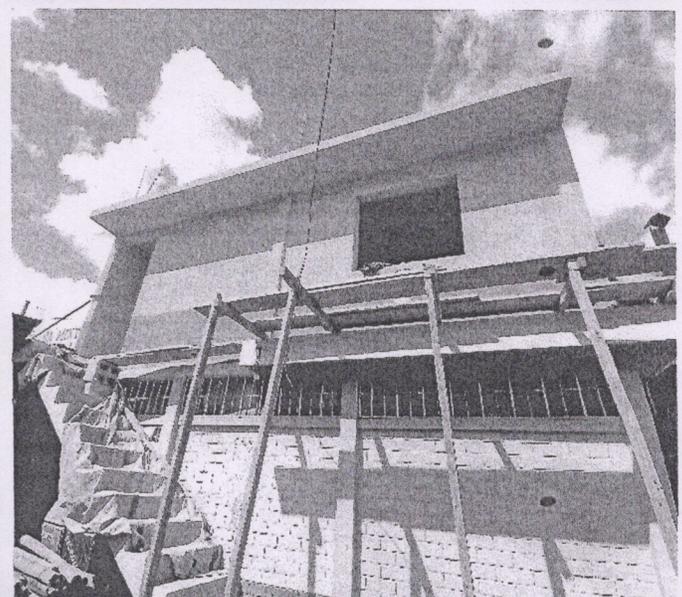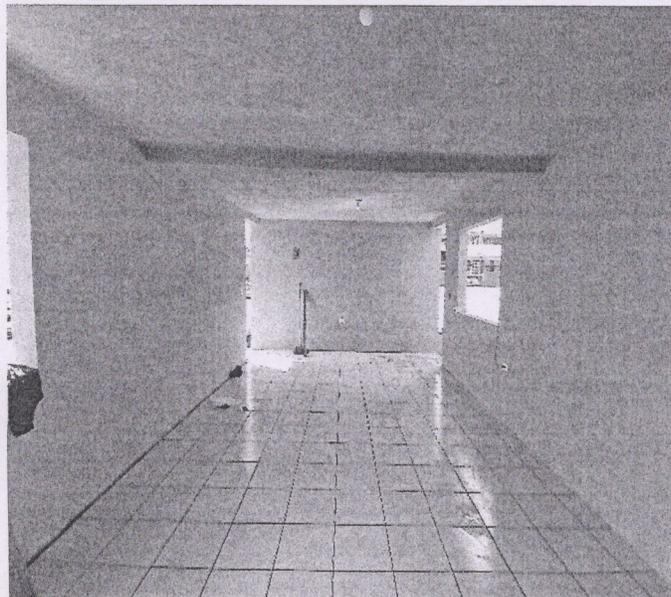

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1 DE 2A. AVENIDA A ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCTORA INGENIERIA PARA PROYECTOS CIVILES"**
- Durante el mes se trabajó los renglones de trabajos preliminares, corte de cajuela, reacondicionamiento de subrasante, base de material granular y bordillos simples.
- Fecha de inicio: 07-02-2022 Fecha de Finalización: 07-05-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 50.80 %** **CONTRATO No. 060-2021**





Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

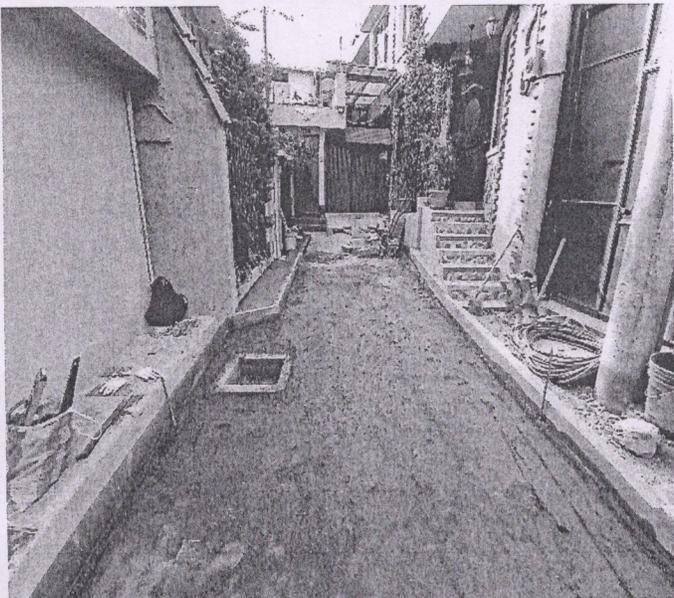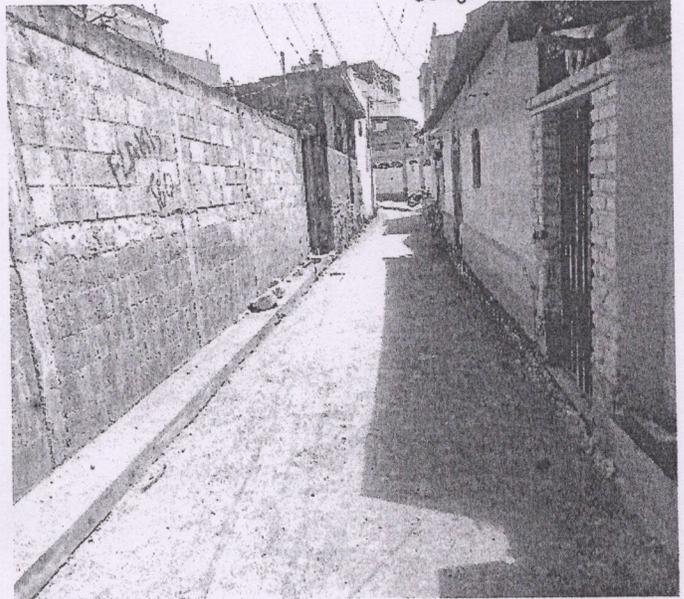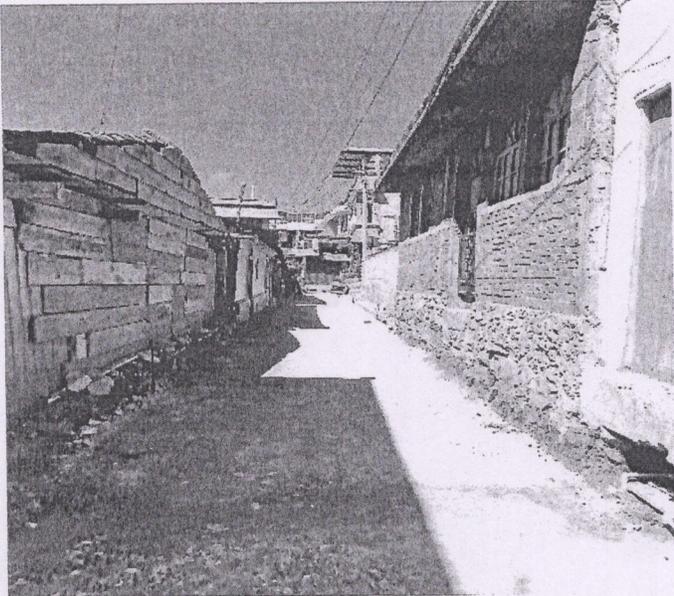

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: "C Y R INGENIERIA"
- Durante el mes se trabajó con los renglones de columna C-1, columna C-3, levantado de paredes de block cisadas y solera intermedia.
- Fecha de inicio: 26-11-2021 Fecha de Finalización: 26-08-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 18.00 %** **CONTRATO No. 045-2021**


Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18,186

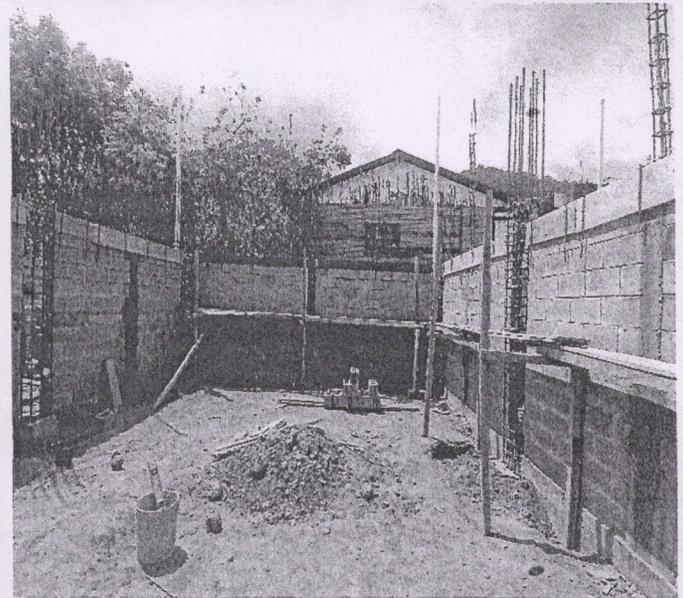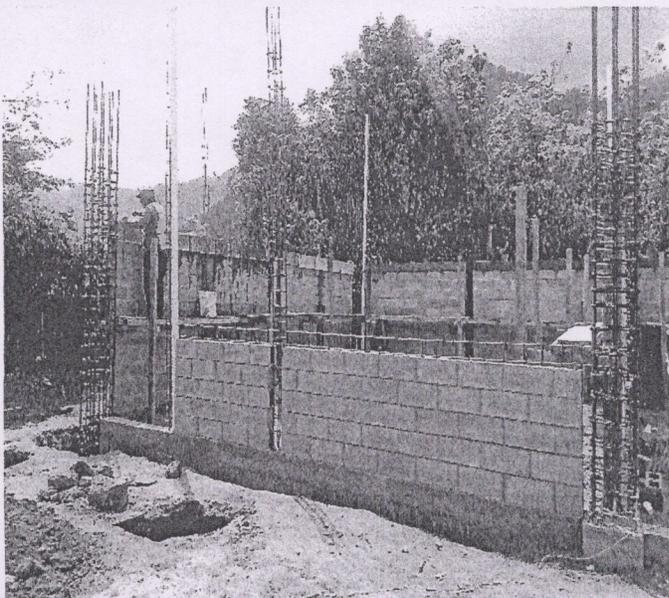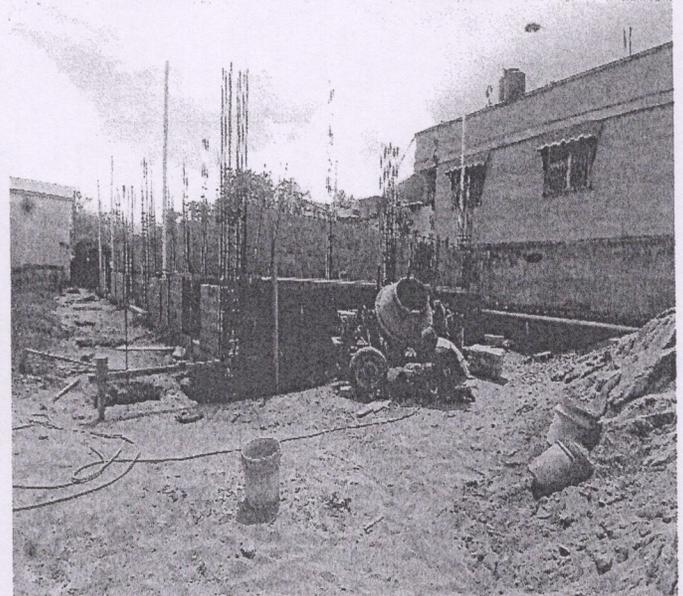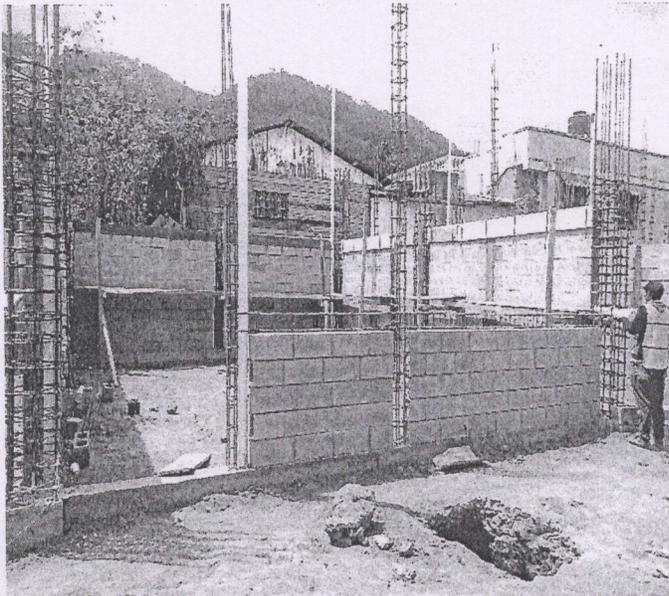

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CALLEJON 1 DE 2A. AVENIDA ZONA 4, CANTON TONALA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: "CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR"
- Durante el mes se trabajó con los renglones de trazo y replanteo topográfico y nivelación y compactación de sub-rasante (cajuela).
- Fecha de inicio: 14-12-2021 Fecha de Finalización: 14-02-2022
- AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 9.00 % CONTRATO No. 044-2021

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No 18.186


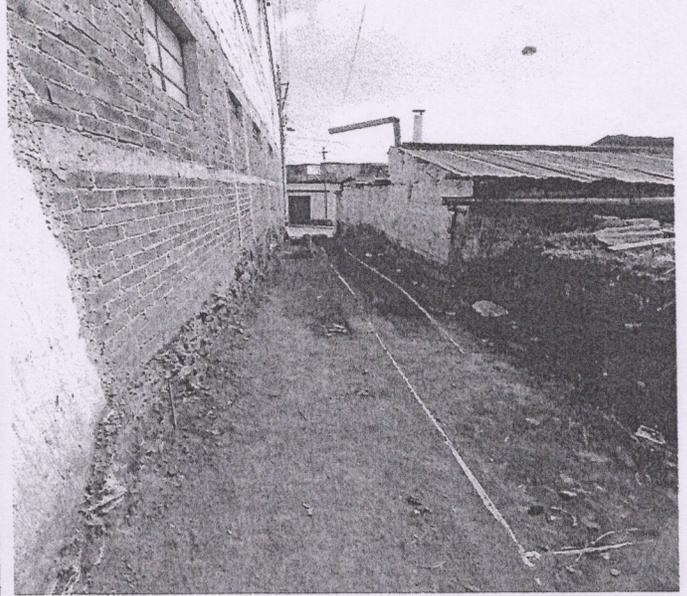


PROYECTO SUSPENDIDO

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CASERIO EL BOQUERON HACIA LIMITE CON CENTRO DE COMUNIDAD ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CONSTRUCTORA CODIPA”**
- Durante el mes se finalizaron los trabajos de adoquín tráfico pesado, bordillo de concreto, llave de confinamiento y loseta de remate.
- Fecha de inicio: 03-12-2021 Fecha de Finalización: 03-05-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 98.00 %** **CONTRATO No. 046-2021**


Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL.
Colegiado No 18.186

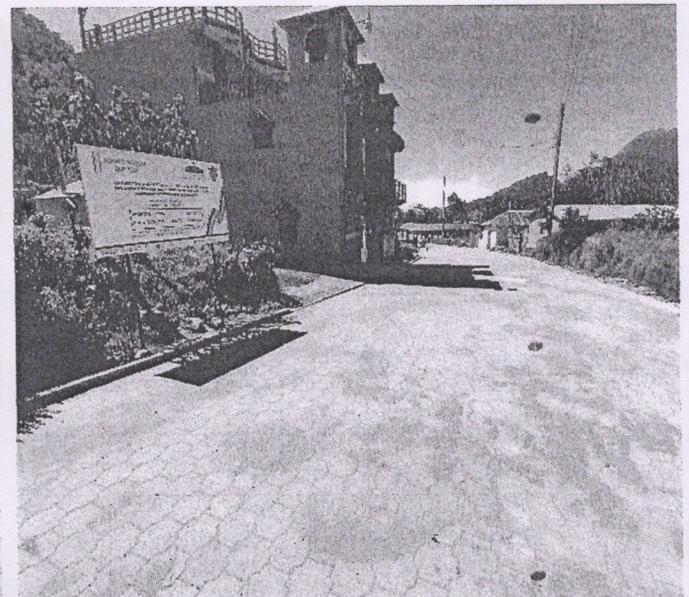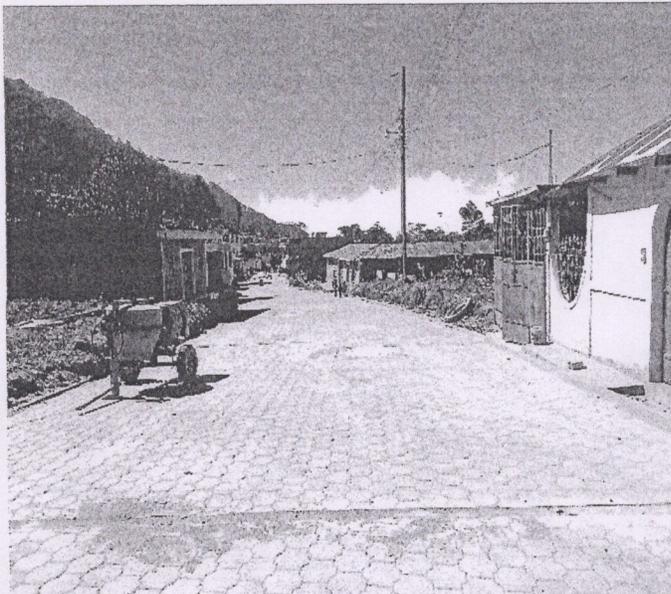

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 6 ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCTORA EL PROGRESO"**
- Durante el mes se trabajó con los renglones de trazo y replanteo, corte de cajuela ($e=0.33m$) y la conformación de Sub-rasante.
- Fecha de inicio: 08-11-2021 Fecha de Finalización: 08-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 14.10 %** **CONTRATO No. 044-2020**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 18.186

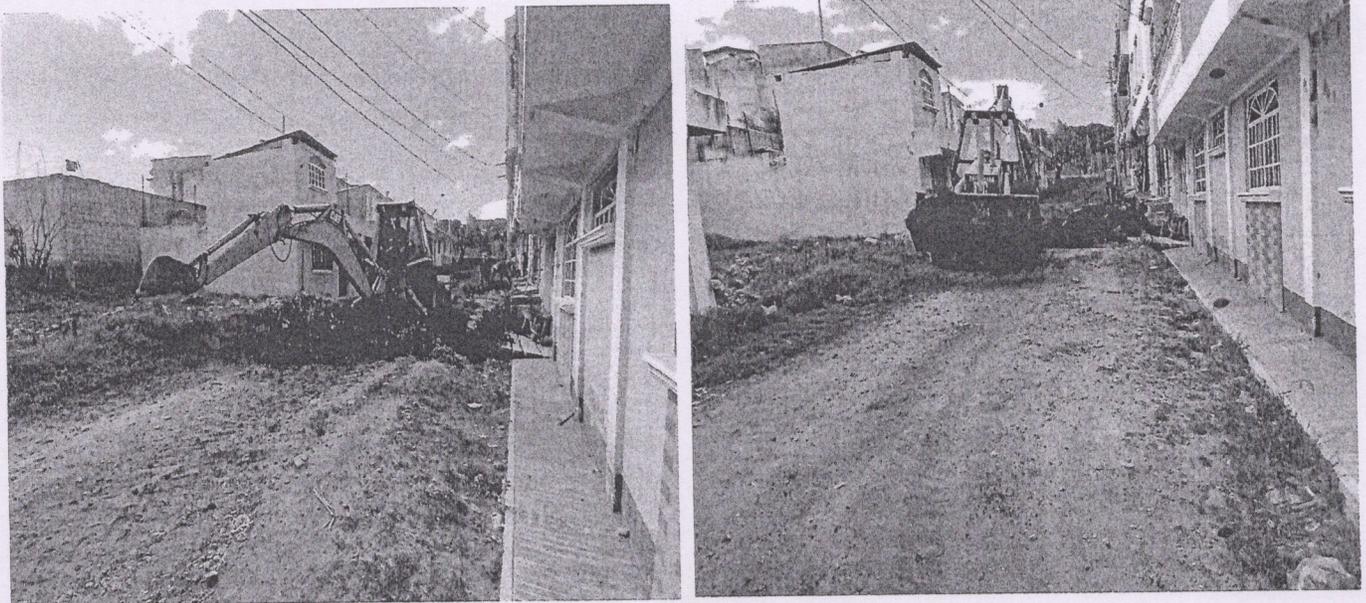

PROYECTO SUSPENDIDO

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PALENCIA ALDEA SACUCHUM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCTORA EL PROGRESO"**
- Durante el mes se finalizaron los trabajos de construcción de pozos de visita, instalación de tubo recolector de 12", relleno y compactación de zanja y colocación de empedrado.
- Fecha de inicio: 15-04-2021 Fecha de Finalización: 12-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 99.54 %** **CONTRATO No. 026-2020**



Gustavo Adolfo Velásquez Jur.
INGENIERO CIVIL
Colegiado No 18.186



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO 2A. CALLE ALDEA EL TABLERO SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"CONSTRUCTORA GONZALEZ"**
- Durante el mes se trabajó con los renglones de corte de cajuela, conformación de Sub-rasante, base de material granular, carrileras de concreto, bordillos laterales, muro de concreto ciclópeo y empedrado.
- Fecha de inicio: 20-09-2021 Fecha de Finalización: 20-02-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 80.00 % CONTRATO No. 022-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juc
INGENIERO CIVIL
Colegiado No 18.186

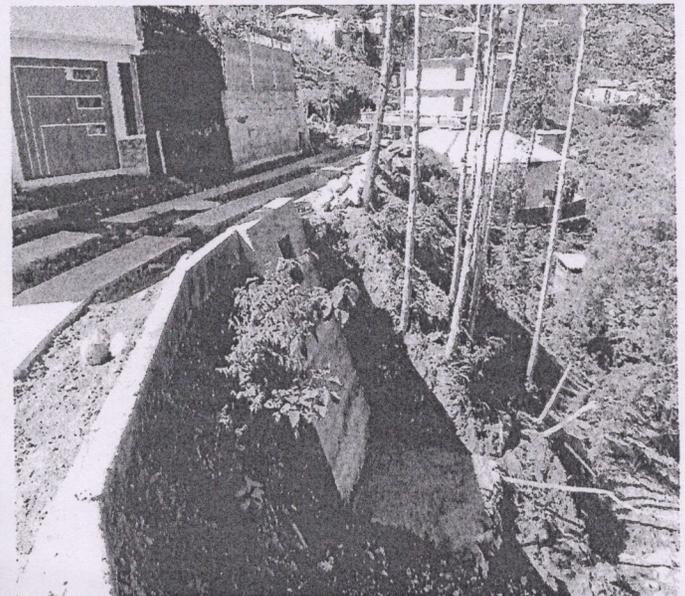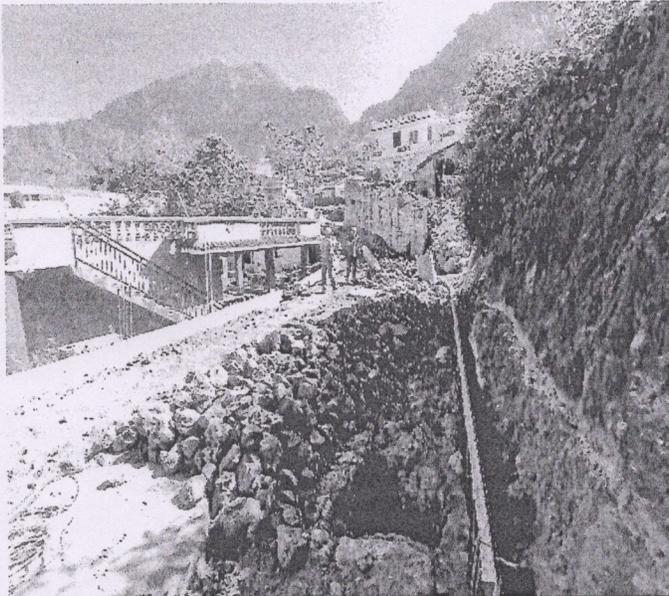

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **“CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO ORATORIO ALDEA SAN ANDRÉS CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS”**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **“CONSTRUCTORA EARVECO”**
- Durante el mes se iniciaron los trabajos de trazo y nivelación, zapatas Z-1, Zapatas Z-2, Zapatas Z-3, cimiento corrido y el armado de columna circular C-1, columna C-2, C-3, C-4.
- Fecha de inicio: 20-12-2021 Fecha de Finalización: 20-06-2022
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 6.00 % CONTRATO No. 050-2021**

Gustavo Adolfo Velásquez Juárez.
INGENIERO CIVIL
Colegiado No 18,186

