



SUPERVISION DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
FEBRERO 2021
INGENIERO CIVIL GUSTAVO ADOLFO VELASQUEZ JUAREZ
COLEGIADO No. 18,186

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) CALLE PRINCIPAL, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"DETALLES, ARTE EN ARQUITECTURA"**
- Durante este mes se realizaron los trabajos de fundición de carrileras y la de bordillos con su respectivo repello y también se iniciaron con los trabajos de rejilla.
- Fecha de inicio: 23-12-2020 Fecha de Finalización: 23-03 2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 70.00 % CONTRATO No. 019-2020**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR 7 LOS CEREZALES Y CALLE MIRALVALLE, ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"PROSEINCA"**
- Durante el mes de febrero, se continuaron con trabajos nivelación de la base y el trazo para fundir las carrileras de concreto, también se trabaja en el desempedrado y corte de cajuela de la calle miralvalle, se le pidió al contratista los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 24 -12-2020 Fecha de Finalización: 24-06-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 45.00 % CONTRATO No. 028-2020**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: "S.M.C. Servicios Múltiples en Construcción"
- Se ha realizado la fundición del vertedero de excedencias, canal de rejas + desarenador, cámaras de sedimentación, zanjeado para los muros de contención y levantado de muros de mampostería. Se le pidió al contratista los estudios de laboratorio.
- Fecha de inicio: 15-01-2021 Fecha de Finalización: 15-07-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 45.00 % CONTRATO No. 0-2020**



SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"SEDIPRO"**
- Durante el mes se realizaron los trabajos de repello + cernido en losa, repello y alisado en columnas y vigas, instalación de columnas para la cubierta de lámina.
- Fecha de inicio: 14-12-2020 Fecha de Finalización: 14-04-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 70.00 % CONTRATO No. 021-2020**




SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "CONSTRUCCION POZO(S) PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: "S.M.C. Servicios Múltiples en Construcción"
- Durante el mes se finalizaron los trabajos de excavación y se instaló la tubería galvanizada de 8" de espesor de ¼", solo falta realizar la prueba de bombeo.
- Fecha de inicio: 23-12-2020 Fecha de Finalización: 23-06-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 45.00 % CONTRATO No. 032-2020**





SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE PRINCIPAL CASERIO ENTRE RIOS, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"INGARQ"**
- Durante el mes se han realizado los trabajos de corte de cajuela, trazo y replanteo.
- Fecha de inicio: 29-01-2021 Fecha de Finalización: 29-05-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 20.00 % CONTRATO No. 042-2020**

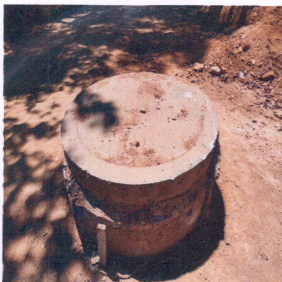

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1A. SOBRE 2A. AVENIDA ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"**
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: **"G Y G"**
- Durante el mes se realizaron los trabajos de corte de cajuela, trazo y replanteo, conformación de la rasante, fundición de bordillos.
- Fecha de inicio: 25-01-2021 Fecha de Finalización: 25-04-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 30.00 % CONTRATO No. 0-2020**

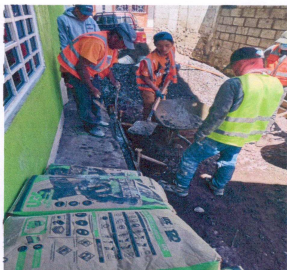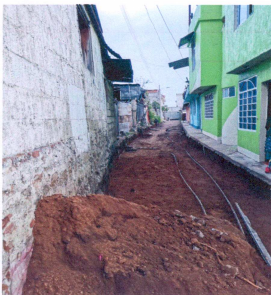

SUPERVISION DE OBRAS

- Proyecto: "CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"
- El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
- Constructora: "FERRCONS BALCARCEL"
- Durante el presente mes se realizaron trabajos de fundición de soleras de humedad, levantado de muro, fundición de columnas y fundición de soleras intermedias.
- Fecha de inicio: 25-01-2020 Fecha de Finalización: 25-06-2021
- **AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 40.00 % CONTRATO No. 036-2020**

